EMILIO BOGADO
CONSTRUCCIONES
Barrio San Isidro a 10 cuadras de la comisaría - Barrio Santa Librada
Cel: 0995 - 359159
RUC: 1.206.053-4
Correo: emiliobogado1963@hotmail.com

ENCARNACION, 28 de Febrero de 2023.-

SEÑOR
LUIS YD
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda a solicitar el desembolso en el marco del contrato LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2022 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL", ID N° 417053.

Este pedido lo hago conforme a lo estipulado en el contrato firmado, correspondiente al Certificado de Obra N° 03, el cual asciende a la suma de Gs. 30.443.792 (Guaraníes Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Dos).

Sin otro particular le saludo respetuosamente.-

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

Emilio Eduardo Bogado Vallejo

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Anexo: Instalaciones de Construcción

Actividades de Albañilería - Construcción

Cel. (0995) 359 159 - B° San Isidro a 10 cuadras de la Comisaría B° Sta Librada

Encarnación - Itapúa - Paraguay

Timbrado N° 15587283

R.U.C. 1206053-4

Inicio de Vigencia 26/Abril/2022

Fin de Vigencia 30/Abril/2023

FACTURA

0000528

N° 001-001

COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 07 de Marzo de 2023

C.I. o RUC: 80000004-8

Nombre y/o Razón Social: Municipalidad de Encarnación

Nota de Remisión N°:

Dirección:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Certificado N° 3 obras de Infraestructura para el Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional CO N° 04/22 ID N° 417053				8.937.064
					8.937.064

VALOR PARCIAL

TOTAL: 8.937.064

TOTAL A PAGAR GS: Ocho Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Sesenta y Cuatro.-

TOTAL DEL IVA: 812.460.-

LIQ. DEL IVA: (5%):

LIQ. DEL IVA: (10%): 812.460

Impreso el: 26/04/2022 - Cant. 01 Tal. 50x3

001-001 0000501 al 001-001 0000550

Original : Comprador

Duplicado: Archivo Tributario

Triplicado: SET (No válido p/ crédito fiscal)

GRAFICA SAN LUIS ☎ (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.

de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación N°: 1302

Remisión: 8325

Emilio Eduardo Bogado Vallejo
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Anexo: Instalaciones de Construcción
Actividades de Albañilería - Construcción
Cel. (0995) 359 159 - B° San Isidro a 10 cuadras de la Comisaría B° Sta Librada
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Timbrado N° 15587283
R.U.C. 1206053-4
Inicio de Vigencia 26/Abril/2022
Fin de Vigencia 30/Abril/2023
FACTURA
N° 001-001 0000531

Fecha 07 de Marzo de 2023
Nombre y/o Razón Social: Municipalidad de Encarnación
COND. DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]
C.I. o RUC: 30000004-8
Nota de Remisión N°:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Provisión e Instalación de 3 aires acondicionados de 24000 BTU	16.014.284			16.014.284
	Provisión e Instalación de 3 equipos de ventiladores de techo				
	OBRA: Infraestructura en C.T.N Encarnación CON°04/22 ID 417053	5.492.444			5.492.444
	PARCIAL				21.506.728

A PAGAR GS. Veintiun millones quinientos seis mil setecientos ochenta

TOTAL: 21.506.728-

IVA: (5%):

LIQ. DEL IVA: (10%): 1955157

TOTAL DEL IVA: 1955157.-

Original: Comprador

Emilio Eduardo Bogado Vallejo
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Anexo: Instalaciones de Construcción
Actividades de Albañilería - Construcción
Cel. (0995) 359 159 - Bº San Isidro a 10 cuadras de la Comisaría Bº Sta Librada
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Timbrado Nº 16267681
RUC: 1206053 - 4
Inicio de Vigencia: 08/Marzo/2023
Fin de Vigencia: 31/Marzo/2024

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001 - 001 0000002

Fecha de Emisión: / /

REMITENTE DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Emilio Bogado RUC o C.I.C.: 1206053-4
Domicilio: San Isidro Encarnacion.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Colegio tecnico Nacional RUC o C.I.C.:
Domicilio: Barrio la esperanza Encarnacion.

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta. Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado: 15587283
Fecha de expedición: 20/02/23
Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección del punto de partida: Barrio San Isidro
Ciudad: Encarnacion Departamento: Itapua.
Dirección del punto de llegada: Colegio Tecnico Nacional
Ciudad: Encarnacion Departamento: Itapua.
Kilómetros estimados de recorrido: 10
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado: Nº de factura del flete:
Precio del Flete: Valor del IVA:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehiculo: Mitsubishi
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BPZ 443
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque7tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Emilio Bogado RUC o C.I.C.: 1206053
Domicilio: Barrio santa Librada Encarnacion.

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando intervenga)
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

Articulo/ Codigo	Cantidad	Descripción detallada de la Mercadería (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
35342	3	Aire Acondicionado 24000 BTU
		marca HAUSTEC
35305	3	soporte de Aire Acondicionado marca
		Haustec
115500	8	Ventiladores de techo marca UCP
		Motor Pesado 7 velocidade.

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

GRAFICA SAN LUIS (071) 202342 - 14 de Mayo c/ Artigas - Enc.
de: Luis Guaymas - RUC: 1864212 - 8 - Cédula de Habilitación Nº: 1302
Fecha de Imp. 08/03/2023 - Cant. 01 tal 50x4
001-001 0000001 - al 001-001 0000050

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

RUC: 80000004-8
☎ 204800 / 204253 / 203942

Nº 0016288

NOTA DE PEDIDO INTERNO

DEPARTAMENTO: Dirección de Fonacide

FECHA: 17 de Febrero del 2023.

PROVEEDOR: Empresa Emilio Bogado.

ITEM	CANTIDAD Nº	CANTIDAD LETRAS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1			Provisión e Instalación de 3 aires acondicionados de 24000 BTU	16.014.784	16.014.784
	1			Provisión e Instalación de 8 equipos de ventiladores de techo	5.492.444	5.492.444
				TOTAL	21.506.728	

OBSERVACIONES

V° B° COMPRAS

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN FONACIDE
Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación
V° B° DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN FONACIDE
Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

CENTRO GRÁFICO S.R.L. - ☎ (071) 204397

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

R.U.C. N° 80000004 - 8
☎ 204800 / 204253 / 203942

N° 0008325

NOTA DE REMISIÓN Y/O RECEPCIÓN

FECHA: 20 de febrero del 2023

PROVEEDOR: Empresa Emilio Bogado.

N° PEDIDO INTERNO: 16288

CANTIDAD		
N°	LETRAS	MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS
1		Provisión e Instalación de 3 aires acondicionados de 24.000 BTU
1		Provisión e Instalación de 8 equipos de ventiladores de techo

DEPARTAMENTO RECEPTOR	FIRMA:
	ACLARACIÓN:

Arq. Vanderlei Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE

ACTA DE RECEPCION

OBRA: "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL.-, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2022

CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

En el distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Febrero de 2023, se reúnen en representación de COLEGIO TÉCNICO NACIONAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL, la Prof. Adriana Villalba como Directora y el Sr. Emilio Bogado en representación de la Empresa Emilio Bogado Construcciones Contratista de la Obra de "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL.-,

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismos han procedido a la entrega y recepción respectivamente, en total funcionamiento de los siguientes equipamientos: 1) 3 (tres) equipos de equipo Aire acondicionado 24.000BTU de la marca HAUSTEC ASWEFB-24R24000F/C ECO PARED (Incluye desagüe con caño pvc embutido hasta el desagüe pluvial). 2) 8 (ocho) equipo ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades de la marca VCP (Incluye sistema de soporte). En tal sentido el receptor manifiesta su entera satisfacción.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presenta Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

.....
Emilio Bogado
Contratista

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC: 1206053-4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Centro Nacional de Entrenamiento Vocacional
Prof. María Benítez Pardomo
Encarnación
Dirección General

.....
Prof. Adriana Villalba
Directora

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

OBRA: "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL.-, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2022

CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

En el distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Febrero de 2023, se reúnen en representación de la Municipalidad de Encarnación, el Arq. Edgar Fernández como Fiscal de Obras y el Sr. Emilio Bogado en representación de la Empresa Emilio Bogado Construcciones Contratista de la Obra de "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO VOCACIONAL.-, CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2022".-

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismos han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados. En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 3.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presenta Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

.....
Emilio Bogado
Contratista
Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

.....
Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación
Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE

Certificado de Obra Nº 3

Obra: Obras de Infraestructura para el Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional
Llamado: CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2022
Dirección: BARRIO LA ESPERANZA

Fecha: 28/02/2023

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera	Unidad Medida Global	1	677.366	677.366	1	-	1	677.366	-	677.366	100%	0%	100%
2	b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 m y profundidad 0,60 m.	Unidad Medida Global	1	1.159.000	1.159.000	1,00	-	1,00	1.159.000	-	1.159.000	100%	0%	100%
3	a-Retiro de techo y material de aciento con recuperación de las tejas.	Metros cuadrados	735	19.238	14.139.563	735,00	-	735,00	14.139.563	-	14.139.563	100%	0%	100%
4	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizada (color cerámico teja) y Membrana asfáltica con aluminio 4 mm. o similar, bajo chapa, con estructura de caños 40x30 sobre vigas y clavadores, s/tejuela existente. Estructura existente, Incluye cumbrera de chapa des. 80 cm(mismo color y material).	Metros cuadrados	735	126.669	93.101.862	735,00	-	735,00	93.101.862	-	93.101.862	100%	0%	100%
5	b- Cenefa de chapa N°26 desarrollo 60cm	Metro lineal	32	78.660	2.517.120	32,00	-	32,00	2.517.120	-	2.517.120	100,00%	0%	100%
6	a-Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 0,60 m.	Metro lineal	95	67.686	6.430.132	95	-	95	6.430.132	-	6.430.132	100,00%	0%	100%
7	b- Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº 26	Metro lineal	55	67.686	3.722.708		55,00	55,00	-	3.722.708	3.722.708	-	100%	100%
8	a- Contrapiso de Hº de cascotes sobre losas	Metros cuadrados	95	46.762	4.442.376	95,00	-	95,00	4.442.376	-	4.442.376	100%	0%	100%
9	b- Carpeta regularizadora impermeable	Metros cuadrados	95	35.397	3.362.715	95,00	-	95,00	3.362.715	-	3.362.715	100%	0%	100%
10	c- Aislación asfáltica sobre losa	Metros cuadrados	95	20.714	1.967.811	95,00	-	95,00	1.967.811	-	1.967.811	100%	0%	100%
11	d- Aislación de losa a dos capas con membrana elástico y/o asfáltico reforzado con trama elástica.	Metros cuadrados	95	44.942	4.269.457	95,00	-	95,00	4.269.457	-	4.269.457	100%	0%	100%
12	e- Desague pluvial losa	Unidad Medida Global	1	2.105.834	2.105.834	1,00	-	1,00	2.105.834	-	2.105.834	100%	0%	100%

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

13	Pintura: a- De paredes interiores impermeable con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	Metros cuadrados	760	23.719	18.026.174	760,00	-	760,00	18.026.174	-	18.026.174	100,00%	0%	100%
14	Pintura: b- De paredes exteriores impermeable con sellador, enduido, pintura al látex (color blanco), más dos manos hasta lograr una superficie bien uniforme. (Sobre zócalo)	Metros cuadrados	495	23.719	11.740.732	495	-	495	11.740.732	-	11.740.732	100,00%	0%	100%
15	Pintura: c- De ladrillos vistos con resina 100% acrílica en emulsión que brinda un película de gran resistencia y óptimo poder impermeabilizante, con filtro ULTRAVIOLETA. Color teja	Metros cuadrados	730	23.719	17.314.615	730,00	-	730,00	17.314.615	-	17.314.615	100,00%	0%	100%
16	Pintura: d- Canaletas y bajadas con pintura sintética a base de resina acrílica modificada en dispersión acuosa, con pigmentos de alta solidez a la luz, para terminación. Resistente al agua, detergente, hongos y bacterias.	Metro lineal	150	19.119	2.867.813	95	55	150	1.816.281	1.051.531	2.867.813	63,33%	36,67%	100,00%
17	Pintura: e- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro. (Ventanas y puertas especiales)	Metros cuadrados	150	19.119	2.867.813	75,00	75,00	150,00	1.433.906	1.433.906	2.867.813	50%	50%	100%
18	a- Reparación de persiana de acceso.	Unidad	5	327.750	1.638.750		5,00	5,00	-	1.638.750	1.638.750	100,00%		100%
19	b- Reposición de vidrios 4 mm en ventana existente.	Unidad Medida Global	1	327.750	327.750	-	1	1,00	-	327.750	327.750	100%		100%
20	c- Limpieza de vidrios.	Unidad Medida Global	1	764.750	764.750	1,00	-	1,00	764.750	-	764.750	100,00%	0%	100%
21	d- Vereda de borde y piso de losa para piletas exteriores	Unidad Medida Global	1	1.009.119	1.009.119	1,00	-	1,00	1.009.119	-	1.009.119	100%	0%	100%
22	a- Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 30cm e27 con lampara de 50W luz fria (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto)	Unidad	18	356.557	6.418.023	-	18,00	18,00	-	6.418.023	6.418.023	100%	0%	100%
23	b- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye ducto pvc 25mm gris, caja de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa pvc) tambien incluye un caño pvc para el desague del Aire y interructor bipolar .	Unidad	3	543.731	1.631.192	-	3	-	-	1.631.192	1.631.192	100%		100%

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

	c- Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 24.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial)	Unidad	3	5.338.095	16.014.284	-	3,00	3,00	-	16.014.284	16.014.284	100%		100%
	d- Provisión e instalación de lampara de 50W luz fria	Unidad	10	84.808	848.084	-	10,00	10,00	-	848.084	848.084	100%		100%
	e- Provisión e instalación tubos led 1x16W 6500k 1,20m	Unidad	24	57.475	1.379.400	-	24,00	24,00	-	1.379.400	1.379.400	100%		100%
	f- Provisión e instalación de equipo ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades (Incluye sistema de soporte)	Unidad	8	686.556	5.492.444	-	8,00	8,00	-	5.492.444	5.492.444	100%		100%
	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	633.650	633.650	-	1	1,00	-	633.650	633.650	100%		100%
	Precio Total (IVA Incluido)				**226.870.535**			-	186.278.812	40.591.723	226.870.535	**82,11%**	**17,89%**	**100,00%**
						Total Monto Bruto			186.278.812	40.591.723	226.870.535	General		100,00%
						Descuento Anticipo (20%)			37.255.762	8.118.345	45.374.107			
						Retención caucional (5%)			9.313.941	2.029.586	11.343.527			
						Neto a pagar			139.709.109	**30.443.792**	170.152.901			

Emilio Bogado
Contratista
Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

Fiscal de Obras

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENC
FONACIDE

EMPRESA CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 3

Obra: Obras de Infraestructura para el Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº : **04 /2022**

Periodo : 02/2023 -

ID Nº: 417053

Monto del contrato : **Gs 226.870.535**

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		226.870.535	82,11%	17,89%	100,00%	0	19.084.997	19.084.997
						ESTE CERTIFICADO:	**Gs 19.084.997**	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	226.870.535	37.255.762	8.118.345	45.374.107
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 8.118.345
MONTO DE CERTIFICADO				Gs 19.084.995
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	11.343.527	9.313.941	2.029.586	11.343.527
MONTO DE FACTURA				**8.937.064**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 11.343.527

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC: 1206053-4

EMPRESA CONTRATISTA: EMILIO BOGADO CONSTRUCCIONES

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
CERTIFICADO Nº 3

Obra: Obras de Infraestructura para el Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº : 04 /2022 **Periodo : 02/2023 -**

ID Nº: 417053

Monto del contrato : Gs 226.870.535

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Provisión e instalación de equipo Aire acondicionado 24.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial)				100%	100%		16.014.284	16.014.284
Provisión e instalación de equipo ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades (Incluye sistema de soporte)				100%	100%		5.492.444	5.492.444
Sub total		226.870.535		100,00%	100,00%	0	21.506.728	21.506.728
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 21.506.728	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	226.870.535	0	0	0
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 0
MONTO DE CERTIFICADO				Gs 21.506.728
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	11.343.527	0	0	0
MONTO DE FACTURA				**21.506.728**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 0

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

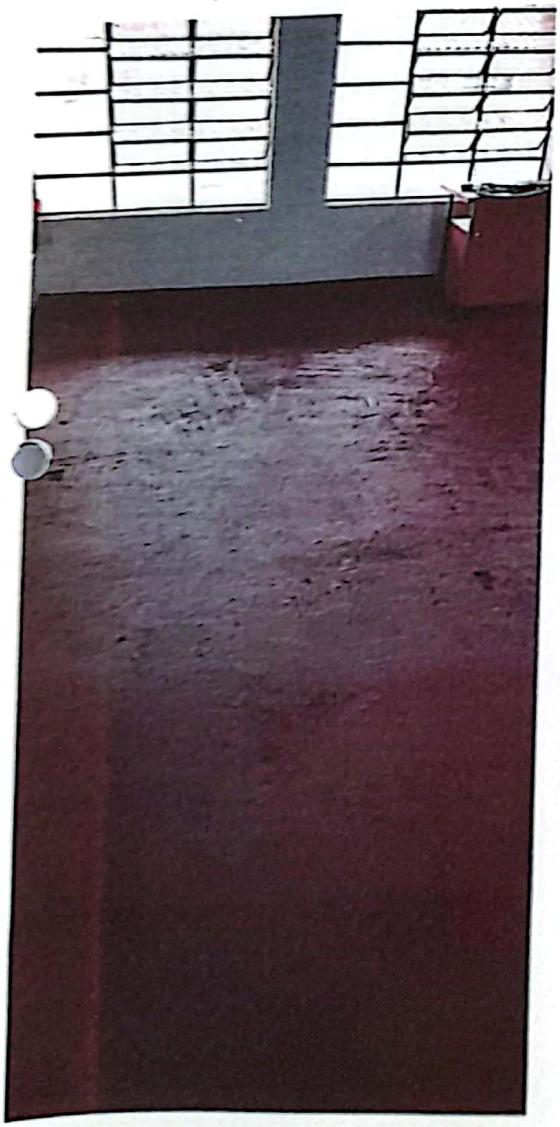

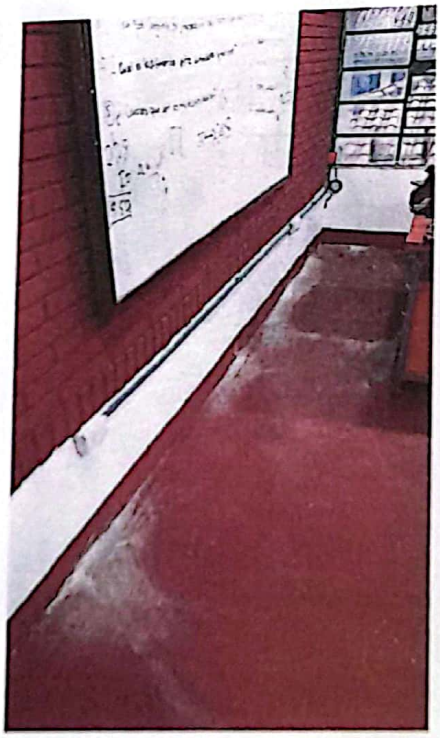

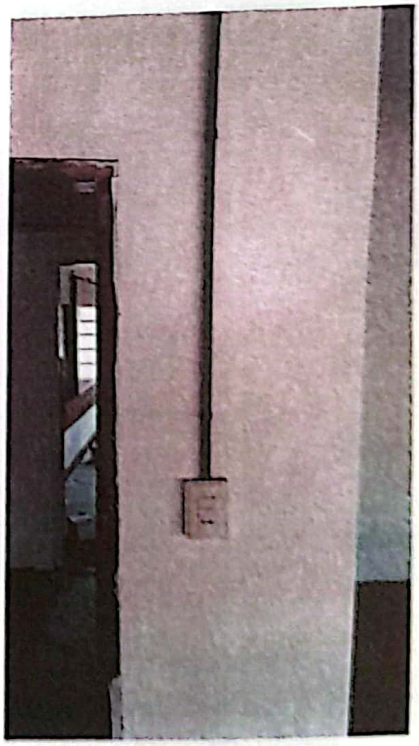

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4

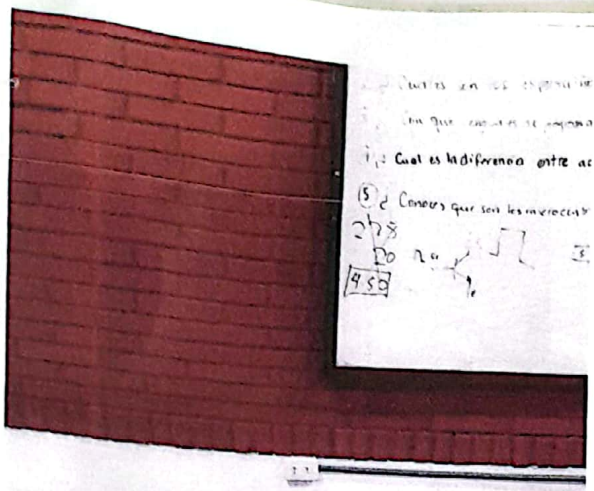

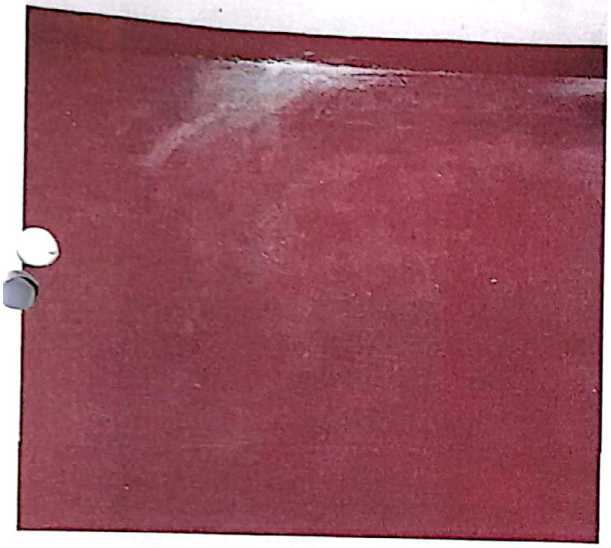

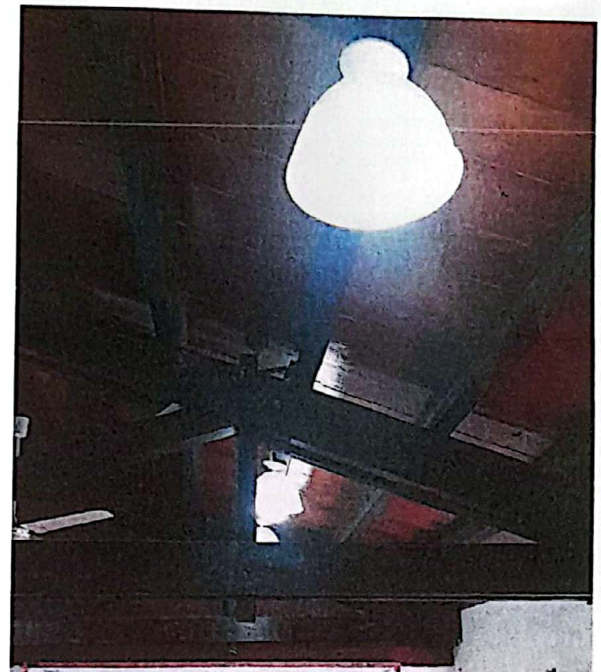

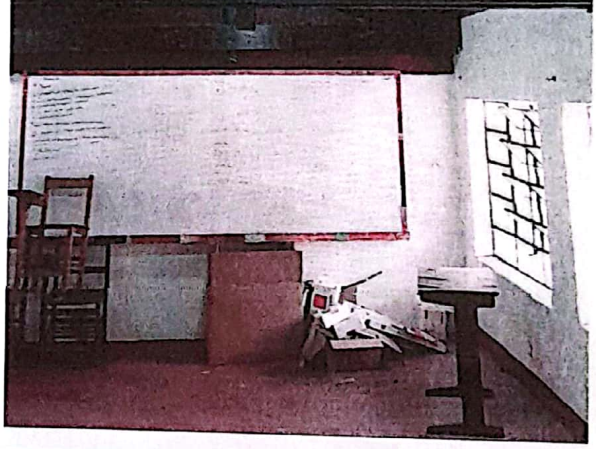

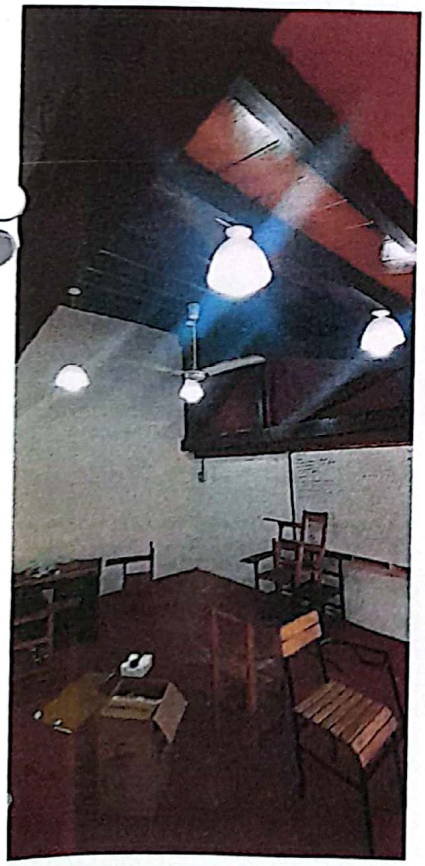

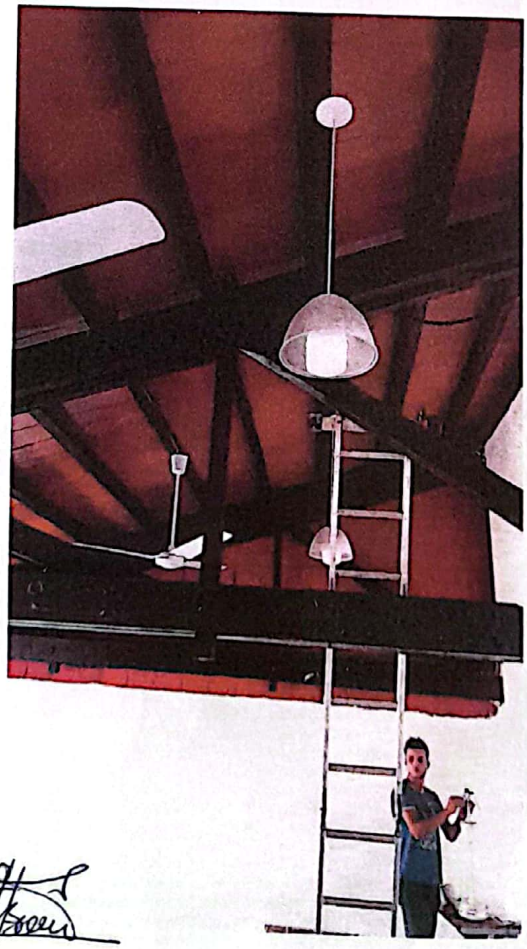

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC: 1200

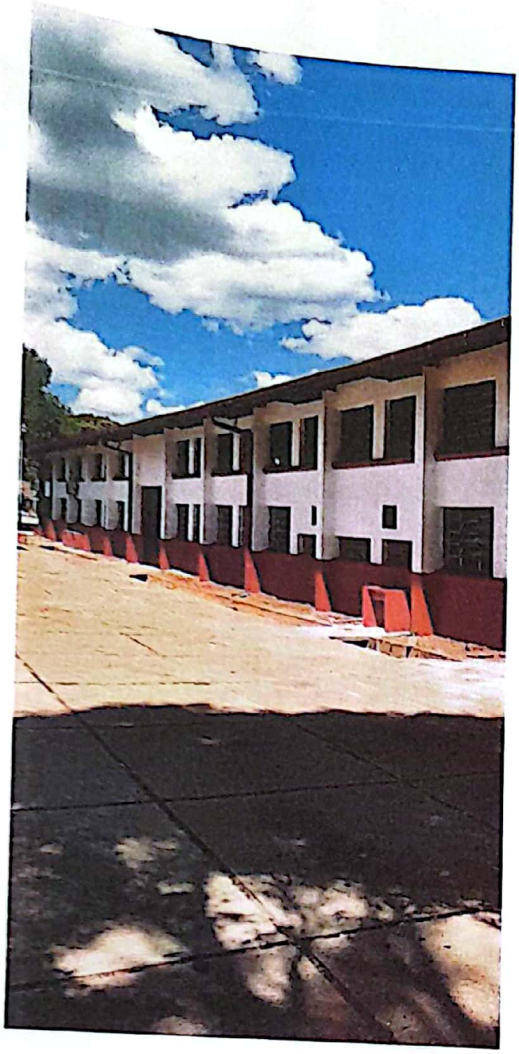

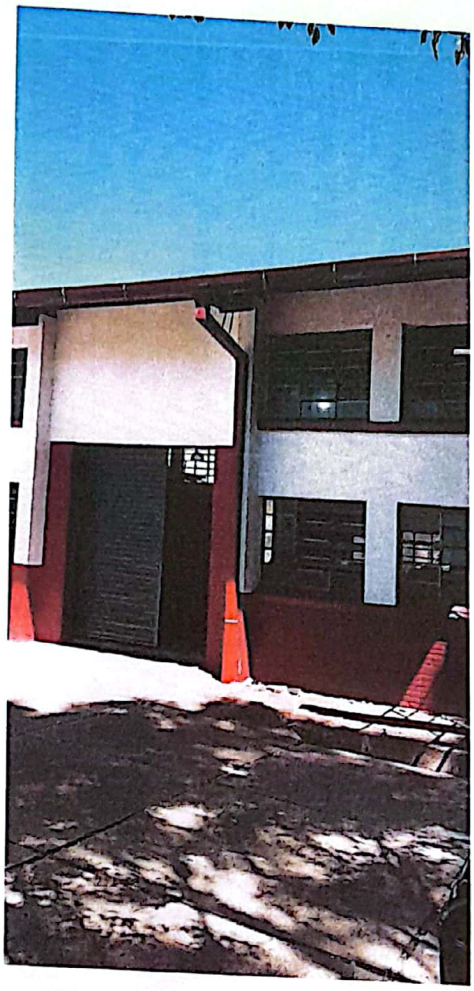

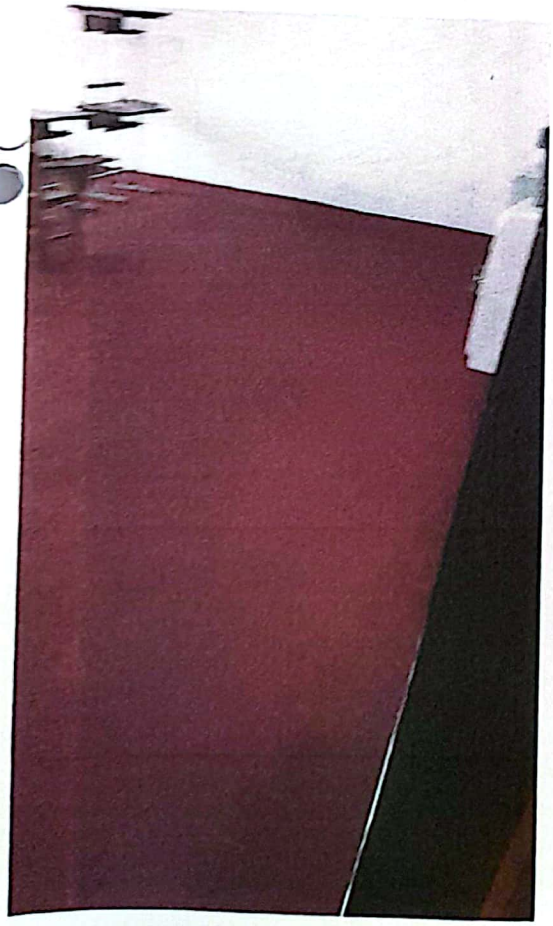

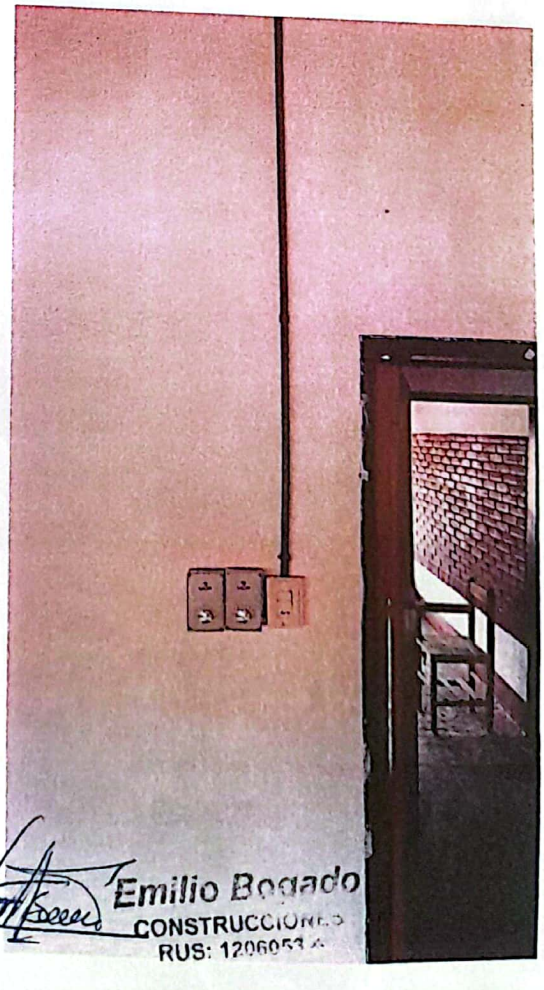

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053

Lote 5647151876 , Cons.: 3

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270151241274

FECHA 13/03/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	1206053	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	BOGADO VALLEJO EMILIO EDUARDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/04/2023

NÚMERO DE CONTROL : 80AC0818

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271120605380AC0818

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 12060534 EMILIO EDUARDO BOGADO VALLEJO

Teléfono/s : 0995359159 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** emiliobogado1963@hotmail.com

Dirección : CALLE, BARRIO SAN ISIDRO A PRADERA ALTA A 1000 MTS DE LA ENTRADA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 012886

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 19/05/2023

Otorgado en Asunción, el 19/05/2017

Renovado el 09/06/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

12060534

08032023 1345 12060534 12060534

012886
