# Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

**Obra:** Consruccion de aula Inicial

**Lugar:** Escuela Basica N°6265 Cristo Rey

**LOC:** Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

## CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

| | | | | | | CERTIFICADO 01 | | | CERTIFICADO ACTUAL | | | TOTAL CERTIFICADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra | un | 3,6 | 649.284 | 2.337.350 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 100 | 2.337.350 | 3,6 | 100 | 2.337.350 |
| 2 | Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 85 | 9.289 | 789.565 | 85 | 100 | 789.565 | 0 | | 0 | 85 | 100 | 789.565 |
| 3 | Destronque de arboles | un | 1 | 245.304 | 245.304 | 1 | 100 | 245.304 | 0 | | 0 | 1 | 100 | 245.304 |
| 4 | Preparación de la obra b- Replanteo | m2 | 85 | 8.284 | 704.140 | 85 | 100 | 704.140 | 0 | | 0 | 85 | 100 | 704.140 |
| 5 | Excavación y carga de cimiento de PBC. | m3 | 18 | 310.077 | 5.581.386 | 18 | 100 | 5.581.386 | 0 | | 0 | 18 | 100 | 5.581.386 |
| 6 | Estructura de H° A° : a- Zapatas, pilares y encadenados de H° A° | m3 | 6,69 | 1.706.765 | 11.418.258 | 6,69 | 100 | 11.418.258 | 0 | | 0 | 6,69 | 100 | 11.418.258 |
| 7 | Muros de nivelación : a- De 0,45 cm. | m2 | 7 | 202.270 | 1.415.890 | 7 | 100 | 1.415.890 | 0 | | 0 | 7 | 100 | 1.415.890 |
| 8 | Muros de nivelación :b- De 0,30 cm. | m2 | 21 | 139.841 | 2.936.661 | 21 | 100 | 2.936.661 | 0 | | 0 | 21 | 100 | 2.936.661 |
| 9 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 35 | 104.881 | 3.670.835 | 35 | 100 | 3.670.835 | 0 | | 0 | 35 | 100 | 3.670.835 |
| 10 | Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes | m2 | 14 | 24.971 | 349.594 | 14 | 100 | 349.594 | 0 | | 0 | 14 | 100 | 349.594 |
| 11 | Muros de elevación :a- De 0,30 para revocar | m2 | 21 | 139.841 | 2.936.661 | 21 | 100 | 2.936.661 | 0 | | 0 | 21 | 100 | 2.936.661 |
| 12 | Muros de elevación :b- De 0,15 para revocar | m2 | 46 | 94.892 | 4.365.032 | 46 | 100 | 4.365.032 | 0 | | 0 | 46 | 100 | 4.365.032 |
| 13 | Muros de elevación :a- De 0,30 visto una cara de ladrillo comun | m2 | 30 | 159.818 | 4.794.540 | 30 | 100 | 4.794.540 | 0 | | 0 | 30 | 100 | 4.794.540 |
| 14 | Muros de elevación :c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comun c/ cantero - parapeto | m2 | 25 | 81.907 | 2.047.675 | 25 | 100 | 2.047.675 | 0 | | 0 | 25 | 100 | 2.047.675 |
| 15 | Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ml | 43 | 18.978 | 816.054 | 43 | 100 | 816.054 | 0 | | 0 | 43 | 100 | 816.054 |
| 16 | Pilares :a- De 0,30 x 0,45 para revocar | ml | 9 | 119.864 | 1.078.776 | 9 | 100 | 1.078.776 | 0 | | 0 | 9 | 100 | 1.078.776 |
| 17 | Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. | m2 | 130 | 510.878 | 66.414.140 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 66.414.140 | 130 | 100 | 66.414.140 |
| 18 | Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 164 | 30.465 | 4.996.260 | 82 | 50 | 2.498.130 | 82 | 50 | 2.498.130 | 164 | 100 | 4.996.260 |
| 19 | Revoque :b- De pilares | m2 | 10,8 | 30.465 | 329.022 | 10,8 | 100 | 329.022 | 0 | | 0 | 10,8 | 100 | 329.022 |
| 20 | Revoque :c- De nivelacion | m2 | 18 | 30.465 | 548.370 | 18 | 100 | 548.370 | 0 | | 0 | 18 | 100 | 548.370 |
| 21 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | m2 | 73 | 35.959 | 2.625.007 | 73 | 100 | 2.625.007 | 0 | | 0 | 73 | 100 | 2.625.007 |
| 22 | Piso ceramico | m2 | 73 | 94.892 | 6.927.116 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100 | 6.927.116 | 73 | 100 | 6.927.116 |
| 23 | Zocalo ceramico | ml | 40 | 20.976 | 839.040 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 839.040 | 40 | 100 | 839.040 |
| 24 | Aberturas de maderas :a de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero | un | 1 | 958.913 | 958.913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 958.913 | 1 | 100 | 958.913 |
| 25 | Aberturas de maderas :b- de marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x1,20 | un | 2 | 781.114 | 1.562.228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1.562.228 | 2 | 100 | 1.562.228 |
| 26 | Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50(dos hojas) con marco y herrajes | un | 1 | 898.980 | 898.980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 898.980 | 1 | 100 | 898.980 |
| 27 | Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,70 | m2 | 10,2 | 299.660 | 3.056.532 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 100 | 3.056.532 | 10,2 | 100 | 3.056.532 |
| 28 | Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,00 p/ sshh | m2 | 6 | 307.651 | 1.845.906 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1.845.906 | 6 | 100 | 1.845.906 |
| 29 | Revestimiento de azulejo | m2 | 21,5 | 88.899 | 1.911.329 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 100 | 1.911.329 | 21,5 | 100 | 1.911.329 |
| 30 | Camara de inspeccion 0,60x0,60m (Según EE.TT.) | un | 2 | 374.575 | 749.150 | 2 | 100 | 749.150 | 0 | | 0 | 2 | 100 | 749.150 |
| 31 | Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 metros | gl | 1 | 3.113.138 | 3.113.138 | 1 | 100 | 3.113.138 | 0 | | 0 | 1 | 100 | 3.113.138 |
| 32 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 m | un | 1 | 3.816.329 | 3.816.329 | 1 | 100 | 3.816.329 | 0 | | 0 | 1 | 100 | 3.816.329 |
| 33 | Provisión y colocación de Lavatorio con griferia (Según EE.TT.) | un | 4 | 649.284 | 2.597.056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2.597.056 | 4 | 100 | 2.597.056 |
| 34 | Mesada de granito (Según EE.TT.) | m2 | 1,56 | 749.150 | 1.168.674 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 100 | 1.168.674 | 1,56 | 100 | 1.168.674 |
| 35 | Provisión y colocación de Inodoro | un | 2 | 869.014 | 1.738.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1.738.028 | 2 | 100 | 1.738.028 |
| 36 | Alfeizar en aberturas :a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ml | 49 | 24.971 | 1.223.579 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100 | 1.223.579 | 49 | 100 | 1.223.579 |
| 37 | Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel | ml | 3,5 | 61.929 | 216.752 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 100 | 216.752 | 3,5 | 100 | 216.752 |
| 38 | Pinturas :a- De parededes al latex | m2 | 146 | 23.972 | 3.499.912 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | 3.499.912 | 146 | 100 | 3.499.912 |
| 39 | Pinturas :b- De abertura de madera c/ barniz | m2 | 3,36 | 28.967 | 97.329 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | 100 | 97.329 | 3,36 | 100 | 97.329 |
| 40 | Pinturas :c-de mampostería visto comun latex | m2 | 60 | 24.472 | 1.468.320 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 1.468.320 | 60 | 100 | 1.468.320 |
| 41 | Pinturas :d- de revoque comun al latex | m2 | 58 | 24.472 | 1.419.376 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 | 1.419.376 | 58 | 100 | 1.419.376 |
| 42 | Pinturas :e- De estructura metalica de techo con pintura sintetica | m2 | 49 | 30.984 | 1.517.236 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100 | 1.517.236 | 49 | 100 | 1.517.236 |
| 43 | Pinturas :f- De aberturas metalicas balancines y puerta de acceso | m2 | 21 | 29.995 | 629.895 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 629.895 | 21 | 100 | 629.895 |
| 44 | Colocacion de Vidrios | m2 | 16 | 119.864 | 1.917.824 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 1.917.824 | 16 | 100 | 1.917.824 |
| 45 | Desague Pluvial- Canaleta y caño de bajada | ml | 28,8 | 80.908 | 2.330.150 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 100 | 2.330.150 | 28,8 | 100 | 2.330.150 |
| 46 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | m2 | 38,8 | 79.909 | 3.100.469 | 0 | 0 | 0 | 38,8 | 100 | 3.100.469 | 38,8 | 100 | 3.100.469 |

LIANCONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo Don Bosco - Av. Fortín Toledo

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios Públicos

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Instalacion electrica, conexiones y artefactos de iluminacion | gl | 1 | 6.952.119 | 6.952.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 6.952.119 | 1 | 100 | 6.952.119 |
| 48 | Instalacion sanitaria, agua corriente y desague cloacal | gl | 1 | 8.590.262 | 8.590.262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8.590.262 | 1 | 100 | 8.590.262 |
| 49 | Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas) | gl | 1 | 609.309 | 609.309 | 1 | 100 | 609.309 | 0 | | 0 | 1 | 100 | 609.309 |
| 50 | Limpieza Final | un | 1 | 1.076.779 | 1.076.779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.076.779 | 1 | 100 | 1.076.779 |
| | MONTO TOTAL | | | [illegible] | [illegible] | TOTAL CERTIFICADO | [illegible] | [illegible] | TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO | [illegible] | [illegible] | TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO | [illegible] | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Monto de Certificado | 128.793.424 |
| Descuento de Anticipo | |
| Fondo de Reparo | 6.439.671 |
| Total a Pagar por Certificado | 122.353.753 |

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

# Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodríguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

**CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES · PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS**

Av. Fortín Toledo y Bolivia · Tel.:(061) 574 293 / (0983) 400 102 · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

**TIMBRADO Nº 17017235**
**R.U.C.: 880202 - 5**
Fecha Inicio de Vigencia 08/02/2024
Fecha Fin de Vigencia 28/02/2025

# FACTURA

0001526

001-001

Fecha de Emisión: 10 de Abril de 2024 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu

R.U.C.: 80010478-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Km 16 Minga Guazu Tel.:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Valor de Ventas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exentas | 5% | 10% |
| 1 | Certificado de Obras Nº 2 Construcción de aula inicial. Escuela Basica Nº 6265 Cristo Rey. Contrato Nº 36/23. ID Nº 435976 Lote Nº 02 | 122.353.753 | | | 122.353.753 |
| **Sub Total** | | | | | 122.353.753 |
| **Total a Pagar:** Ciento veintidos millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres. | | | | | 122.353.753 |

**Liquidación del IVA:** 5% 10% 11.123.068 Total IVA 11.123.068

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 02 Tal 50x3 del 0001501 al 0001600 - 02/2024 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

**Ruc** : 8802025 JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

**Teléfono/s** : 061-574293 **Website** :

**Fax** : 061-574293 **Email Corp.:** elianconstruciones@hotmail.com

**Dirección** : AVENIDA, AV. FORTIN TOLEDO Y LA BLANCA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

**Estado** : Activo

**Se registró en REPSE bajo el N° 014867**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 18/10/2024

Otorgado en Asunción, el 18/10/2018

Renovado el 03/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

**Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py**

8802025

13042023 1448 8802025 8802025

**014867**

Lote 5675321063 , Cons.: 12

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270173952351

FORM.427-1

FECHA 09/04/2024

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 880202 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 5 | BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 09/05/2024

NÚMERO DE CONTROL : 991208FB

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427188020299120 8FB

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 880202 NRO. CERTIFICADO: 424873

FECHA EMISION: 14-03-2024 VENCIMIENTO: 14-04-2024

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 880202 Nro. Certificado: 424873

Razon Social: BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha de Inscripcion: 14-11-2003 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0505-84-0479 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

**Licitación 435976 - CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024**

**Contrato Nº 36/23 Lote 02 - Construcción de Aula Nivel Inicial Escuela Básica Nº 6265 Cristo Rey**

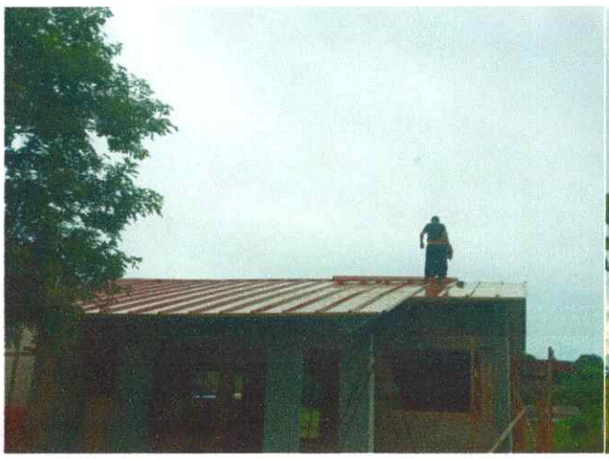

Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

**Licitación 435976 - CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024**

**Contrato Nº 36/23 Lote 02 - Construcción de Aula Nivel Inicial Escuela Básica Nº 6265 Cristo Rey**
