GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 2

MES: Enero

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(1+2)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313	100%	520,348,500	7.42%	38,635,876	35.27%	183,514,124	42.69%	222,150,000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**520,348,500**	**7.42%**	**38,635,876**	**35.27%**	**183,514,124**	**42.69%**	**222,150,000**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313

Certificado Básico N°	2
Mes:	Enero
Contrato N°:	46/2024
Monto Básico:	520,348,500
Contratista:	JL Y COMPAÑÍA
Fecha de Inicio:	28/11/2024
Plazo de Ejecución:	180 días
Fecha de terminación prevista:	27/05/2025
Prórroga:	0
Fecha de terminación con prórroga:	27/05/2025
Vigencia Póliza de Contrato:	13/03/2026
Vigencia Póliza de Anticipo:	12/01/2026

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20.00%*	104,069,700	7,727,175	36,702,825	44,430,000
B.II	Para Fondo de Reparo	*0.00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**104,069,700**	**7,727,175**	**36,702,825**	**44,430,000**

C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	146,811,299
C.II	Multas	0
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	**146,811,299**

SON GUARANÍES: Ciento cuarenta y seis millones ochocientos once mil doscientos noventa y nueve.-

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
JL Y COMPAÑIA
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Claudio Gaona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

2

GOBERNACION DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N°: 2

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Enero

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313			
CONTRATISTA:	JL Y COMPAÑÍA	FECHA DE INICIO:	28/11/2024
MONTO DE LA OFERTA:	520,348,500	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/05/2025
CONTRATO N°:	46/2024	PRÓRROGA:	0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 días	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	27/05/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1.00	1,400,000	1,400,000	0.003	100.00%	0.00%	100.00%	0.27%	0.00%	0.27%	1.00	0.00	1.00	1,400,000	0	1,400,000
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1.00	19,000,000	19,000,000	0.037	74.29%	25.71%	100.00%	2.71%	0.94%	3.65%	0.74	0.26	1.00	14,115,876	4,884,124	19,000,000
3	Demolición del puente de hormigón existente.	Unidad Medida Global	1.00	18,500,000	18,500,000	0.036	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	14.25	1,100,000	15,675,000	0.030	70.18%	0.00%	70.18%	2.11%	0.00%	2.11%	10.00	0.00	10.00	11,000,000	0	11,000,000
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Metro lineal	40.00	6,060,000	242,400,000	0.466	5.00%	65.00%	70.00%	2.33%	30.28%	32.61%	2.00	26.00	28.00	12,120,000	157,560,000	169,680,000
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	41.45	3,010,000	124,764,500	0.240	0.00%	16.89%	16.89%	0.00%	4.05%	4.05%	0.00	7.00	7.00	0	21,070,000	21,070,000
7	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	24.00	630,000	15,120,000	0.029	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
8	Provisión de Ripio (longitud: 1836m, ancho: 9m, altura:0,5m). No incluye flete	Metros cúbicos	8,262.00	9,500	78,489,000	0.151	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2.00	1,100,000	2,200,000	0.004	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
10	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4.00	450,000	1,800,000	0.003	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1.00	1,000,000	1,000,000	0.002	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
				TOTAL	520,348,500	1.00				7.42%	35.27%	42.69%				38,635,876	183,514,124	222,150,000

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

JL Y COMPAÑIA
Contratista-Representante Legal

Ing. Silvio Meza

JL Y COMPAÑIA
Residente de Obra

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Claudio Gaona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalizacion de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313

CONTRATISTA:	JL Y COMPAÑÍA
MONTO DE LA OFERTA GS:	520,348,500
CONTRATO N°:	46/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 dias

FECHA DE INICIO:	28/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/05/2025
PRÓRROGA:	0
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	27/05/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313												
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000						0.27%
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1.00	19,000,000	19,000,000	11,400,000	7,600,000					3.65%
3	Demolición del puente de hormigón existente.	Unidad Medida Global	1.00	18,500,000	18,500,000						18,500,000	3.56%
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	14.25	1,100,000	15,675,000	1,567,500	4,702,500	9,405,000				3.01%
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Metro lineal	40.00	6,060,000	242,400,000	12,120,000	48,480,000	72,720,000	109,080,000			46.58%
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	41.45	3,010,000	124,764,500			12,476,450	37,429,350	74,858,700		23.98%
7	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	24.00	630,000	15,120,000					7,560,000	7,560,000	2.91%
8	Provisión de Ripio (longitud: 1836m, ancho: 9m, altura:0,5m). No incluye flete	Metros cúbicos	8,262.00	9,500	78,489,000					39,244,500	39,244,500	15.08%
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2.00	1,100,000	2,200,000						2,200,000	0.42%
10	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4.00	450,000	1,800,000						1,800,000	0.35%
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1.00	1,000,000	1,000,000						1,000,000	0.19%

TOTAL	520,348,500						TOTAL	100.00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANÍES		26,487,500	60,782,500	94,601,450	146,509,350	121,663,200	70,304,500	520,348,500
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		5.09%	11.68%	18.18%	28.16%	23.38%	13.51%	100%
ACUMULADO PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		5.09%	16.77%	34.95%	63.11%	86.49%	100.00%	

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
JL Y COMPAÑIA
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Claudio Gaona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

6

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Enero

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313

Contrato N°: 46/2024			
Monto del Contrato:	520,348,500	**Fecha de terminación prevista:**	27/05/2025
Plazo Contractual:	180 días	**Prórroga:**	0
Inicio de Obra:	28/11/2024	**Fecha de terminación con prórroga:**	27/05/2025

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MES 1	26,487,500	26,487,500	38,635,876 ₲	38,635,876 ₲	5.09%	5.09%	7.42%	7.42%
MES 2	60,782,500	87,270,000	183,514,124 ₲	222,150,000 ₲	11.68%	16.77%	35.27%	42.69%
MES 3	94,601,450	181,871,450			18.18%	34.95%		
MES 4	146,509,350	328,380,800			28.16%	63.11%		
MES 5	121,663,200	450,044,000			23.38%	86.49%		
MES 6	70,304,500	520,348,500			13.51%	100.00%		

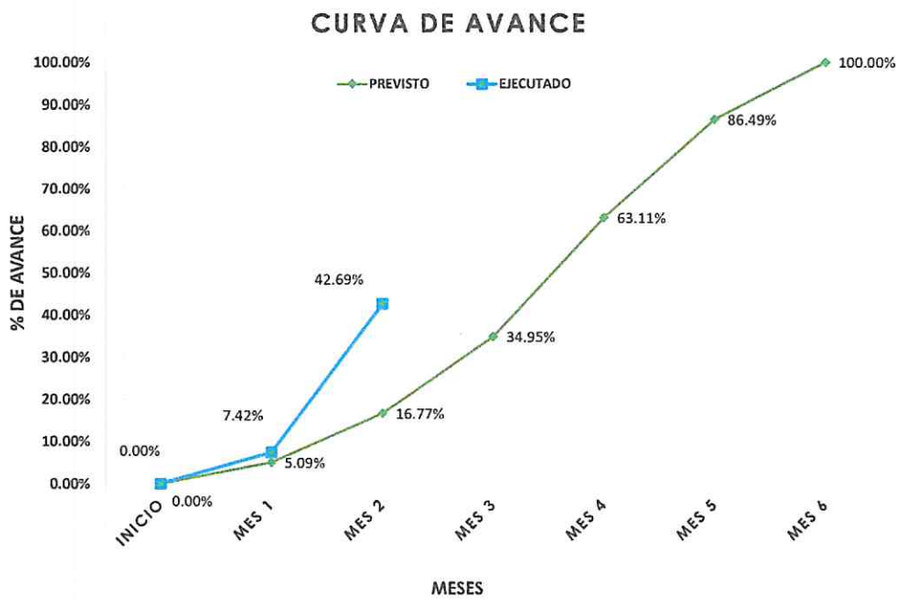

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Claudio Gaona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
