GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 2

Mes: Marzo

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1	100%	190.000.000	25,60%	48.640.762	74,40%	141.359.238	100,00%	190.000.000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**190.000.000**	**25,60%**	**48.640.762**	**74,40%**	**141.359.238**	**100,00%**	**190.000.000**

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	38.000.000	9.728.152	28.271.848	38.000.000
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**38.000.000**	**9.728.152**	**28.271.848**	**38.000.000**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				113.087.390	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**113.087.390**	

Certificado Básico Nº	**2**
Mes:	**Marzo**
Contrato N°:	**53/2023**
Monto Básico:	**190.000.000**
Contratista:	**Jesús Manuel Esquivel**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**30 dias**
Suspensión de Plazo	**50 dias**
Fecha de terminación con Suspencion:	**05-mar-24**
Poliza Vigencia desde:	**30-nov-23**
Poliza Vigencia Hasta:	**29-mar-24**

SON GUARANIES: Ciento trece millones ochenta y siete mil trescientos noventa.-

Jesús Manuel Esquivel
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN 2

OBRA: CONTRATO N° 53/2023. Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada – Plurianual ID N° 434.111.-

CONTRATISTA: JMC. Construcciones

En la ciudad de Cambyreta, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 12 días del mes de marzo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Fernando Oreggioni, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Sr. Jesús Manuel Esquivel como Representante Legal de la Contratista.

Quienes suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de marzo del presente año

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presenta Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

Contratista
Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

Mes: Marzo

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1			
CONTRATISTA:	Jesús Manuel Esquivel	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	190.000.000		
CONTRATO N°:	53/2023	**SUSPENSIÓN:**	50 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 dias	**FECHA DE TERMIACION CON SUSPENCION:**	05-mar-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	**Construcción de empedrado**																	
1	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.060.640	1.060.640	0,006	100,00%	0,00%	100,00%	0,006	-	0,006	1,00	0,00	1,00	1.060.640	0	1.060.640
2	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000	0,035	100,00%	0,00%	100,00%	0,035	-	0,035	1,00	0,00	1,00	6.600.000	0	6.600.000
3	Construcción de empedrado - Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	97,13	45.000	4.370.722	0,023	100,00%	0,00%	100,00%	0,023	-	0,023	97,13	0,00	97,13	4.370.722	0	4.370.722
4	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	163,34	25.000	4.083.500	0,021	100,00%	0,00%	100,00%	0,021	-	0,021	163,34	0,00	163,34	4.083.500	0	4.083.500
5	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo - relleno, nivelación y compactación	Metros cúbicos	245,02	45.000	11.025.900	0,058	100,00%	0,00%	100,00%	0,058	-	0,058	245,02	0,00	245,02	11.025.900	0	11.025.900
6	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.123,64	32.000	67.956.480	0,358	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,358	0,358	0,00	2.123,64	2.123,64	0	67.956.480	67.956.480
7	Construcción de empedrado - Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	2.123,64	3.500	7.432.740	0,039	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,039	0,039	0,00	2.123,64	2.123,64	0	7.432.740	7.432.740
8	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,95	990.000	935.550	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	0,95	0,95	0	935.550	935.550
9	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	45,50	1.100.000	50.044.500	0,263	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,263	0,263	0,00	45,50	45,50	0	50.044.500	50.044.500
10	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento de H° Pobre	Metro lineal	50,00	430.000	21.500.000	0,113	100,00%	0,00%	100,00%	0,113	-	0,113	50,00	0,00	50,00	21.500.000	0	21.500.000
11	Construcción de empedrado - Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	5,18	2.400.000	12.441.600	0,065	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,065	0,065	0,00	5,18	5,18	0	12.441.600	12.441.600
12	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.123,64	1.200	2.548.368	0,013	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,013	0,013	0,00	2.123,64	2.123,64	0	2.548.368	2.548.368
	Total				**190.000.000**	**1,000**				25,60%	74,40%	100%				48.640.762	141.359.238	190.000.000

Jesús Manuel Esquivel
Contratista-Representante Legal

CONSTRUCCIONES

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Quarcioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
Mes: Marzo

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1			
CONTRATISTA:	Jesús Manuel Esquivel	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA G$:	190.000.000		
CONTRATO N°:	53/2023	**SUSPENCION:**	50 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 dias	**FECHA DE TERMIACION CON SUSPENCION:**	05-mar-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Construcción de empedrado									
1	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.060.640	1.060.640	1.060.640	0	0	0	0,56%
2	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000	0	0	6.600.000	0	0,00%
3	Construcción de empedrado - Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	97,13	45.000	4.370.722	0	0	4.370.722	0	0,00%
4	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	163,34	25.000	4.083.500	0	0	4.083.500	0	0,00%
5	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo - relleno, nivelación y compactación	Metros cúbicos	245,02	45.000	11.025.900	0	0	11.025.900	0	0,00%
6	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.123,64	32.000	67.956.480	0	0	67.956.480	0	0,00%
7	Construcción de empedrado - Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	2.123,64	3.500	7.432.740	0	0	7.432.740	0	0,00%
8	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,95	990.000	935.550	0	0	935.550	0	0,00%
9	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	45,50	1.100.000	50.044.500	0	0	50.044.500	0	0,00%
10	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento	Metro lineal	50,00	430.000	21.500.000	0	0	21.500.000	0	0,00%
11	Construcción de empedrado - Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	5,18	2.400.000	12.441.600	0	0	12.441.600	0	0,00%
12	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.123,64	1.200	2.548.368	1.274.184	0	0	1.274.184	0,67%
	Total				**190.000.000**					
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						2.334.824	0	186.390.992	1.274.184	**190.000.000**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						1,23%	0,00%	98,10%	0,67%	**100%**

Jesús Manuel Esquivel
Contratista-Representante Legal

CONSTRUCCIONES

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: Marzo

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA Y NUEVA ALBORADA" I.D. Nº 434.111.- LOTE N°1

Contrato N°: 53/2023			
Monto del Contrato:	190.000.000	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
Plazo Contractual:	30 dias	**SUSPENCION:**	50 dias
Inicio de Obra:	18-dic-23	**FECHA DE TERMIACION CON SUSPENCION:**	05-mar-24

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	2.334.824	2.334.824	0	0	1,23%	1,23%	0,00%	0,00%
Enero	0	2.334.824	0	0	0,00%	1,23%	0,00%	0,00%
Febrero	186.390.992	188.725.816	48.640.762	48.640.762	98,10%	99,33%	25,60%	25,60%
Marzo	1.274.184	190.000.000	141.359.238	190.000.000	0,67%	100,00%	74,40%	100,00%

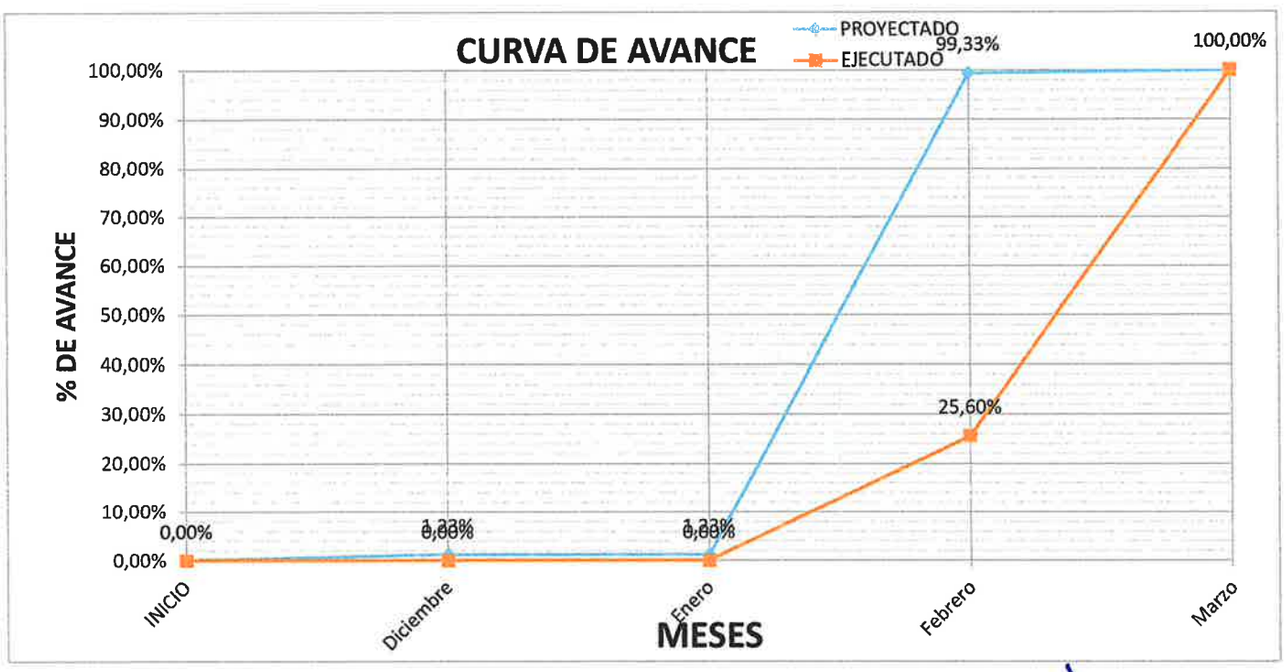

Jesús Manuel Esquivel
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oraggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Itapua Tavusuo Gobernación de Itapúa

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

INFORME DE OBRAS

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 09/2023 "Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyretá y Nueva Alborada" ID N° 434.111

OBRA: Construcción de Empedrado en los distritos de Cambyretá y Nueva Alborada.

BENEFICIARIO: Cambyretá.

FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni.

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Área Urbana – San Miguel	Cambyretá	190.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
JMC construcciones	0985 204314	53/2023

OBSERVACIONES GENERALES:

La fiscalización ha realizado la visita el 12/03/24 y se ha constatado que los trabajos correspondientes a la observación del Acta de Recepción Provisoria ha sido ejecutada correctamente en los siguientes rubros; Movimiento de suelo (relleno, nivelación y compactación), corrección de piedras que superan los 20cm, adecuando a las recomendaciones técnica, se realizó la demolición de cordones y reposición de los mismos en los sectores indicados y para trabajo final se realizó la compactación de la pista.

El avance hasta la fecha es de 100%, según su cronograma físico financiero.

La ejecución se dio de forma continua y siguiendo las recomendaciones indicadas.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobierno Departamental de Itapúa

Itapua Tavusuo
Gobernación de Itapúa

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

Ing.
Secretario
Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Publicas y Transporte

Itapua Tavusuo
Gobernación de Itapúa

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
