CONSULTORA DE OBRAS CIVILES ''YSYRY''

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGANA

ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: MAYO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NAC. LUIS M. ARGANA		138.599.730	0,00%	36,24%	36,24%	-	50.233.680	50.233.680
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	27.719.946	0,00%	36,24%	36,24%	-	10.046.736	10.046.736
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	6.929.987	0,00%	36,24%	36,24%	-	2.511.684	2.511.684
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**34.649.933**	0,00%	36,24%	36,24%	**-**	**12.558.420**	**12.558.420**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**0**	**37.675.260**	**37.675.260**

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc: 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

CONSULTORA DE OBRAS CIVILES ''YSYRY''

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGANA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: MAYO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGANA

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra	Unidad Medida Global	1											
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material	Metros cuadrados	450	108.000	48.600.000									
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de IM	Metros cuadrados	336	9.000	3.024.000									
	Revoques	Metros cuadrados	336	39.330	13.214.880									
	Aberturas	Unidad Medida Global	1											
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)	Unidad	7	1.485.000	10.395.000		7,00	7,00		10.395.000	10.395.000		100,00%	100,00%
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo 40 cm	Metro lineal	123,6	54.000	6.674.400		61,80	61,80		3.337.200	3.337.200		50,00%	50,00%
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1											
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT	Metros cuadrados	840	22.770	19.126.800		840,00	840,00		19.126.800	19.126.800		100,00%	100,00%
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	41	27.000	1.107.000		41,00	41,00		1.107.000	1.107.000		100,00%	100,00%
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex	Metros cuadrados	450	34.200	15.390.000		450,00	450,00		15.390.000	15.390.000		100,00%	100,00%
	De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	26,5	33.120	877.680		26,50	26,50		877.680	877.680		100,00%	100,00%
	De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	123,6	32.400	4.004.640									
	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1											
	Retiro de Cableado Existente	Unidad Medida Global	1	517.500	517.500									
	Cableado Nuevo Completo (Induye tomas, Puntos y Llaves TM)	Unidad Medida Global	1	4.657.500	4.657.500									
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes	Unidad	12	180.000	2.160.000									
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40	Unidad	12	80.640	967.680									
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40	Unidad	4	75.600	302.400									
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40	Unidad	32	135.000	4.320.000									
	Limpieza de obra	Metros cuadrados	450	7.245	3.260.250									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**138.599.730**					**50.233.680**	**50.233.680**		**36,24%**	**36,24%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

CONSULTORA DE OBRAS CIVILES ''YSYRY''

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

N DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS M

375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS C

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: MAYO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 02 dias de Junio del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "YSYSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES", REPRESENTADA POR LA IG. IND. MARIA LUISA ESTECHE SETRINI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra	Unidad Medida	1			
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material	Metros cuadrados	450		0,00	0,00
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de IM	Metros cuadrados	336		0,00	0,00
	Revoques	Metros cuadrados	336		0,00	0,00
	Aberturas	Unidad Medida Global	1			0,00
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)	Unidad	7		7,00	7,00
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo 40 cm	Metro lineal	123,6		61,80	61,80
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT	Metros cuadrados	840		840,00	840,00
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	41		41,00	41,00
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex	Metros cuadrados	450		450,00	450,00
	De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	26,5		26,50	26,50
	De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	123,6			0,00
	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1			0,00
	Retiro de Cableado Existente	Unidad Medida Global	1			0,00
	Cableado Nuevo Completo (Incluye tomas, Puntos y Llaves TM)	Unidad Medida Global	1			0,00
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes	Unidad	12			0,00
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40	Unidad	12			0,00
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40	Unidad	4			0,00
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40	Unidad	32			0,00
	Limpieza de obra	Metros cuadrados	450			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

CONSULTORA DE OBRAS CIVILES ''YSYRY''

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGANA

ID Nº: 375,570 CONTRATO Nº 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO																
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**138.599.730**																
TIEMPO DE EJECUCION	**90 dias**																
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**08/05/2020**				**08/06/2020**				**13/07/2020**						**Monto**	**%**
	0																
	Preparación de la Obra															48.600.000	35,07
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material															3.024.000	2,18
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de 1M															13.214.880	9,53
	Revoques															0	0,00
	Aberturas															10.395.000	7,50
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)															6.674.400	4,82
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo															0	0,00
	Servicio de pintura															19.126.800	13,80
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT															1.107.000	0,80
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica															15.390.000	11,10
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex															877.680	0,63
	De Abertura de Madera con Barniz															4.004.640	2,89
	De Canaletas al Sintetico															0	0,00
	Construccion e instalaciones electricas															517.500	0,37
	Retiro de Cableado Existente															4.657.500	3,36
	Cableado Nuevo Completo (Incluye tomas, Puntos y Llaves TM)															2.160.000	1,56
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes															967.680	0,70
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40															302.400	0,22
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40															4.320.000	3,12
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40															3.260.250	2,35
	Limpieza de obra															**138.599.730**	100,00
	TOTAL																

Contractual			
Monto Bruto Mensual Contractual	**45.737.911**	**91.475.822**	**138.599.730**
Porcentaje Avance Mensual Contractual	**33,00%**	**33,00%**	**34,00%**
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	**33,00%**	**66,00%**	**100,00%**

Certificado			
Monto Bruto Mensual Certificado	**50.233.680**		
Porcentaje Avance Mensual Certificado	**36,24%**		
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	**36,24%**		

	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	33,00%	66,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	36,24%		

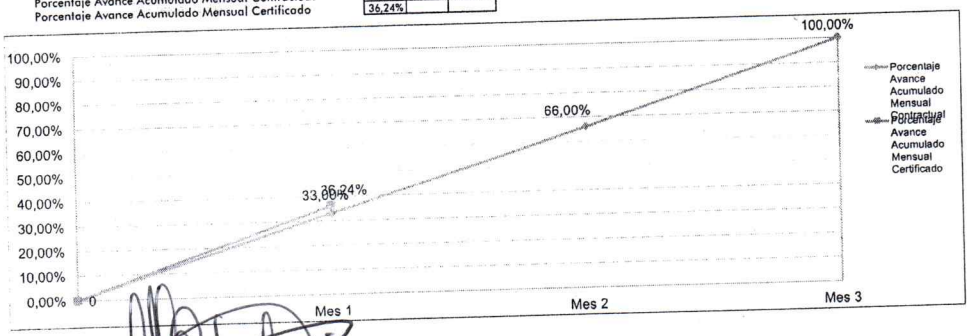

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9
