DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

Asunción, 14 de octubre del 2024

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Recibido
Fecha: 15/10/24 Hora: 10:30
Recibido por:

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - UNA

Decano: Prof. Arq. Jose Insfrán.

Dirección Administrativa y Financieras: C.P. Lucio Medina

Por la presente realizamos la solicitud de Certificación N. 3 del contrato principal PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA.

Descripción	Monto
Certificado 3	₲ 644.914.014
Descuento de Anticipo:	₲ 128.982.803
Importe a Pagar	₲ 515.931.211

Importe a Pagar: GS 515.931.211 - (guaraníes quinientos quince millones novecientos treinta y un mil doscientos once).

Cordialmente

RICARDO DIAZ MARTINEZ

Ing. Ricardo Diaz Martínez

Director Ejecutivo y Representante Legal

a UOC - verificar
a Tesorería - previsión y solicitud planilla -
a Fiscal de Obras p/ Informe
a Supervisor de Obras.

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

15 OCT 2024

DÍAZ MARTÍNEZ
CONSTRUCTORA

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Exp. 1550
Fecha: 25/10/24 Hora: 15:40
Recibido por:

946

Asunción, 25 DE OCTUBRE de 2024

Sr.
Prof. Arq. José Gregorio Insfrán Guerrero
Decano Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte / Universidad Nacional de Asunción
Presente
NOTA RDM FADA Nº 09/2024

REFERENCIA Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA- ID Nº 435.469

Motivo: FACTURA CERTIFICADO Nº 03

Por la presente me dirijo a Ustedes, para hacer entrega de la factura según se detalla a continuación:

CERTIFICADO Nº 3

- Factura Credito Electronica Nº 001-001-0000062
- Fecha: 24/10/2024
  Monto: Gs. 515.931.211
- Certificado de cumplimiento tributario
- Certificado de Cumplimiento con Ips
- Formulario FIP
- Formulario FIS

Sin otro motivo, me despido,
Atentamente. -

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal

FADA / UNA
REMISIÓN DE EXPEDIENTES A OTRAS DEPENDENCIAS
USO INTERNO

Número de EXP.:
Fecha de Ingreso:
Se remite el siguiente exp. para informe. Obs.:

Dirección Administrativa	Dirección del ISA
Dirección Académica	Dirección de Danza
Dirección de Posgrado	TIC
Dirección del DPA	Coordinación de Acreditación
Dirección de Investigación	Coordinación de Cultura
Dirección de Extensión Educativa	Coordinación de Publicaciones
Dirección del IA de Bellas Artes	Servicios Generales
Dirección de Proyectos	Consejo Directivo
Dirección de Arquitectura y Urb.	Dirección de Música
Dirección de Diseño Industrial	Dirección de Planificación
Asesoría Jurídica	Secretaría de la FADA

OBS.:

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

25/10/24

- a Tesoreria
- a UOC
- a Fiscal de Obras
- a Supervisor de Obras
- a Auditoria Interna

021 207 699

25 OCT 2024

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo

DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

Factura electrónica
001-001-0000062

DM CONSTRUCTORA

Dirección: JHON F KENNEDY 1083 1083

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Telefono: 021229869, 0986168553, 0984796861

Email: administracion@diazconstrucciones.com.py

RUC: 310695-0

Timbrado N°: 17287939

Fecha de inicio de vigencia: 13-06-2024

Actividad económica: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS,PREPARACIÓN DEL TERRENO,COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P,CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha y hora de emision: 24-10-2024 14:26:05

Condición de venta: Crédito

Cuotas:

Moneda: PYG

Tipo de cambio global:

Documento asociado CDC o preimpreso:

Tipo de documento asociado:

RUC/Documento de identidad: 80001736-6

Nombre o razón social: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE (U.N.A.)

Dirección: CAMPUS UNIVERSITARIO 1234

Teléfono: 021585558

Correo Electrónico: dylanjesus1412@gmail.com

Tipo de transacción: Prestación de servicios

Fecha de vencimiento: 24-11-2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Exento	IVA 5%	IVA 10%
011	CONTRATO N° 042/2023-PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA- SEDE SAN LORENZO	1	644.914.014	128.982.802,8	0	0	515.931.211

Subtotal: 515.931.211

Total de la operación: PYG 515.931.211

Liquidación IVA 5%: 0 | Liquidación IVA 10%: 46.902.837 | Total IVA: 46.902.837

Observación: CERTIFICADO DE OBRAS N° 3

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
CDC: 01003106950001001000006222024102416752364939
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Ingeniero Civil

RESUMEN CERTIFICADO 3

OBRA: PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA -SEDE SAN LORENZO ID 435.469
PROPIETARIO: FACULTAD DE ARQUITECTURA - UNA
CIUDAD: CAMPUS UNIVERSITARIO, SAN LORENZO
CONTRATO N°: ID 435.469
FECHA: 11/9/2024

TOTAL CONTRATO (GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
5.226.000.879	931.650.774	644.914.014	1.576.564.788	3.649.436.091	30,2%

TOTAL ANTICIPO(GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
1.045.200.176	186.330.132	128.982.803	315.312.935	729.887.241	30,2%

IMPORTE A PAGAR	**515.931.211**

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5134
Tel.: (0983) 492 5[illegible]

ING. MIGUEL PALOMINO
REPRESENTANTE EN OBRA DE
CONTRATISTA : DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

ING. RICARDO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

ARQ. ESTEFANIA NUÑEZ
FISCAL DE OBRA

729.887.241

PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA - SEDE SAN LORENZO — ID 435.469

Contratista: RICARDO DIAZ MARTINEZ | **Certificado: 003** | **Fecha: 03-10-2024**

DIM. DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES			MONTOS			AVANCE EN %
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES											
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	6.147	9.220.500	1500	0,00	1.500,00	9.220.500	0	9.220.500	100%
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	4.964.746	4.964.746	1	0,00	1,00	4.964.746	0	4.964.746	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	922	1.383.000	1200	0,00	1.200,00	1.106.400	0	1.106.400	80%
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	744.712	744.712	1	0,00	0,80	595.770	0	595.770	80%
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mín=1,80m	M2	700	49.174	34.421.800	700	0,00	700,00	34.421.800	0	34.421.800	100%
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	18.535.051	18.535.051	1	0,00	1,00	18.535.051	0	18.535.051	100%
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	2.245.957	2.245.957	1	0,00	1,00	2.245.957	0	2.245.957	100%
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.063.874	1.063.874	1	0,00	1,00	1.063.874	0	1.063.874	100%
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1	614.683	614.683	1	0,00	1,00	614.683	0	614.683	100%
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	330.983	330.983	1	0,00	1,00	330.983	0	330.983	100%
		NIVEL FUNDACIÓN						0,00		0	0		
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	Unidad	112	2.634.355	295.047.760	85	27,00	112,00	223.920.175	71.127.585	295.047.760	100%
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	158.871.865	158.871.865	1	0,24	1,00	120.742.617	38.129.248	158.871.865	100%
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	Unidad	112	122.937	13.768.944	67	45,00	112,00	8.236.779	5.532.165	13.768.944	100%
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	7.414.020	7.414.020	1	0,40	1,00	4.448.412	2.965.608	7.414.020	100%
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	39.955	19.977.500	200	150,00	350,00	7.991.000	5.993.250	13.984.250	70%
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	10.756.949	10.756.949	0	0,30	0,70	4.302.780	3.227.085	7.529.864	70%
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	15.367	1.536.700	40	35,00	75,00	614.680	537.845	1.152.525	75%
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	827.458	827.458	0	0,35	0,75	330.983	289.610	620.594	75%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	1.966.985	786.794.000	160	120,00	280,00	314.717.600	236.038.200	550.755.800	70%
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	423.658.305	423.658.305	0	0,30	0,70	169.463.322	127.097.492	296.560.814	70%
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	ML	100	245.873	24.587.300	10	65,00	75,00	2.458.730	15.981.745	18.440.475	75%
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.239.322	13.239.322	0	0,65	0,75	1.323.932	8.605.559	9.929.492	75%
		TECHO PLANTA BAJO NIVEL +3,60alto				0	0	0,00	0,00	0	0	0	
23	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,5	307.342	44.103.577	0	60,00	60,00	0	18.440.520	18.440.520	42%
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	23.748.034	23.748.034	0	0,42	0,42	0	9.974.174	9.974.174	42%
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	m3	284,3	2.151.390	611.640.177		30,00	30,00	0	64.541.700	64.541.700	11%
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072		0,11	0,11	0	36.432.228	36.432.228	11%
		NIVEL +1 +7,20				0				0	0	0	
29	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ml	127,1	307.342	39.063.168				0	0	0	0%
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973				0	0	0	0%
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484				0	0	0	0%
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491				0	0	0	0%
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	2.151.390	611.640.177				0	0	0	0%
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072				0	0	0	0%
		NIVEL +2 +10,80				0				0	0	0	
35	72131601-015	Pilar. Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ML	127,1	307.342	39.063.168				0	0	0	0%
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973				0	0	0	0%
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484				0	0	0	0%
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491				0	0	0	0%
39	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	2.151.390	611.640.177				0	0	0	0%

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5134
Tel.: (0983) 492 599

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

							CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA Incluído)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE EN %
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
		NIVEL TECHO				0	0	0,00	0,00	0	0	0	
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas- 3,2 ml)	ML	127,1	307.342	39.063.168	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
45	30101717-001	Viga	ML	435,5	307.342	133.847.441	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	71.998.327	71.998.327	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO G$						5.226.000.879			TOTAL G$	931.650.774	644.914.014	1.576.564.788	30,2%

ING. MIGUEL PALOMINO

REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5134
Tel.: (0983) 492 599

ING. RICARDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA:
DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ

FISCAL DE OBRA

1.576.564.788

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA - SEDE SAN LORENZO

ID 435.469

Contratista: RICARDO DIAZ MARTINEZ | **ACTA: 003** | **Fecha: 03-10-2024**

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE EN %
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	1.500,0		1.500,0	100%
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	1.200,0		1.200,0	80%
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,8		0,8	80%
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mín=1,80m	M2	700	700,0		700,0	100%
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	1,0		1,0	100%
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1	1,0		1,0	100%
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
		NIVEL FUNDACIÓN						
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	Unidad	112	85,0	27,00	112,0	100%
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,8	0,24	1,0	100%
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	Unidad	112	67,0	45,00	112,0	100%
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,6	0,40	1,0	100%
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	200,0	150,00	350,0	70%
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,4	0,30	0,70	70%
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	40,0	35,00	75,0	75%
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,4	0,35	0,8	75%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	160,0	120,00	280,0	70%
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,4	0,30	0,70	70%
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	ML	100	10,0	65,00	75,0	75%
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,1	0,65	0,8	75%
		TECHO PLANTA BAJO NIVEL +3,60alto			-		0,0	
23	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,5	-	60,00	60,0	42%
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	0,42	0,4	42%
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	-		0,0	0%
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,0	0%

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5134
Tel.: (0983) 492 599

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE EN %
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	m3	284,3		30,00	30,00	11%
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1		0,11	0,11	11%
		NIVEL +1 +7,20					0,00	
29	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ml	127,1			0,00	0%
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6			0,00	0%
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3			0,00	0%
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
		NIVEL +2 +10,80					0,00	
35	72131601-015	Pilar. Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ML	127,1			0,00	0%
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6			0,00	0%
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
39	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3			0,00	0%
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
		NIVEL TECHO					0,00	
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas- 3,2 ml)	ML	127,1			0,00	0%
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6			0,00	0%
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%
45	30101717-001	Viga	ML	435,5			0,00	0%
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1			0,00	0%

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5134
Tel.: (0988[illegible]

ING. MIGUEL PALOMINO

REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

Arq. Estefanía Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ

FISCAL DE OBRA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Lorenzo, 15 de octubre del 2024

Ref. Entrega de informe avance de obras.
Tercer certificado

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Exp.: 10240
Fecha: 15/10/24 Hora: 16:50'
Recibido por: Olga

914

Señor
Prof. Ar. José Insfrán, Decano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – UNA
Presente

Estimado Sr. Decano,

En mi calidad de fiscal de obras del ID Nro. 435.469, me complace dirigirme a usted para entregar el informe analizado del avance de obras en el campo del trabajo, realizado por la empresa Ricardo Diaz Martínez adjudicado en el Marco de Licitación Pública Nacional 01/2023 correspondiente al Proyecto Ampliación de Aulas, componente 1 de la FADA.UNA.

A Continuación, detallo los rubros realizados, con relevamiento fotográfico, considerado hasta la fecha martes 15 de octubre del corriente.

Avance de cargamento de Pilotes en plano 121/121

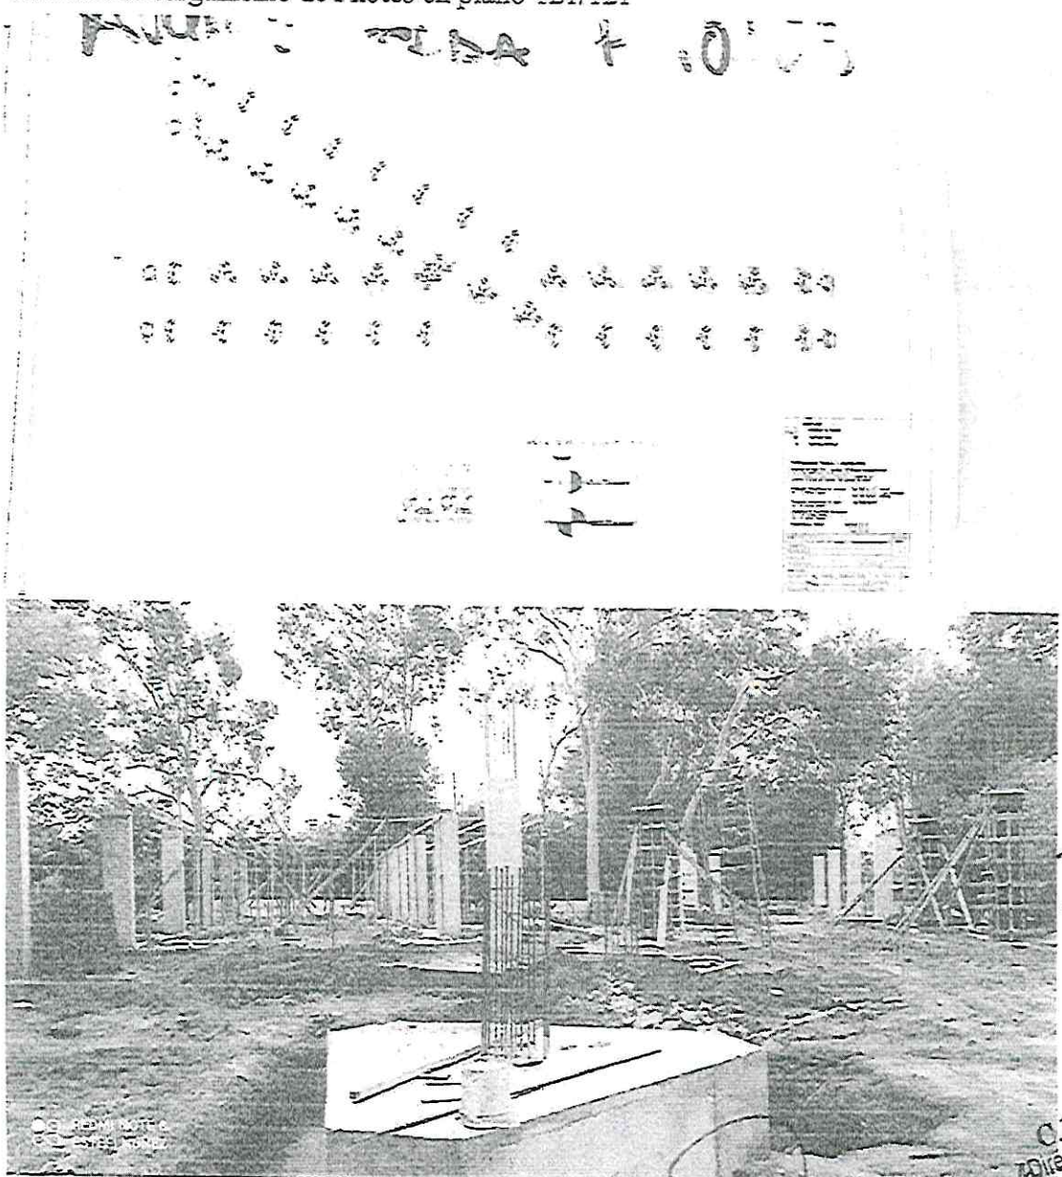

- a Tesorería
- a Fiscalización Interna
- a/oc

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino

07 NOV 2024

- K Julio Palacios

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

Avance de cargamento de cabezales en plano 33 unidades/46

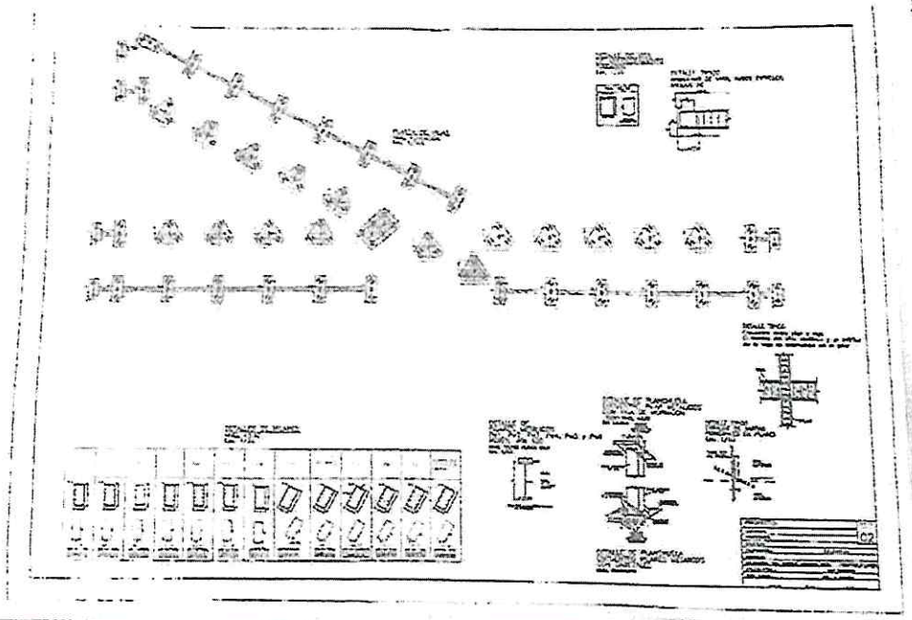

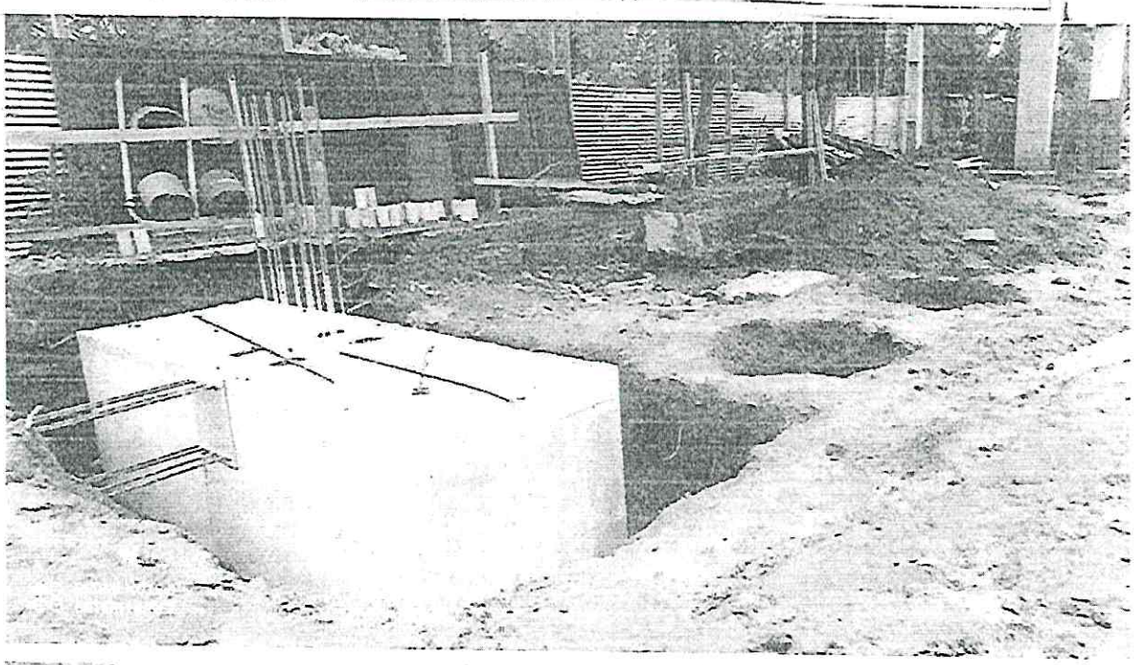

Las fotografías de avance amparan
En cuanto al contrato inicial de la ampliación de las aulas, contamos con:

1. 121 pilotes excavados y 121 cargados, este rubro se culminó, 33 cabezales regulares y triangulares hasta la fecha del dia, faltan 13 para terminar la fundación total.
2. Bloque 1: Del lado izquierdo tenemos construido 12 pilares, y encofrado de losa.
3. Bloque 2: De lado derecho construidos 8 pilares y 4 encofrados, armados aun sin cargamento.
4. Bloque 3: Dos encofrados y armado de cabezales rectangulares, y sellado de pilotes, adjunto también copias del Libro de obra.

Esperando haber cumplido con la solicitud de este parecer técnico, me despido quedando a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que considere necesaria.
Atentamente.

Prof.Arq.Estefania Nùñez Leòn
Fiscalizaciòn FADA/UNA
ID Nro.435.469

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Lorenzo, 16 de octubre del 2024.

Prof. Arq. **JOSE GREGORIO INSFRÁN GUERRERO** – Decano. -

FADA – UNA .-

Presente

Por la presente informo que se ha procedido a la verificación del Certificado de Obra N° 3 presentado por la empresa RDM Construcciones encargada de la obra "Ampliación del Bloque de Aulas-Etapa 1" LPN 01/2023, ante las verificaciones le informo que corresponde el pago a la empresa en virtud a los ítems de avances informados.

Le saludo cordialmente.

Arq. JULIO PALACIOS BARRIOCANAL.
Supervisor de Obra

Prof. Arq. José G. Insfrán G.
Decano

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo
