ecoservice
GROUP S.A

Asunción,30 de Noviembre de 2.023

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal de San Ignacio Guazú – Misiones
Presente.

Tengo el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de solicitar el pago de la segunda certificación correspondiente a la obra **"L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586"**, Distrito de San Ignacio Guazú, Departamento de Misiones.

Por haber alcanzado el avance de **8,8** % de avance en obra. Se adjunta los siguientes documentos.

- Factura N° 001-001-0000039
- Certificado de cumplimiento tributario
- Constancia de cumplimiento con la seguridad social

Sin otro particular y aguardando una respuesta favorable, me despido de usted con el respeto que se merece.

Luis Miguel Martínez Villar
Presidente
Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

ecoservice
GROUP S.A

Asunción, 30 de Noviembre 2.023

CARTA PODER

SEÑORES
LIC CRISTINA AYALA BLANCO
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO – MISIONES
PRESENTE

Yo, **LUIS MIGUEL MARTINEZ VILLAR** con C.I N° **3.184.790** como representante legal de la empresa **ECOSERVICE GROUP S.A.**, en uso de mis facultades y en representación de la firma mencionada otorgo PODER a **CINTHIA PAOLA MONTIEL DE ALVARENGA con C.I N° 4.812.652**, a tramitar documentaciones, pagos y cobros a favor de la empresa en el marco de los trabajos, **Contratos N° 15/2023 – Licitación Pública Nacional N° ID 428.586.**

Se otorga la presente para lo que hubiere lugar en Asunción a los del mes de Noviembre días del mes del año en curso.

Luis Miguel Martínez Villar
Presidente
Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

Lourdes Duarte
Notaría Pública
Reg. Nº 509
Dr. López Moreira 4607 esq. Mons. Bogarín
Tel.: 612 491
esclourdes@escribanialourdesduarte.com
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

Lote 5668174629 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270165130208

FECHA 08/11/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80058998	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	ECOSERVICE GROUP S.A

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/12/2023

NÚMERO DE CONTROL : 8164080A

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271800589988164080A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3184790

NRO. CERTIFICADO: 411810

FECHA EMISION: 28-11-2023

VENCIMIENTO: 14-12-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80058998

Nro. Certificado: 411810

Razon Social: ECOSERVICE GROUP S.A.

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA N.C.P.
LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 22-04-2015

Cantidad de Asegurados: 58

Nro. Patronal(es): 0251-61-0616 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio: http://servicios.ips.gov.py/constancia/

ecoservice
GROUP S.A

San Ignacio Guazú, 25 de Noviembre del 2.023.

Arq. Diego Valdez
Fiscalización
Municipalidad de San Ignacio Guazú

Presente
Ref.: Certificado N° 2

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS LPN° 01/2023 ID N°: 428.586
Municipio: San Ignacio Guazú

Carpeta Técnica

Me dirijo a Usted, con el fin de presentar el pedido de fiscalización y certificación correspondiente a la obra CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS que se halla situada en la localidad de **San Ignacio Guazú** por haber alcanzado el avance de **8.8%** de avance en obra. Se adjunta los siguientes documentos.

- Acta de medición
- Cronograma físico-financiero
- Planilla de certificación
- Resumen general

Atentamente

Luis Miguel Martínez Villar
Presidente
Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

Obra: Items del llamado L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA -
Planilla de Certificado N° 2
Periodo: Setiembre 2023 - Junio 2024

	Fecha de presentación	25/11/2023
	Fecha de Inicio	25/9/2023
	Plazo Inicial	250
	Dias de Lluvia	
Plazo Inicial + Prorroga		
	Dias trascurridos	60
	Dias de retrazo	

RESUMEN GENERAL

	Descripción	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE (%)			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586	1.573.769.730	9,3%	8,8%	18,1%	146.330.308	138.491.736	284.822.044
B	DEDUCCION DE FECHAS							
B.1	MULTAS (0,05% POR DIA)	786.885	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
B.2	DESCUENTO DE ANTICIPO (3%)	-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
B.3	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO 5%)	78.688.487	9,3%	8,8%	18,1%	7.316.515	6.924.587	14.241.102
C	MONTO NETO A PAGAR (A-B)					139.013.792	131.567.149	270.580.941

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y UN MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CIENTO CUARENTA Y NUEVE.----------

Sr. Luis Miguel Martínez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES
ACTA DE MEDICIÓN
Ítems del llamado L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA

Planilla de certificado N° 2 — Periodo: Setiembre 2023 - Junio 2024

En el lugar de obra, Distrito de San Ignacio Guazu, Departamento de Misiones, a los 25 días del mes de octubre del año 2023, se reunen la empresa Contratista "Ecoservice Group SA" representada por el Sr. Luis Miguel Martínez Villar, y la Fiscalización representada por el Arq. Diego Valdez, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes.

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	838,54	838,54	0,00	838,54
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	480		160,00	160,00
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1,00	0,00	1,00
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global				
4.1	Vallado de Obra	Metro lineal	150	150,00	0,00	150,00
4.2	Obrador	Metros cuadrados	16	16,00	0,00	16,00
4.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1			0,00
5	Construccion de losa	Unidad Medida Global	1			
5.1	Tubulones con Hº ciclopeo	Metros cuadrados	12,8	12,80	0,00	12,80
5.2	Cabezales	Metros cúbicos	29	12,00	17,00	29,00
5.3	Viga de fundación	Metros cúbicos	39	18,00	21,00	39,00
5.4	Columnas	Metros cúbicos	18	0,50	5,00	5,50
5.5	Vigas	Metros cúbicos	51,3			0,00
5.6	Losa	Metros cúbicos	94,8			0,00
5.7	Escalera de Hº Aº	Unidad	1			0,00
6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1			
6.1	Nivelación de 0,30cm.	Metros cuadrados	270	50,00	100,00	150,00
6.2	Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	96			0,00
6.3	Elevación de 0,20 para revocar	Metros cuadrados	635			0,00
6.4	Envarillado sobre abertura	Metro lineal	30			0,00
7	Aislación Asfaltica	Metro lineal	228			0,00
8	Revoques	Unidad Medida Global	1			
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	1.662			0,00
9	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1			
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes 10cms.	Metros cuadrados	838,54			0,00
9.2	Piso	Metros cuadrados	838,54			0,00
10	Zocalo	Metro lineal	365			0,00
11	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1			
11.1	Con Porcelanato	Metros cuadrados	160			0,00
11.2	de Piedra	Metros cuadrados	70			0,00
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1			
12.1	Agua corriente-Des CI - Camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1			0,00
12.2	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1			0,00
13	Mesada de mamposteria con revestimiento	Metro lineal	14,4			0,00
14	Construcción de Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1			0,00
15	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1			
15.1	Tablero TP de 36 AG	Unidad	2			0,00
15.2	Alimentación de los circuitos	Unidad	243			0,00
15.3	Alimentación 4x1 de 10mm NYY al tablero	Metro lineal	50			0,00
15.4	Artefactos flourescentes de 1x40w	Unidad	11			0,00
15.5	Panel led de adosar de 24w	Unidad	119			0,00
15.6	Lampara	Unidad	5			0,00
15.7	Luminaria 60w	Unidad	8			0,00
15.8	Registro Eléctrico	Unidad	4			0,00
16	Aberturas	Unidad Medida Global	1			
16.1	Puerta Metalica de 1,50x2,10 (provisión y colocación) carpinteria metalica	Unidad	1			0,00
16.2	Puerta placa con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria de madera	Unidad	11			0,00
16.3	Puerta placa con marco y herraje de 1,50 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria madera	Unidad	4			0,00
17	Servicio de Colocacion/desmontaje de baranda de seguridad	Metro lineal	86			0,00
18	Vidrios	Metros cuadrados	83,4			0,00
19	Mamparas	Unidad Medida Global	1			
19.1	De eucatex divisorias (eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios)	Metros cuadrados	118			0,00
20	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0,00
20.1	De Paredes revocadas	Metros cuadrados	1.662			0,00
20.2	De cielorraso al látex	Metros cuadrados	670			0,00
20.3	De revestido de piedra con antimoho incoloro	Metros cuadrados	70			0,00
21	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad Medida Global	1			
21.2	Iluminación autonoma de emergencia tipo led	Unidad	4			0,00
21.3	Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	Unidad	3			0,00
21.4	Detector de humo-calor	Unidad	26			0,00
21.5	Detector termovelocimetrico	Unidad	2			0,00
21.6	Pulsador manual de alarma	Unidad	1			0,00
21.7	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	Unidad	1			0,00
21.8	Cables cajas y accesorios menores	Unidad	1			0,00
22	Limpieza de obra	Metros cuadrados	838,54			0,00

Sr. Luis Miguel Martínez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES
Obra: Items del llamado L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586

Planilla de Certificado N° 2
Periodo: Setiembre 2023 - Junio 2024

Fecha de presentación	25/11/2023
Fecha de inicio	25/9/2023
Plazo inicial	250
Dias de Lluvia	
Plazo Inicial + Prorroga	
Dias trascurridos	60
Dias de retraso	

		CONTRACTUAL				AVANCE (%)			MONTO BRUTO		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	838,54	7.586	6.361.164	100,00%	0,00%	0,00%	6.361.164	0	6.361.164
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	480	74.797	35.902.560	0,00%	33,33%	33,33%		11.967.520	11.967.520
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.064.727	1.064.727	100,00%	100,00%	0,00%	1.064.727	0	1.064.727
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global			-					0	
4.1	Vallado de Obra	Metro lineal	150	164.900	24.735.000	100,00%	100,00%	0,00%	24.735.000	0	24.735.000
4.2	Obrador	Metros cuadrados	16	240.761	3.852.176	100,00%	100,00%	0,00%	3.852.176	0	3.852.176
4.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.517.236	1.517.236	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
5	Construccion de losa	Unidad Medida Global	1		-						
5.1	Tubulones con Hº ciclopeo	Metros cuadrados	12,8	1.899.207	24.309.850	100,00%	100,00%	0,00%	24.309.850	0	24.309.850
5.2	Cabezales	Metros cúbicos	29	2.480.815	71.943.635	100,00%	100,00%	58,62%	29.769.780	42.173.855	71.943.635
5.3	Viga de fundación	Metros cúbicos	39	2.539.774	99.051.186	46,15%	100,00%	53,85%	45.715.932	53.335.254	99.051.186
5.4	Columnas	Metros cúbicos	18	2.530.457	45.548.226	2,78%	30,56%	27,78%	1.265.229	12.652.285	13.917.514
5.5	Vigas	Metros cúbicos	51,3	2.487.602	127.613.983	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
5.6	Losa	Metros cúbicos	94,8	2.633.071	249.615.131	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
5.7	Escalera de Hº Aº	Unidad	1	5.860.224	5.860.224	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-						
6.1	Nivelación de 0,30cm.	Metros cuadrados	270	185.129	49.984.830	18,52%	55,56%	37,04%	9.256.450	18.512.900	27.769.350
6.2	Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	96	99.685	9.569.760	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
6.3	Elevación de 0,20 para revocar	Metros cuadrados	635	144.803	91.949.905	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
6.4	Envarillado sobre abertura	Metro lineal	30	23.291	698.730	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
7	Aislación Asfaltica	Metro lineal	228	46.049	10.499.172	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
8	Revoques	Unidad Medida Global	1		-				0	0	0
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	1.662	37.532	62.378.184	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
9	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-						
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes 10cms.	Metros cuadrados	838,54	38.064	31.918.187	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
9.2	Piso	Metros cuadrados	838,54	155.317	130.239.517	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
10	Zocalo	Metro lineal	365	39.528	14.427.720	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
11	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-				0	0	0
11.1	Con Porcelanato	Metros cuadrados	160	200.302	32.048.320	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
11.2	de Piedra	Metros cuadrados	70	189.788	13.285.160	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1		-				0	0	0
12.1	Agua corriente-Des Cl - Camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	24.967.855	24.967.855	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
12.2	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	6.151.063	6.151.063	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
13	Mesada de mamposteria con revestimiento	Metro lineal	14,4	1.052.749	15.159.586	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
14	Construcción de Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	10.815.233	10.815.233	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		-						
15.1	Tablero TP de 36 AG	Unidad	2	1.770.109	3.540.218	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.2	Alimentación de los circuitos	Unidad	243	110.465	26.842.995	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.3	Alimentación 4x1 de 10mm NYY al tablero	Metro lineal	50	37.265	1.863.250	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.4	Artefactos flourescentes de 1x40w	Unidad	11	127.767	1.405.437	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.5	Panel led de adosar de 24w	Unidad	119	101.815	12.115.985	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.6	Lampara	Unidad	5	314.095	1.570.475	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.7	Luminaria 60w	Unidad	8	60.556	484.448	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.8	Registro Eléctrico	Unidad	4	176.212	704.848	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
16	Aberturas	Unidad Medida Global	1		-						
16.1	Puerta Metalica de 1,50x2,10 (provisión y colocación) carpinteria metalica	Unidad	1	1.646.335	1.646.335	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
16.2	Puerta placa con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria de madera	Unidad	11	1.300.298	14.303.278	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
16.3	Puerta placa con marco y herraje de 1,50 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria madera	Unidad	4	2.255.891	9.023.564	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
17	Servicio de Colocacion/desmontaje de baranda de seguridad	Metro lineal	86	632.847	54.424.842	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
18	Vidrios	Metros cuadrados	83,4	955.593	79.696.456	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
19	Mamparas	Unidad Medida Global	1		-						
19.1	De eucatex divisorias (eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios)	Metros cuadrados	118	343.375	40.518.250	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
20	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	0,00%	0,00%		0	0	0
20.1	De Paredes revocadas	Metros cuadrados	1.662	34.471	57.290.802	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
20.2	De cielorraso al látex	Metros cuadrados	670	42.190	28.267.300	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
20.3	De revestido de piedra con antimoho incoloro	Metros cuadrados	70	21.028	1.471.960	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad Medida Global	1		-		0,00%				
21.2	Iluminación autonoma de emergencia tipo led	Unidad	4	439.200	1.756.800	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.3	Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	Unidad	3	501.753	1.505.259	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.4	Detector de humo-calor	Unidad	26	520.385	13.530.010	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.5	Detector termovelocimetrico	Unidad	2	479.127	958.254	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.6	Pulsador manual de alarma	Unidad	1	604.233	604.233	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.7	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	Unidad	1	724.015	724.015	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.8	Cables cajas y accesorios menores	Unidad	1	13.253.433	13.253.433	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
22	Limpieza de obra	Metros cuadrados	838,54	5.723	4.798.964	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
				Precio Total	1.373.769.730	9,3%	8,8%	18,1%	146.330.308	138.491.736	284.972.122

Sr. Luis Miguel Martinez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS LPN° 01/2023 ID N°: 428.586

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA
FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ

RESUMEN

	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
CONTRACTUAL										
Monto bruto mensual	-	193.586.856	169.166.499	262.920.720	221.458.977	72.575.695	230.211.306	231.585.753	188.347.206	3.916.718
Porcentaje Avance Mensual	-	12,30	10,75	16,71	14,07	4,61	14,63	14,72	11,97	0,25
Monto bruto acumulado mensual	-	193.586.856	362.753.354	625.674.074	847.133.051	919.708.747	1.149.920.053	1.381.505.806	1.569.853.012	1.573.769.730
Porcentaje Avance acumulado mensual	-	12,30	23,05	39,76	53,83	58,44	73,07	87,78	99,75	100,00
CERTIFICADO										
Monto bruto mensual	-	146.330.308	138.641.814							
Porcentaje Avance Mensual	-	9,30	8,81							
Monto bruto acumulado mensual	-	146.330.308	284.972.122							
Porcentaje Avance acumulado mensual	-	9,30	18,11							
Porcentaje avance acumulado mensual contractual	-	12,30	23,05							
Porcentaje Avance Mensual	-	9,30	18,11							

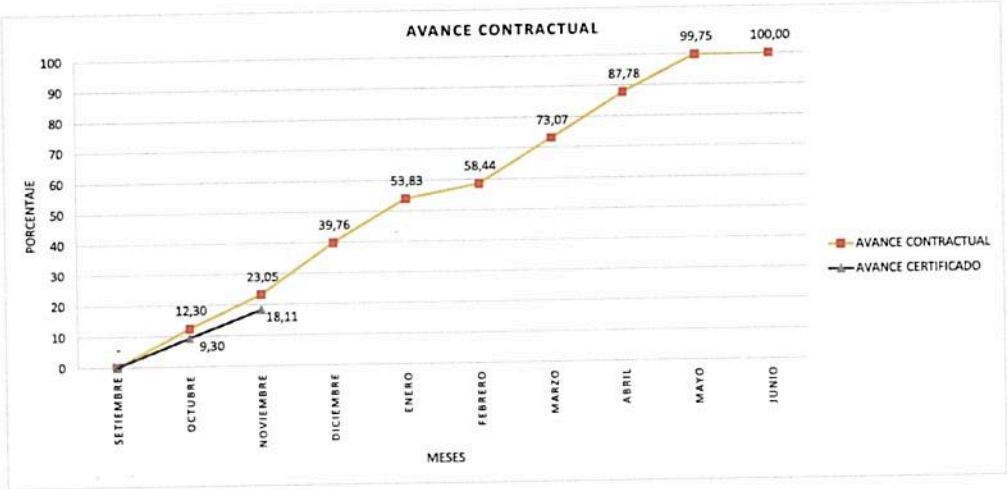

Sr. Luis Miguel Martinez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra
