Informe Técnico de Fiscalización N°41/2023

A: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Fiscal de obras-

Ref.: **PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA – TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE". Adjudicado según contrato N°55/2023.**

Fecha: 05/10/2023.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras correspondiente al **CONTRATO DE OBRA N° 55/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN A CONTRATACION DIRECTA N°66/2023 – PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA – TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 433488,** adjudicada a la firma **C.O.G. Emprendimientos S.A.**, a fin de informar los avances de los trabajos realizados hasta la fecha en el marco del contrato detallado anteriormente, y el estado de los mismos en relación al cronograma de ejecución presentado por la empresa contratista. Se aprovecha la ocasión para informar un total del 100% de avance ejecución contractual.

Dicho esto, se cumple en informar que los trabajos ya ejecutados por parte de la empresa contratista los cuales forman parte de los rubros contractuales. Se han cumplido en cabalidad todo lo plasmado contractualmente en cuanto a la construcción de empedrado, enripiado y colocación de cordones de hormigón.

En cuanto a los cordones de hormigón que son para acceso a los domicilios ha sido deducido para los pagos visto que el proyecto no contempla en costos un monto plasmado.

El avance ha sido en tiempo y forma y con normalidad.

Para el efecto se presenta los siguientes documentos respaltarios.

PROCESADO

- **Acta de Medición.**
- **Tomas Fotográficas.**
- **Planos de medición.**

Observaciones.: *Esta Fiscalización cumple en informar que se realiza el certificado con un avance de Obra ejecutada en campo del 100% correspondiente y se procede a abonar por lo ejecutado descontando cualquier tipo de inconsistencia y se procede remitir los documentos pertinentes..*

Es mi informe

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PLANO DE MEDICION

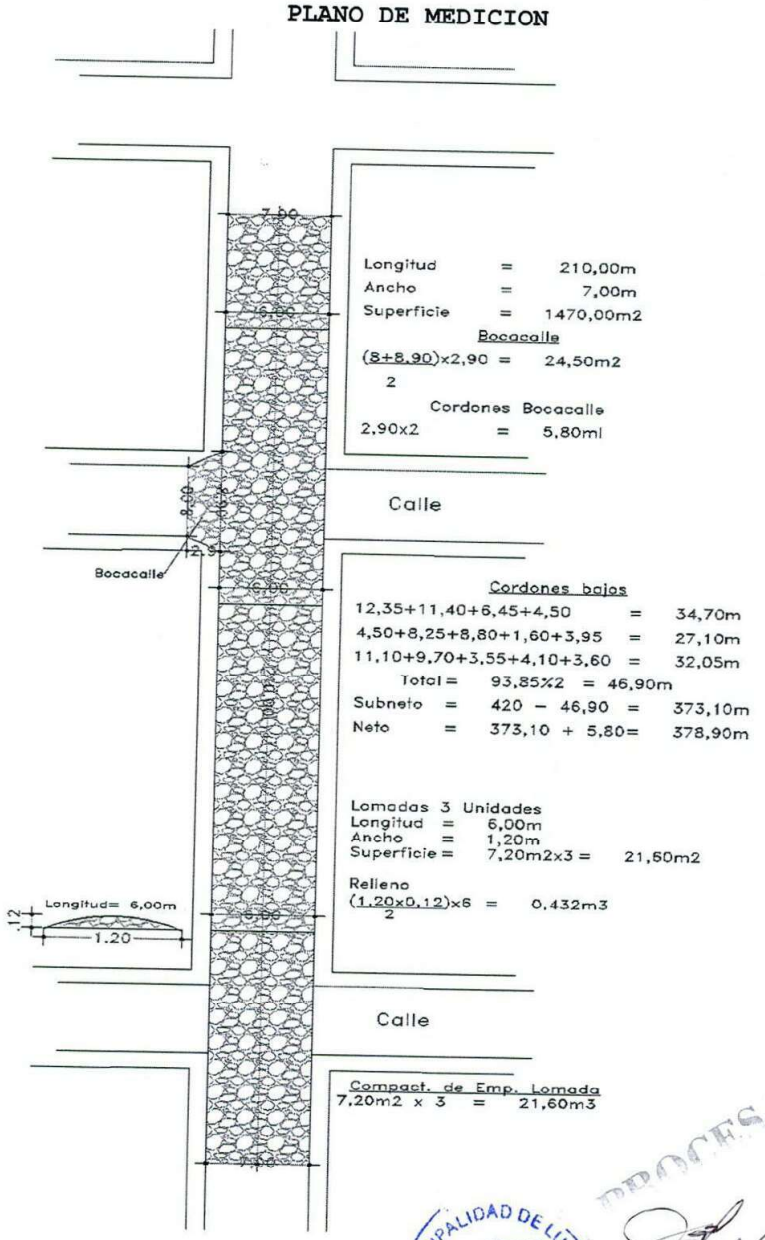

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Cinco días del mes de Octubre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Lic. Cesar Ortiz en representación de la firma C.O.G. Emprendimientos S.A., a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **"Obras: "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA – TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE."** Adjudicataria según **Contrato N°55/2023.** Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 04 de Octubre del 2023 correspondiente al Certificado de Obra N° 1 en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

Empedrado
Area 1

Longitud	=	210,00m
Ancho	=	7,00m
Superficie	**=**	**1470,00m2**

Bocacalle

$(\frac{8,00+8,90}{2})$x2,90	=	**24,50m2**

Lomadas 3 Unidades

Longitud	=	6,00m
Ancho	=	1,20m
Superficie	**=**	**7,20m2x3 = 21,60m2**

Relleno

$(\frac{1,20+0,12}{2})$x6,00	=	**0,432m2**

Compact. De Emp. Lomada

7,20m2x3,00	=	**21,60m3**

Cordones Bajos

12,35+11,40+6,45+4,50	=	34,70m
4,50+8,25+8,80+1,60+3,95	=	27,10m
11,10+9,70+3,55+4,10+3,60	=	32,05m
Total = 46,90m	=	93,85m
Subneto = 420 - 46,90	=	**373,10**
Neto = 373,10 + 5,80	=	**378,90**

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1
Contratista.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Fiscalización de Obras.
Municipalidad de Luque

PROCESADO

TOMAS FOTOGRAFICAS

Ingº Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
