GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094	100%	175.758.179	0,00%	0	20,69%	36.355.787	20,69%	36.355.787
A	**Total por Contrato**	**100%**	**175.758.179**	**0,00%**	**0**	**20,69%**	**36.355.787**	**20,69%**	**36.355.787**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	35.151.636	0	7.271.157	7.271.157
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**35.151.636**	**0**	**7.271.157**	**7.271.157**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				29.084.630	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**29.084.630**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**90/23**
Monto Básico:	**175.758.179**
Contratista:	**ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 dias**
Fecha de terminación prevista:	**16-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Veintinueve millones ochenta y cuatro mil seiscientos treinta.

INGENIERIA
RUC: 50503374

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

0000002

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	175.758.179	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	90/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	Metro lineal	360,00	7.614	2.741.040	0,016	0,00%	55,56%	55,56%	-	0,009	0,009	0,00	200,00	200,00	0	1.522.800	1.522.800
2	Cartel metálico con soporte.	Unidad	1,00	1.176.244	1.176.244	0,007	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,007	0,007	0,00	1,00	1,00	0	1.176.244	1.176.244
3	Servicio de señalizacion de caminos - Carteles de señalización	Unidad	2,00	5.404.062	10.808.124	0,061	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,061	0,061	0,00	2,00	2,00	0	10.808.124	10.808.124
4	Preparación de obra - Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja. Terraplén.	Metros cúbicos	756,00	22.959	17.357.004	0,099	0,00%	37,96%	37,96%	-	0,037	0,037	0,00	287,00	287,00	0	6.589.233	6.589.233
5	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	504	38.273	19.289.592	0,110	0,00%	56,77%	56,77%	-	0,062	0,062	0,00	286,11	286,11	0	10.950.099	10.950.099
6	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2434,00	38.811	94.465.974	0,537	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Colocación de hormigón armado - CORDON ESCONDIDO DE H°. SEGÚN DETALLE.	Metros cúbicos	21,00	965.325	20.271.825	0,115	0,00%	26,19%	26,19%	-	0,030	0,030	0,00	5,50	5,50	0	5.309.288	5.309.288
8	Relleno y compactación de terreno - Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cuadrados	2434,00	2.646	6.440.364	0,037	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2434,00	1.318	3.208.012	0,018	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					**175.758.179**	**100%**				**0,00%**	**20,69%**	**20,69%**				**0**	**36.355.787**	**36.355.787**

INGENIERO
RUC: 3030337-0

ING. DIEGO MJARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapua

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094

Contrato N°: 90/23			
Monto del Contrato:	175.758.179	**Fecha de terminación prevista:**	16-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	9.321.346	9.321.346	10.000.000	10.000.000	5,30%	5,30%	5,69%	5,69%
Enero	18.133.804	27.455.150	26.355.787	36.355.787	10,32%	15,62%	15,00%	20,69%
Febrero	83.690.520	111.145.670			47,62%	63,24%		
Marzo	64.612.509	175.758.179			36,76%	100,00%		

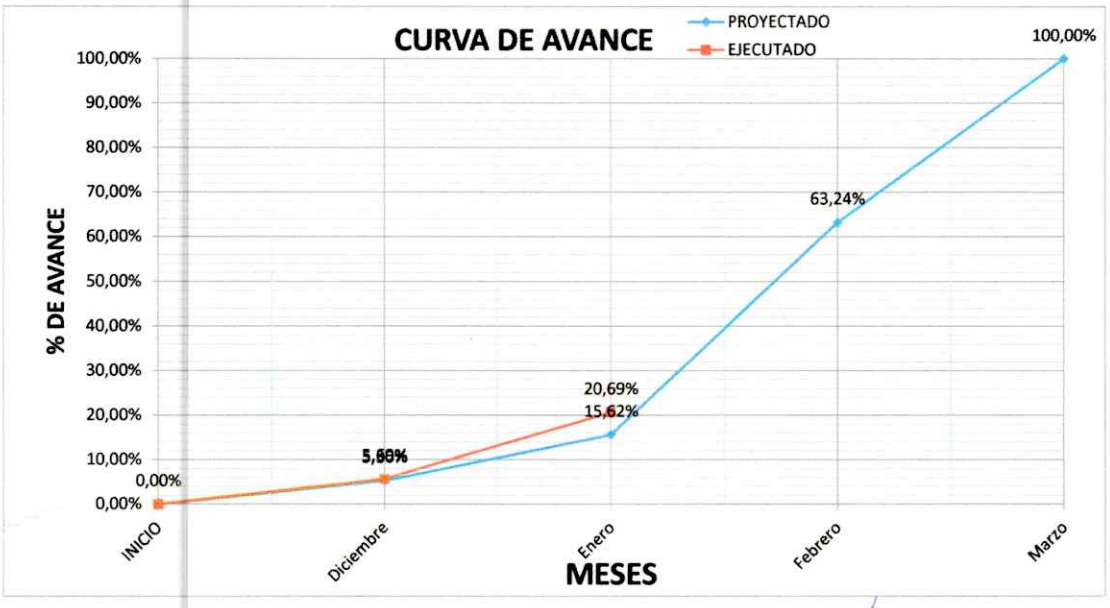

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oviedo
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	175.758.179	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	90/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	Metro lineal	360,00	7.614	2.741.040	2.741.040				1,56%
2	Cartel metálico con soporte.	Unidad	1,00	1.176.244	1.176.244	1.176.244				0,67%
3	Servicio de señalizacion de caminos - Carteles de señalización de desvío.	Unidad	2,00	5.404.062	10.808.124	5.404.062	5.404.062			6,15%
4	Preparación de obra - Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja. Terraplén.	Metros cúbicos	756,00	22.959	17.357.004		3.593.154	13.763.850		9,88%
5	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	504	38.273	19.289.592		3.827.300	7.731.146	7.731.146	10,98%
6	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2434,00	38.811	94.465.974			47.232.987	47.232.987	53,75%
7	Colocación de hormigón armado - CORDON ESCONDIDO DE H°. SEGÚN DETALLE.	Metros cúbicos	21,00	965.325	20.271.825		5.309.288	14.962.537		11,53%
8	Relleno y compactación de terreno - Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cuadrados	2434,00	2.646	6.440.364				6.440.364	3,66%
9	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2434,00	1.318	3.208.012				3.208.012	1,83%
Total					**175.758.179**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						9.321.346	18.133.804	83.690.520	64.612.509	**175.758.179**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						5,30%	10,32%	47,62%	36,76%	**100%**

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

Secretario de Oras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME DE CERTIFICADO Nº01 – MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

SOLICITANTE / BENEFICIARIO: Itapúa Poty
OBRA: Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado

UBICACIÓN: Acceso principal cruce lorito	**DISTRITO:** Itapúa Poty	**COORDENADAS UTM:** 646533 - 7059723	**MONTO DE LA OBRA:** 175.758.179 gs.
EMPRESA CONTRATISTA: DJ Ingeniería – Ing. Diego Jara Estigarribia	**Nº DE TELÉFONO:** 0983-578-600 – Ing. Diego Jara	**Nº CONTRATO / ID:** 90/2023 / 437.094	**FECHA DE INICIO:** 18/12/23
MODALIDAD / LOTE: LCD Nº 46/2023 / Lote: unico	**PLAZO CONTRACTUAL:** 90 DÍAS CALENDARIO	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 17/03/24	**PRÓRROGA:** - **TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:** -

FECHA DE VISITA: 30 de enero 2024
AVANCE DE OBRA: 20,69%

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra con buen avance, dentro del plazo de ejecución cumpliendo con el avance previsto por encima de la curva proyectada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
