Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 24 de Marzo del 2023

Señor
Director General de Administración y Finanzas
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Lic. Carlos Morel

Presente

Ref: Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 – Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas", ID N° 415.978 – Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en Territorios con Mayor Índice de Pobreza a Nivel Nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".-

Me dirijo a usted con el objeto solicitar el Pago del Certificado de Obra N° 04 correspondiente al Lote Nro 2 - Iturbe del Contrato de Referencia, cuyo monto asciende a Gs. 103.829.836 Guaraníes Ciento tres millones ochocientos veinte y nueve mil ochocientos treinta y seis.-

Además presentamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0001266.
- Certificados de Obra y Acta de Medición en 3 Originales.-
- Certificado de Cumpliendo Tributario
- Reportes FIP y FIS
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social

Ing. Mario R. Ibarrola A.
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 577 Fecha: 24/03/23 Hora: 14:34
Asunto:
Recibido por: Lucía Ríos

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA N° 52
Proceso: Fecha: 24-03-2023
Entregado por: Lidia Bareiro
Hora: 14:40 Recibido por: Decia Ovelar

Mario Raúl Ibarrola Adorno

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Adela Speratti c/ República Francesa N° 1689
Depto. Planta Baja - Tel.: (021) 222 552
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16016326
RUC: 430285 - 0
Inicio de Vigencia: 11 de Noviembre de 2022
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2023

FACTURA

No. 001-001 0001266

Fecha de Emisión: 24/03/2023 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Secretaria Nacional de Cultura

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°.: 80050610-3 Nota de Remisión N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Pago Certificado Nº 04, Contrato Nº 01/2022 - Licitación pública - Concurso de Ofertas Nº 01/2022 Lote Nº 2 Iturbe				103.829.836
	TOTAL				103829.836

TOTAL A PAGAR: Ciento Tres millones Ochocientos Veinte y Nueve mil ochocientos Treinta y Seis — 103829.836

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) — (10 %) 9.439.076 TOTAL DE IVA: 9.439.076

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.366
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-001 - 1.251 al 1.350 - Nov. / 22.

ORIGINAL: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04 **Periodo: FEBRERO/MARZO 2023**

FECHA: 14 DE MARZO DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIOS MODIFICATORIOS N° 01 y N° 02				EJECUTADO						Porcentaje %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72102508-001	PISO	Unidad	1		**20.856.625**				**17.649.420**	**3.207.205**	**20.856.625**	**100,00%**
1.1		Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	17.768	3.284.415	129,40	55,45	184,85	2.299.179	985.236	3.284.415	100,00%
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	21.615	1.080.750	50,00	0,00	50,00	1.080.750	0	1.080.750	100,00%
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	52.837	422.696	50,00	-42,00	8,00	2.641.850	-2.219.154	422.696	100,00%
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	43.507	2.175.350	50,00	0,00	50,00	2.175.350	0	2.175.350	100,00%
1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	73.294	3.664.700	50,00	0,00	50,00	3.664.700	0	3.664.700	100,00%
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas.	Metros cuadrados	185	16.185	2.994.225	0,00	185,00	185,00	0	2.994.225	2.994.225	100,00%
1.7		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	30,8	45.601	1.404.511	24,64	6,16	30,80	1.123.609	280.902	1.404.511	100,00%
1.8		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.	Metros cuadrados	30,8	189.285	5.829.978	24,64	6,16	30,80	4.663.982	1.165.996	5.829.978	100,00%
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1		**17.909.527**				**13.337.326**	**4.572.201**	**17.909.527**	**100,00%**
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	85.181	12.521.607	124,95	22,05	147,00	10.643.366	1.878.241	12.521.607	100,00%
2.2		Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad	Metros lineales	0	40.816	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	86.021	1.720.420	10,00	10,00	20,00	860.210	860.210	1.720.420	100,00%

g. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras

Item	Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
2.4		Arreglo de fisuras en muros	Metros lineales	45	81.500	3.667.500	22,50	22,50	45,00	1.833.750	1.833.750	3.667.500	100,00%
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1		**224.244.096**				**199.614.052**	**24.630.044**	**224.244.096**	**100,00%**
3.1		Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	280	11.329	3.172.120	240,00	40,00	280,00	2.718.960	453.160	3.172.120	100,00%
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	280	39.041	10.931.480	240,00	40,00	280,00	9.369.840	1.561.640	10.931.480	100,00%
3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	122	15.483	1.888.926	148,00	-26,00	122,00	2.291.484	-402.558	1.888.926	100,00%
3.4		Provisión y Colocacion de chapas en los aleros	Metros cuadrados	122	179.589	21.909.858	122,00	0,00	122,00	21.909.858	0	21.909.858	100,00%
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	1.703.611	3.407.222	2,00	0,00	2,00	3.407.222	0	3.407.222	100,00%
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	1.169.484	2.338.968	2,00	0,00	2,00	2.338.968	0	2.338.968	100,00%
3.7		Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	0	715.490	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.8		Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	116	162.876	18.893.616	116,00	0,00	116,00	18.893.616	0	18.893.616	100,00%
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	16.743	8.371.500	500,00	0,00	500,00	8.371.500	0	8.371.500	100,00%
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion	Metros cuadrados	190	39.426	7.490.940	180,00	10,00	190,00	7.096.680	394.260	7.490.940	100,00%
3.11		Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	90	148.845	13.396.050	60,00	30,00	90,00	8.930.700	4.465.350	13.396.050	100,00%
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	208	32.015	6.659.120	192,00	16,00	208,00	6.146.880	512.240	6.659.120	100,00%
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	72	31.233	2.248.776	48,00	24,00	72,00	1.499.184	749.592	2.248.776	100,00%
3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	280	129.486	36.256.080	240,00	40,00	280,00	31.076.640	5.179.440	36.256.080	100,00%
3.15		Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	280	101.298	28.363.440	240,00	40,00	280,00	24.311.520	4.051.920	28.363.440	100,00%
3.16		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m	Unidad	2	7.113.000	14.226.000	2,00	0,00	2,00	14.226.000	0	14.226.000	100,00%
3.17		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m	Unidad	2	4.620.000	9.240.000	1,00	1,00	2,00	4.620.000	4.620.000	9.240.000	100,00%
3.18		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m	Unidad	11	3.045.000	33.495.000	10,00	1,00	11,00	30.450.000	3.045.000	33.495.000	100,00%
3.19		Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m	Unidad	1	1.955.000	1.955.000	1,00	0,00	1,00	1.955.000	0	1.955.000	100,00%
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1		**22.328.496**				**6.367.320**	**15.961.176**	**22.328.496**	**100,00%**

Ing. Mario Rojabarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Item	Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	0	123.487	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	159.183	9.550.980	25,00	35,00	60,00	3.979.575	5.571.405	9.550.980	100,00%
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	159.183	4.775.490	15,00	15,00	30,00	2.387.745	2.387.745	4.775.490	100,00%
4.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	22	159.183	3.502.026	0,00	22,00	22,00	0	3.502.026	3.502.026	100,00%
4.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED	Unidad	0	269.438	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.6		Provision y Colocación de Luminaria tipo reflector Led 30 W	Unidad	18	250.000	4.500.000	0,00	18,00	18,00	0	4.500.000	4.500.000	0,00%
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1		**18.782.486**				**0**	**18.782.486**	**18.782.486**	**100,00%**
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	156.899	17.886.486	0,00	114,00	114,00	0	17.886.486	17.886.486	100,00%
5.2		Reposición de vidrios sensillos en ventanas cuadrillé	Metros cuadrados	3,5	256.000	896.000	0,00	3,50	3,50	0	896.000	896.000	100,00%
6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1		**49.636.437**				**8.514.655**	**41.121.782**	**49.636.437**	**100,00%**
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	38.279	13.589.045	0,00	355,00	355,00	0	13.589.045	13.589.045	100,00%
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	38.279	8.038.590	0,00	210,00	210,00	0	8.038.590	8.038.590	100,00%
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	280	43.846	12.276.880	144,00	136,00	280,00	6.313.824	5.963.056	12.276.880	100,00%
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir	Metros cuadrados	122	30.066	3.668.052	73,20	48,80	122,00	2.200.831	1.467.221	3.668.052	100,00%
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	44.681	10.187.268	0,00	228,00	228,00	0	10.187.268	10.187.268	100,00%
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	44.681	1.876.602	0,00	42,00	42,00	0	1.876.602	1.876.602	100,00%
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	40.378.702	**40.378.702**	0,80	0,20	1,00	**32.302.962**	**8.075.740**	**40.378.702**	**100,00%**
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	2.527.975	**2.527.975**	1,00	0,00	1,00	**2.527.975**	**0**	**2.527.975**	**100,00%**
				Precio Total		**396.664.344**			**Total Certificado**	**280.313.710**	**116.350.634**	**396.664.344**	**100,00%**
				Anticipo		**68.583.540**			**Descuento Anticipo 20%**	**56.062.742**	**12.520.798**	**68.583.540**	**100,00%**
									Saldo a Cobrar	**224.250.968**	**103.829.836**	**328.080.804**	

Son Guaranies: Ciento Tres millones ochocientos veinte y nueve mil ochocientos treinta y seis.-

CONTRATISTA
Ing. Mario Bauhbarola Adorno
Ing. Mario Bauhbarola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

ACTA DE MEDICION Nº 04 **Periodo: FEBRERO/MARZO 2023**

LOTE NRO: 2 - ITURBE

FECHA: 14 DE MARZO DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIOS MODIFICATORIOs N° 01 y N° 02		CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72102508-001	PISO	Unidad	1				
1.1		Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	129,40	55,45	184,85	100,00%
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	50,00	0,00	50,00	100,00%
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	50,00	-42,00	8,00	100,00%
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	50,00	0,00	50,00	100,00%
1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	50,00	0,00	50,00	100,00%
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas.	Metros cuadrados	185	0,00	185,00	185,00	100,00%
1.7		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	30,8	24,64	6,16	30,80	100,00%
1.8		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.	Metros cuadrados	30,8	24,64	6,16	30,80	100,00%
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1				
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	124,95	22,05	147,00	100,00%
2.2		Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad	Metros lineales	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	10,00	10,00	20,00	100,00%
2.4		Arreglo de fisuras en muros	Metros lineales	45	22,50	22,50	45,00	100,00%
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1				
3.1		Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	280	240,00	40,00	280,00	100,00%
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	280	240,00	40,00	280,00	100,00%
3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	122	148,00	-26,00	122,00	100,00%
3.4		Provisión y Colocacion de chapas en los aleros	Metros cuadrados	122	122,00	0,00	122,00	100,00%
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	2,00	0,00	2,00	100,00%
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	2,00	0,00	2,00	100,00%
3.7		Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.8		Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma seccion de los originales.	Metros	116	116,00	0,00	116,00	100,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Carlos C. González Zelada
Arquitecto

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion	Metros cuadrados	190	180,00	10,00	190,00	100,00%
3.11		Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	90	60,00	30,00	90,00	100,00%
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	208	192,00	16,00	208,00	100,00%
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	72	48,00	24,00	72,00	100,00%
3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	280	240,00	40,00	280,00	100,00%
3.15		Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	280	240,00	40,00	280,00	100,00%
3.16		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m	Unidad	2	2,00	0,00	2,00	100,00%
3.17		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m	Unidad	2	1,00	1,00	2,00	100,00%
3.18		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m	Unidad	11	10,00	1,00	11,00	100,00%
3.19		Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m	Unidad	1	1,00	0,00	1,00	100,00%
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1				
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	25,00	35,00	60,00	100,00%
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	15,00	15,00	30,00	100,00%
4.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	22	0,00	22,00	22,00	100,00%
4.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED	Unidad	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6		Provision y Colocación de Luminaria tipo reflector Led 30 W	Unidad	18	0,00	18,00	18,00	100,00%
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1				
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	0,00	114,00	114,00	100,00%
5.2		Reposición de vidrios sensillos en ventanas cuadrillé	Metros cuadrados	3,5	0,00	3,50	3,50	100,00%
6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1				
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	0,00	355,00	355,00	100,00%
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	0,00	210,00	210,00	100,00%
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	280	144,00	136,00	280,00	100,00%
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir	Metros cuadrados	122	73,20	48,80	122,00	100,00%
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	0,00	228,00	228,00	100,00%
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	0,00	42,00	42,00	100,00%
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	0,80	0,20	1,00	100,00%
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	1,00	0,00	1,00	100,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

RESIDENTE DE OBRAS
Carlos C. González Zelada
Arquitecto

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CURVA DE INVERSION - Periodo: FEBRERO/MARZO 2023

MONTO CONTRATO + CONVENIOS MODIFICATORIOS N° 01 y 02 Gs:	396.664.344

		Inicio	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias
PROYECTADO	Porcentaje %	0,00	19,93%	39,47%	73,91%	90,40%	100,00%
	Valores Gs.	0	79.055.204	156.563.417	396.664.345	358.584.567	396.664.344
EJECUTADO	Porcentaje %	0,00	33,70%	45,02%	74,09%	100,00%	
	Valores Gs.	0	127.499.210	170.335.256	280.313.710	396.664.344	

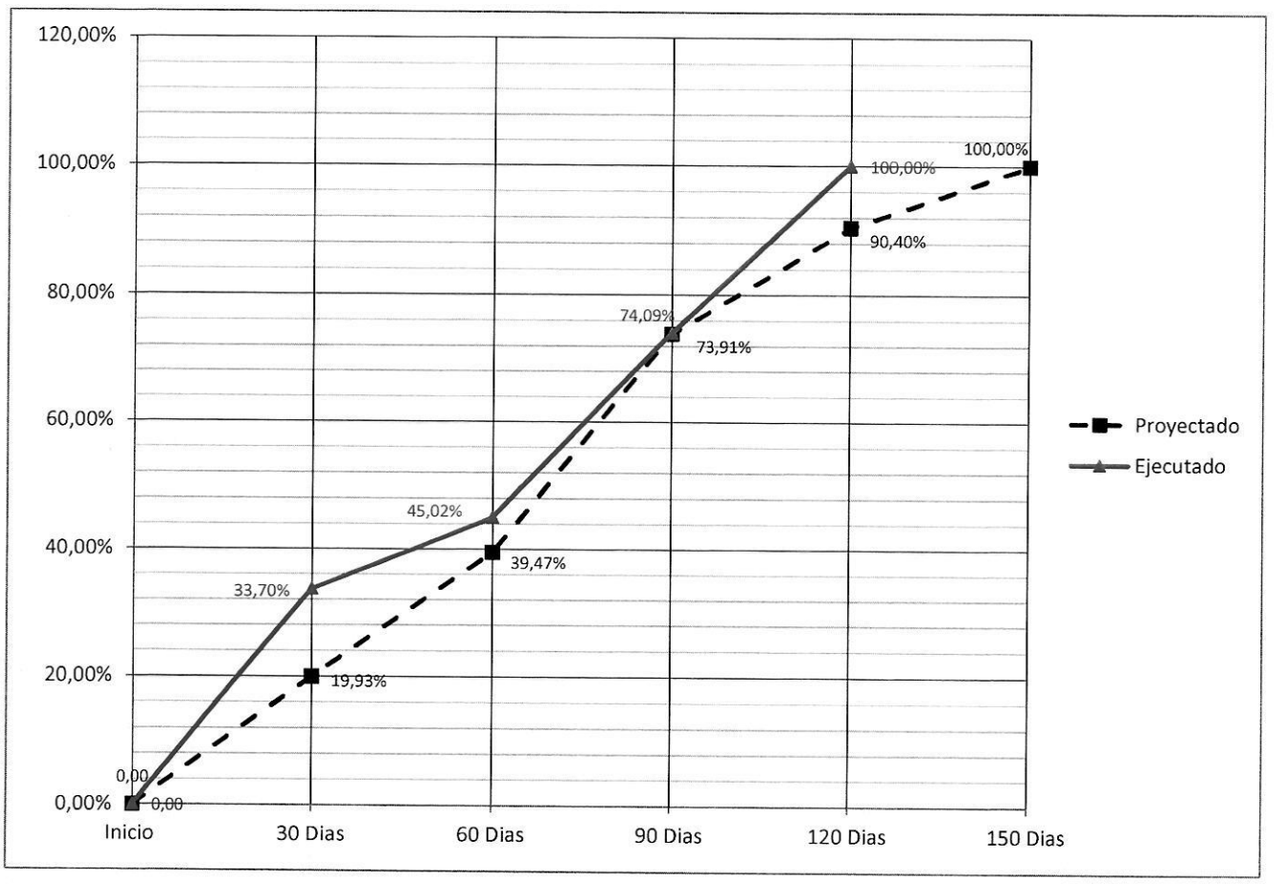

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRA
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Lote 5647336325 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO **4270152026369**

FECHA **24/03/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	430285	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 23/04/2023 NÚMERO DE CONTROL : 9D5D099F

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427143028 59D5D099F

Ing. Mario G. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Busqueda rapida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Gustavo Bernardo Lopez Gonzalez [2300073-430285] - Proveedor

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 415978

Llamado: Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	4492994	Activo	
Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	2300073	Activo	
SIMONA	LOPEZ SILVA	1857999	Activo	
Ruben Antonio	Duarte Martinez	1436444	Activo	
NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	937306	Activo	
CESAR ABRAHAM	CENTURION ENRIQUEZ	5103869	Activo	

Nuevo Formulario de Identificación del Personal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

RUC

430285-0

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 415978 / Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

[redacted].571.154

Año: 2023 **Periodo:** Febrero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
2	Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	Cumplio	3200000	Contratista	Activo
3	SIMONA	LOPEZ SILVA	Cumplio	3200000	Contratista	Activo
4	CESAR ABRAHAM	CENTURION ENRIQUEZ	Cumplio	2125255	Contratista	Activo
5	NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	Cumplio	58853	Contratista	Activo
[redacted]6	Ruben Antonio	Duarte Martinez	Cumplio	4500000	Contratista	Activo

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Usuario Impresión: 2300073-430285

Fecha Impresión: 23/03/2023

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 430285

NRO. CERTIFICADO: 374923

FECHA EMISION: 07-03-2023

VENCIMIENTO: 20-04-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 430285

Nro. Certificado: 374923

Razon Social: IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-1997

Cantidad de Asegurados: 6

Nro. Patronal(es): 0004-40-0356 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
