MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "

LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024

EMPRESA CONTRATISTA: PEREIRA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2024- 03 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	3/12/2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	60
DIAS TRANSCURRIDOS	27
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	4/1/2025

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "	430.217.707	0,00%	75,05%	75,05%	-	322.864.310	322.864.310
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	215.109				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	86.043.541	0,00%	75,05%	75,05%	-	64.572.862	**64.572.862**
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	21.510.885	0,00%	75,05%	75,05%	-	16.143.216	16.143.216
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**107.554.427**	0,00%	75,05%	75,05%	-	**80.716.078**	**80.716.078**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					0	**242.148.233**	**242.148.233**

SON GUARANÍES: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

PEREIRA
CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550-2
San Ignacio - Misiones - Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "
LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2024- 03 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	3/12/2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	60
DIAS TRANSCURRIDOS	27
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	4/1/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	cuadrados	1260	3.579	4.509.540		1.260,00	1.260,00		4.509.540	4.509.540		100,00%	100,00%
2	Desmonte de terreno	cuadrados	1260	2.745	3.458.700		1.260,00	1.260,00		3.458.700	3.458.700		100,00%	100,00%
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.885.000	1.885.000									
4	Preparacion de obra	cuadrados	1260	5.008	6.310.080		1.260,00	1.260,00		6.310.080	6.310.080		100,00%	100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros Cubicos	252	53.800	13.557.600		120,00	120,00		6.456.000	6.456.000		47,62%	47,62%
6	Construccion de cordon cuneta	Metros Cubicos	40	1.347.999	53.919.960		10,00	10,00		13.479.990	13.479.990		25,00%	25,00%
7	Construcción de hormigon armado	cuadrados	1260	251.000	316.260.000		1.150,00	1.150,00		288.650.000	288.650.000		91,27%	91,27%
8	Relleno y Compactación de terreno.	Metros Cubicos	130	45.980	5.977.400									
9	Servicio de señalización de caminos (Señalización Horizontal)	cuadrados	63	60.999	3.842.937									
10	Servicio de señalización de caminos (Señalizacion Vertical)	cuadrados	6,75	1.265.000	8.538.750									
11	Servicio de Colocación de Tachas Reflectivas Bidireccionales	Unidad	100	57.850	5.785.000									
12	Limpieza de obra.	cuadrados	1260	4.899	6.172.740									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**430.217.707**					**322.864.310**	**322.864.310**		**75,05%**	**75,05%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
PEREIRA
CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550-2
San Ignacio - Misiones - Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "

LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024
EMPRESA CONTRATISTA: PEREIRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2024- 03 DE DICIEMBRE DE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 03 días del mes de diciembre del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "PEREIRA CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR el SRA. RAMONA MARINA PEREIRA DE DEL PUERTO, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.260		1260,00	1260,00
2	Desmonte de terreno	Metros cuadrados	1260		1260,00	1260,00
3	Cartel con impresion	Unidad	1		0,00	0,00
4	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1260		1260,00	1260,00
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros Cubicos	252		120,00	120,00
6	Construccion de cordon cuneta	Metros Cubicos	40		10,00	10,00
7	Construcción de hormigon armado	Metros cuadrados	1260		1150,00	1150,00
8	Relleno y Compactación de terreno.	Metros Cubicos	130		0,00	0,00
9	Servicio de señalización de caminos (Señalización Horizontal)	Metros cuadrados	63		0,00	0,00
10	Servicio de señalización de caminos (Señalizacion Vertical)	Metros cuadrados	6,75		0,00	0,00
11	Servicio de Colocación de Tachas Reflectivas Bidireccionales	Unidad	100		0,00	0,00
12	Limpieza de obra.	Metros cuadrados	1260		0,00	0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
PEREIRA
CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550-2
San Ignacio - Misiones - Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "

LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**430.217.707**
TIEMPO DE EJECUCION (DIAS)	**60**

ITEM	DESCRIPCIÓN	nov-24				dic-24				Monto	%
	0	30 dias				60 dias					
1	Replanteo y marcación									4.509.540	1,05
2	Desmonte de terreno									3.458.700	0,80
3	Cartel con impresion									1.885.000	0,44
4	Preparacion de obra									6.310.080	1,47
5	Relleno y compactacion de terreno									13.557.600	3,15
6	Construccion de cordon cuneta									53.919.960	12,53
7	Construcción de hormigon armado									316.260.000	73,51
8	Relleno y Compactación de terreno.									5.977.400	1,39
9	Servicio de señalización de caminos (Señalización Horizontal)									3.842.937	0,89
10	Servicio de señalización de caminos (Señalizacion Vertical)									8.538.750	1,98
11	Servicio de Colocación de Tachas Reflectivas Bidireccionales									5.785.000	1,34
12	Limpieza de obra.									6.172.740	1,43
	TOTAL									430.217.707	100,00

Contractual		
Monto Bruto Mensual Contractual	**215.108.854**	**215.108.854**
Porcentaje Avance Mensual Contractual	**50,00%**	**50,00%**
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	**50,00%**	**100,00%**

Certificado		
Monto Bruto Mensual Certificado	**322.864.310**	
Porcentaje Avance Mensual Certificado	**75,05%**	
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	**75,05%**	

	Mes1	Mes2
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	50,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	75,05%	

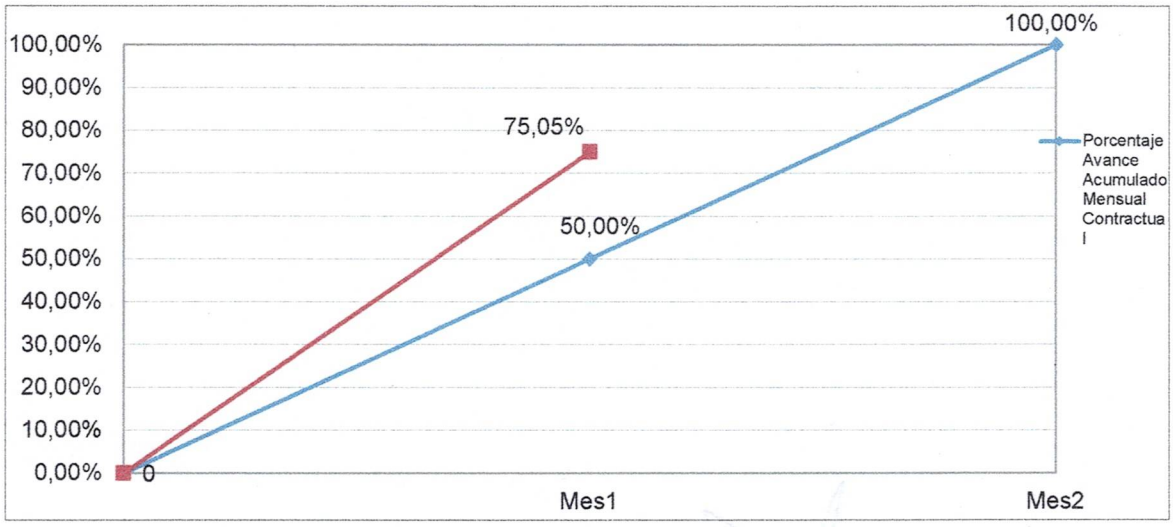

---REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

PEREIRA CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550-2
San Ignacio - Misiones - Py.

---REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra
