0[illegible]0001

Natalio, 20 de Diciembre de 2023

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 9799
Fecha: 2 DIC 2023 Hora: 15:28
Firma: Fojas:

Señor:
Gobernador del Departamento de Itapuá
Don Francisco Javier Pereira Rieve
Presente.

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 10/2023 - Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación con ID: 432.379.-

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras Nº 1 del Contrato N° 11/2023 de referencia, correspondiente al mes de noviembre - diciembre del corriente año.

Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.

El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **38.848.077** (Treinta y ocho millones ochocientos cuarenta y ocho mil setenta y siete.).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
Miguel Angel Golasik
CONTRATISTA

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: Noviembre - Diciembre

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA 10/2023 - Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación ID: 432.379

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación	100,00%	156.000.046	0,00%	0	31,13%	48.560.096	31,13%	48.560.096
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**156.000.046**	**0**	**0**	31,13%	**48.560.096**	31,13%	**48.560.096**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	31.200.009	0	9.712.019	9.712.019
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**31.200.009**	**0**	**9.712.019**	**9.712.019**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				38.848.077	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**38.848.077**	

Certificado Básico Nº 01

Mes: Noviembre - Diciembre

Contrato N°: 11/2023

Monto Básico: 156,000.046 gs

Contratista: Miguel Angel Golasik

Fecha de Inicio: 27/Octubre/2023

Plazo de Ejecución: 45 dias

Fecha de Terminación: 12/12/2023

SON GUARANIES: Treinta y ocho millones ochocientos cuarenta y ocho mil setenta y siete.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA — Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPUA — Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Ing. Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Miguel Angel Golasik
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

200002

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 1

CONTRATO N° 11/2023

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº: 10/2023 - Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación con ID: 432.379.-

CONTRATISTA: Miguel Ángel Golasik

En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Noviembre del 2023, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Carlos Amarilla, encargada de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Sr. Miguel Ángel Golasik, Representante legal de San Pablo Metalúrgica - Construcciones, para la;

- Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de noviembre - diciembre del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados- se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

Miguel Ángel Golasik
Representante Legal

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA Fiscalia de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA 10/2023 - Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación
ID: 432.379

CONTRATISTA: Miguel Angel Golasik	**CONTRATO N°:** 11/2023
MONTO DE LA OFERTA: 156.000.046 gs	**PLAZO:** 45 dias
LOTE N°:	**FECHA:** 27/10/2023

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						Incidencia del Rubro sobre el Total	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparacion de obra																	
1.1	Cartel de obra (estructura metálica con chapa N° 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.978.832	1.978.832	0,013	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Desmonte de instalaciones electricas y artefactos existentes	Unidad Medida Global	1,00	1.049.982	1.049.983	0,007	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,007	0,007	0,00	1,00	1,00	0	1.049.982	1.049.982
1.3	Desmonte de artefactos sanitarios existentes	Unidad Medida Global	1,00	730.830	730.830	0,005	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,005	0,005	0,00	1,00	1,00	0	730.830	730.830
1.4	Demolición de pisos existente en sanitarios	Metros cuadrados	30,56	15.981	488.373	0,003	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,003	0,003	0,00	30,56	30,56	0	488.373	488.373
1.5	Demolición de revestimientos existente en sanitarios	Metros cuadrados	66,25	15.981	1.058.728	0,007	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,007	0,007	0,00	66,25	66,25	0	1.058.728	1.058.728
1.6	Demolición de mamposteria existente	Metros cuadrados	3,50	18.039	63.137	0,000	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	3,50	3,50	1	63.137	63.138
1.7	Placa de Inauguración (40cmx30cm)	Unidad	1,00	1.187.590	1.187.591	0,008	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Colocacion de hormigon armado																	
2.1	Encadenado inferior de HºAº de 15x30cm	Unidad	3,35	107.060	358.651	0,002	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,002	0,002	0,00	3,35	3,35	0	358.651	358.651
3	Mamposteria																	
3.1	Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	3,35	47.786	160.085	0,001	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,001	0,001	0,00	3,35	3,35	0	160.084	160.084
3.2	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	11,65	31.584	367.954	0,002	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,002	0,002	0,00	11,65	11,65	0	367.954	367.954
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado																	
4.1	Reparación de techo de teja colonial s/ tejuelones y estructura de madera, incluye desmonte, provisión y colocación.	Metros cuadrados	110,00	168.610	18.547.056	0,119	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	28,00	87.445	2.448.455	0,016	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Bajadas de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	16,00	124.334	1.989.351	0,013	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Revoques																	
5.1	De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	4,05	24.430	98.940	0,001	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,001	0,001	0,00	4,05	4,05	0	98.940	98.940
5.2	De pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	90,00	24.430	2.198.664	0,014	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,014	0,014	0,00	90,00	90,00	0	2.198.664	2.198.664
6	Colocacion de pisos - contrapisos																	
6.1	Carpeta hidrofuga de 2 cm de espesor (1:3)	Metros cuadrados	30,56	42.362	1.294.571	0,008	0,00%	**80,00%**	80,00%	0,000	0,007	0,007	0,00	24,45	24,45	0	1.035.656	1.035.656
6.2	Piso de cerámica antideslizante PI5 en sanitarios.	Metros cuadrados	30,56	101.623	3.105.605	0,020	0,00%	**80,00%**	80,00%	0,000	0,016	0,016	0,00	24,45	24,45	0	2.484.484	2.484.484

Fiscalización de Obras
Ing. Jesús Javier Arrúa Villalba
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

7	Revestimiento de azulejos																	
7.1	Revestimientos de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	77,55	85.176	6.605.399	0,042	0,00%	**80,00%**	80,00%	0,000	0,034	0,034	0,00	62,04	62,04	0	5.284.319	5.284.319
8	Montaje / Desmontaje de cielorraso																	
8.1	Cielorraso suspendido de placas de durlock.	Unidad	205,80	94.038	19.352.938	0,124	0,00%	**60,00%**	60,00%	0,000	0,074	0,074	0,00	123,48	123,48	0	11.611.763	11.611.763
9	Aberturas																	
9.1	Provisión y colocación de puerta metalica de chapa doblada n° 20 de 0,80x210m con marco y herrajes, pintura, base antioxido y esmalte sintetico.	Unidad	1,00	1.399.633	1.399.633	0,009	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco de 0,70x210m, incluye pintura, base sellador y esmalte sintetico	Unidad	4,00	939.926	3.759.702	0,024	0,00%	**25,00%**	25,00%	0,000	0,006	0,006	0,00	1,00	1,00	0	939.926	939.926
9.3	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín de 1,00x0,50m incluye vidrios de 4mm y pintura, base antioxido y esmalte sintetico.	Unidad	1,00	490.927	490.927	0,003	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Colocacion de vidrios																	
10.1	Provisión y colocación de vidrios de 4mm en ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	2,00	103.095	206.191	0,001	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Servicio de pintura																	
11.1	Repintado de pared interior exterior al látex acrílico, color a elegir (minimo 2 manos) altura 2,90m en interior.	Metros cuadrados	615,00	25.095	15.433.548	0,099	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11.2	Pintura de cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido,color blanco.	Metros cuadrados	205,80	28.511	5.867.605	0,038	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Construccion e instalaciones electricas																	
12.1	Instalación de tablero general - metalico trifasico con barras RST, capacidad para 24 llaves.	Unidad	1,00	507.719	507.719	0,003	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.2	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interiores 40x40x40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	2,00	294.388	588.776	0,004	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,004	0,004	0,00	2,00	2,00	0	588.776	588.776
12.3	Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.	Unidad	1,00	361.554	361.554	0,002	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,002	0,002	0,00	1,00	1,00	0	361.554	361.554
12.4	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2,00	105.242	210.485	0,001	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.5	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1,00	530.702	530.703	0,003	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.6	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	19,00	87.570	1.663.838	0,011	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12.7	Alimentación de boca de luces, incluye placa.	Unidad	47,00	112.422	5.283.816	0,034	0,00%	**50,00%**	50,00%	0,000	0,017	0,017	0,00	23,50	23,50	0	2.641.908	2.641.908
12.8	Alimentación de boca de tomacorriente, incluye placa.	Unidad	47	112421,6	5.283.816	0,034	0,00%	**50,00%**	50,00%	0,000	0,017	0,017	0,00	23,50	23,50	0	2.641.908	2.641.908
12.9	Alimentación subterranea de tablero general con cables NYY 4x16mm desde medidor.	Metro lineal	16,00	133.476	2.135.616	0,014	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,014	0,014	0,00	16,00	16,00	0	2.135.616	2.135.616
12.10	Alimentación de circuitos de aire acondicionado, incluye llave bipolar.	Unidad	6,00	850.686	5.104.119	0,033	0,00%	**70,00%**	70,00%	0,000	0,023	0,023	0,00	4,20	4,20	0	3.572.883	3.572.883
12.11	Alimentación de circuitos de ducha electrica, incluye llave bipolar.	Unidad	4,00	473.202	1.892.810	0,012	0,00%	**50,00%**	50,00%	0,000	0,006	0,006	0,00	2,00	2,00	0	946.405	946.405
12.12	Alimentación de circuito de compresor odontologico, incluye llave bipolar.	Unidad	1,00	848.044	848.044	0,005	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Construccion e instalaciones electricas - ARTEFACTOS																	
13.1	Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	13,00	287.948	3.743.324	0,024	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.2	Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	20,00	129.282	2.585.648	0,017	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.3	Luces LED de adosar de 18w cuadrado	Unidad	9,00	114.113	1.027.016	0,007	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.4	Luces LED tipo A.P. de 40w con encendido automatico	Unidad	6,00	611.298	3.667.791	0,024	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.5	Provisión y colocación de ducha electrica	Unidad	4,00	167.842	671.370	0,004	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Instalaciones sanitarias																	
14.1	Instalación de agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de 3/4" - y 10 llaves de paso de 1/2", griferias fv de agua fría para lavatorios, griferia pico alto fv para cocina. Tuberías roscable blanco según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1,00	2.673.538	2.673.544	0,017	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,017	0,017	0,00	1,00	1,00	0	2.673.538	2.673.538

Fiscalización

Ing. Carlos [illegible]
Fiscal de Obra
Gobernación de [illegible]

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

6000000.0

14.2	Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta camara septica para 6 inodoros, 7 lavatorios, 4 ducha electrica, 12 RPS de 15cm, 2 desengrasador) caños de ventilación.	Unidad Medida Global	1,00	3.801.110	3.801.111	0,024	0,00%	**100,00%**	100,00%	0,000	0,024	0,024	0,00	1,00	1,00	0	3.801.110	3.801.110
14.3	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta, incluye accesorios.	Unidad	6,00	524.667	3.148.004	0,020	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.4	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, incluye accesorios.	Unidad	7,00	606.141	4.242.986	0,027	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.5	Provisión y colocación de jaboneras de adosar para baño.	Unidad	7,00	44.090	308.628	0,002	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.6	Provisión y colocación de portarrollos de adosar para baño.	Unidad	6,00	44.090	264.538	0,002	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.7	Provisión y colocación de porta toallas de adosar para baño.	Unidad	7,00	44.090	308.628	0,002	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.8	Mesada de granito de 1,90x0,55m con 2 (dos) bachas de acero inoxidable 40x34 prof. 17cm, incluye griferias pico alto fv.	Unidad	1,00	2.640.916	2.640.916	0,017	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.9	Juego de barra metálica fija de 60cm, acero inoxidable para baño.	Unidad	4,00	714.051	2.856.206	0,018	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.10	Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigon.	Unidad	6,00	296.590	1.779.543	0,011	0,00%	**60,00%**	60,00%	0,000	0,007	0,007	0,00	3,60	3,60	0	1.067.725	1.067.725
14.11	Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon.	Unidad	1,00	394.365	394.365	0,003	0,00%	**50,00%**	50,00%	0,000	0,001	0,001	0,00	0,50	0,50	0	197.182	197.182
15	Obras complementarias																	
15.1	Reparación de piso alisado en guarda obra, incluye contrapiso y carpeta hidrofuga.	Metros cuadrados	10,00	53.032	530.320	0,003	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15.2	Mesada de hormigon armado con doble bacha de acero inoxidable, con revestimientos ceramicos y mueble de madera bajo mesada.	Metro lineal	3,45	1.077.471	3.717.296	0,024	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15.3	Extintor PQS ABC de 6 kilos.	Unidad	2,00	230.976	461.952	0,003	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.522.815	2.522.815	0,016	0,00%	**0,00%**	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL				**156.000.046**	**100,00%**				**0,00%**	**31,13%**	**31,13%**				0	**48.560.096**	48.560.096

Miguel Angel Golasik
CONTRATISTA

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

900000.9

0' 000007

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA 10/2023 - Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación ID: 432.379

Contrato N°: 11/2023	
Monto del Contrato: 156.000.046 gs	**Term. Prevista:** 12/Diciembre/2023
Plazo Contractual: 45 dias	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 27/Octubre/2023	**Mes:** Noviembre - Diciembre

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 74/2022

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Noviembre	48.452.051	48.452.051	48.560.096	48.560.096	31,06%	31,06%	31,13%	31,13%
Diciembre	107.547.995	156.000.046			68,94%	100,00%		

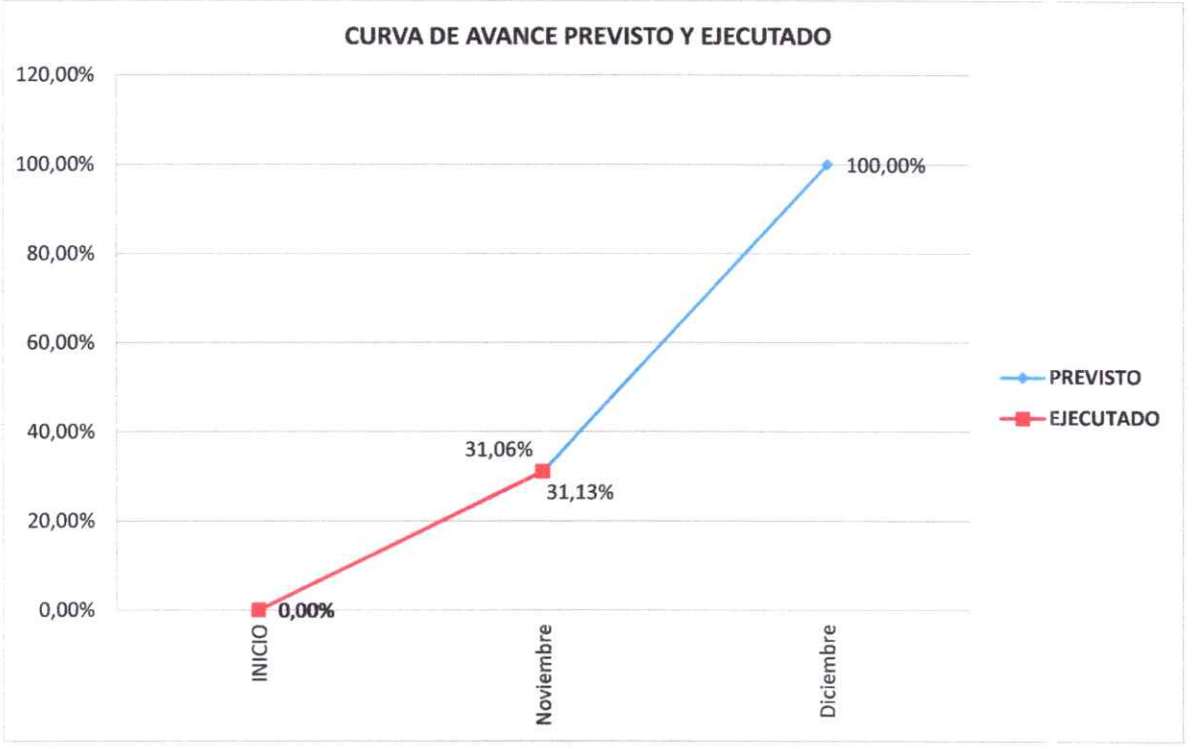

Miguel Angel Golasik
CONTRATISTA
San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA 10/2023 - Refacción de Puesto de Salud en el Barrio Itá Paso de Encarnación ID: 432.379

CONTRATISTA: Miguel Angel Golasik	**CONTRATO N°:** 11/2023
MONTO DE LA OFERTA: 156.000.046 gs	**PLAZO:** 45 dias
LOTE N°:	**FECHA:** 27/10/2023

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						PLAZO DE EJECUCIÓN - 45dias		TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Noviembre	Diciembre	
1	Preparacion de obra							
1.1	Cartel de obra (estructura metálica con chapa N° 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.978.832	1.978.832	1.978.832		1,25%
1.2	Desmonte de instalaciones electricas y artefactos existentes	Unidad Medida Global	1,00	1.049.982	1.049.983	1.049.983		0,66%
1.3	Desmonte de artefactos sanitarios existentes	Unidad Medida Global	1,00	730.830	730.830	730.830		0,46%
1.4	Demolición de pisos existente en sanitarios	Metros cuadrados	30,56	15.981	488.373	488.373		0,31%
1.5	Demolición de revestimientos existente en sanitarios	Metros cuadrados	66,25	15.981	1.058.728	1.058.728		0,67%
1.6	Demolición de mamposteria existente	Metros cuadrados	3,50	18.039	63.137	63.137		0,04%
1.7	Placa de Inauguración (40cmx30cm)	Unidad	1,00	1.187.590	1.187.591		1.187.591	0,75%
2	Colocacion de hormigon armado							
2.1	Encadenado inferior de HºAº de 15x30cm	Unidad	3,35	107.060	358.651	358.651		0,23%
3	Mamposteria							
3.1	Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	3,35	47.786	160.085	160.085		0,10%
3.2	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	11,65	31.584	367.954	367.954		0,23%
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado							
4.1	Reparación de techo de teja colonial s/ tejuelones y estructura de madera, incluye desmonte, provisión y colocación.	Metros cuadrados	110,00	168.610	18.547.056	18.547.056		11,74%
4.2	Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	28,00	87.445	2.448.455		2.448.455	1,55%
4.3	Bajadas de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética.	Metro lineal	16,00	124.334	1.989.351		1.989.351	1,26%
5	Revoques							
5.1	De pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	4,05	24.430	98.940	98.940		0,06%

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

5.2	De pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo.	Metros cuadrados	90,00	24.430	2.198.664	2.198.664		1,39%
6	Colocacion de pisos - contrapisos							
6.1	Carpeta hidrofuga de 2 cm de espesor (1:3)	Metros cuadrados	30,56	42.362	1.294.571	1.294.571		0,82%
6.2	Piso de cerámica antideslizante PI5 en sanitarios.	Metros cuadrados	30,56	101.623	3.105.605	3.105.605		1,97%
7	Revestimiento de azulejos							
7.1	Revestimientos de cerámica en baños h: 2,10 m.	Metros cuadrados	77,55	85.176	6.605.399	6.605.399		4,18%
8	Montaje / Desmontaje de cielorraso							
8.1	Cielorraso suspendido de placas de durlock.	Unidad	205,80	94.038	19.352.938	3.870.588	15.482.350	12,25%
9	Aberturas							
9.1	Provisión y colocación de puerta metalica de chapa doblada n° 20 de 0,80x210m con marco y herrajes, pintura, base antioxido y esmalte sintetico.	Unidad	1,00	1.399.633	1.399.633		1.399.633	0,89%
9.2	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco de 0,70x210m, incluye pintura, base sellador y esmalte sintetico	Unidad	4,00	939.926	3.759.702		3.759.702	2,38%
9.3	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín de 1,00x0,50m incluye vidrios de 4mm y pintura, base antioxido y esmalte sintetico.	Unidad	1,00	490.927	490.927		490.927	0,31%
10	Colocacion de vidrios							
10.1	Provisión y colocación de vidrios de 4mm en ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	2,00	103.095	206.191		206.191	0,13%
11	Servicio de pintura							
11.1	Repintado de pared interior exterior al látex acrílico, color a elegir (minimo 2 manos) altura 2,90m en interior.	Metros cuadrados	615,00	25.095	15.433.548		15.433.548	9,77%
11.2	Pintura de cielorraso suspendido con pintura al látex acrílico con enduido,color blanco.	Metros cuadrados	205,80	28.511	5.867.605		5.867.605	3,71%
12	Construccion e instalaciones electricas							
12.1	Instalación de tablero general - metalico trifasico con barras RST, capacidad para 24 llaves.	Unidad	1,00	507.719	507.719		507.719	0,32%
12.2	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interiores 40x40x40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	Unidad	2,00	294.388	588.776		588.776	0,37%
12.3	Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2.	Unidad	1,00	361.554	361.554		361.554	0,23%
12.4	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2,00	105.242	210.485		210.485	0,13%
12.5	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1,00	530.702	530.703		530.703	0,34%

Fiscalización

Ing. Carlos Javier Arevalo
Fiscal de Obras
Municipalidad de Itapúa

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.086.184-5

600001 0

12.6	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	19,00	87.570	1.663.838		1.663.838	1,05%
12.7	Alimentación de boca de luces, incluye placa.	Unidad	47,00	112.422	5.283.816		5.283.816	3,34%
12.8	Alimentación de boca de tomacorriente, incluye placa.	Unidad	47	112421,6	5.283.816		5.283.816	3,34%
12.9	Alimentación subterranea de tablero general con cables NYY 4x16mm desde medidor.	Metro lineal	16,00	133.476	2.135.616		2.135.616	1,35%
12.10	Alimentación de circuitos de aire acondicionado, incluye llave bipolar.	Unidad	6,00	850.686	5.104.119		5.104.119	3,23%
12.11	Alimentación de circuitos de ducha electrica, incluye llave bipolar.	Unidad	4,00	473.202	1.892.810		1.892.810	1,20%
12.12	Alimentación de circuito de compresor odontologico, incluye llave bipolar.	Unidad	1,00	848.044	848.044		848.044	0,54%
13	Construccion e instalaciones electricas - ARTEFACTOS							
13.1	Luces LED de adosar 60x60 de 48w.	Unidad	13,00	287.948	3.743.324		3.743.324	2,37%
13.2	Luces LED de adosar de 24w cuadrado	Unidad	20,00	129.282	2.585.648		2.585.648	1,64%
13.3	Luces LED de adosar de 18w cuadrado	Unidad	9,00	114.113	1.027.016		1.027.016	0,65%
13.4	Luces LED tipo A.P. de 40w con encendido automatico	Unidad	6,00	611.298	3.667.791		3.667.791	2,32%
13.5	Provisión y colocación de ducha electrica	Unidad	4,00	167.842	671.370		671.370	0,42%
14	Instalaciones sanitarias							
14.1	Instalación de agua corriente; incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso de 3/4" - y 10 llaves de paso de 1/2", griferias fv de agua fria para lavatorios, griferia pico alto fv para cocina. Tuberías roscable blanco según plano de instalaciones.	Unidad Medida Global	1,00	2.673.538	2.673.544	2.673.544		1,69%
14.2	Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta camara septica para 6 inodoros, 7 lavatorios, 4 ducha electrica, 12 RPS de 15cm, 2 desengrasador) caños de ventilación.	Unidad Medida Global	1,00	3.801.110	3.801.111	3.801.111		2,41%
14.3	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta, incluye accesorios.	Unidad	6,00	524.667	3.148.004		3.148.004	1,99%
14.4	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, incluye accesorios.	Unidad	7,00	606.141	4.242.986		4.242.986	2,69%
14.5	Provisión y colocación de jaboneras de adosar para baño.	Unidad	7,00	44.090	308.628		308.628	0,20%
14.6	Provisión y colocación de portarrollos de adosar para baño.	Unidad	6,00	44.090	264.538		264.538	0,17%
14.7	Provisión y colocación de porta toallas de adosar para baño.	Unidad	7,00	44.090	308.628		308.628	0,20%
14.8	Mesada de granito de 1,90x0,55m con 2 (dos) bachas de acero inoxidable 40x34 prof. 17cm, incluye griferias pico alto fv.	Unidad	1,00	2.640.916	2.640.916		2.640.916	1,67%

Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.796.154-5

14.9	Juego de barra metálica fija de 60cm, acero inoxidable para baño.	Unidad	4,00	714.051	2.856.206		2.856.206	1,81%
14.10	Registros cloacales de 45x45cm, con tapa de hormigon.	Unidad	6,00	296.590	1.779.543		1.779.543	1,13%
14.11	Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon.	Unidad	1,00	394.365	394.365		394.365	0,25%
15	Obras complementarias							
15.1	Reparación de piso alisado en guarda obra, incluye contrapiso y carpeta hidrofuga.	Metros cuadrados	10,00	53.032	530.320		530.320	0,34%
15.2	Mesada de hormigon armado con doble bacha de acero inoxidable, con revestimientos ceramicos y mueble de madera bajo mesada.	Metro lineal	3,45	1.077.471	3.717.296		3.717.296	2,35%
15.3	Extintor PQS ABC de 6 kilos.	Unidad	2,00	230.976	461.952		461.952	0,29%
16	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.522.815	2.522.815		2.522.815	1,60%
TOTAL					**156.000.046**			

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	48.452.051	107.547.995	**156.000.046**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	31,06%	68,94%	**100%**

Miguel Angel Golasik
CONTRATISTA

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Ing. GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 432.379.
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contratación Directa N° 10/2023.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN.
- **No. DE CONTRATO:** 11/2023.
- **OBRA:** REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO.
- **DISTRITO:** ENCARNACIÓN.

CONTRATISTA: SR. MIGUEL ANGEL GOLASIK

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 27 (veintisiete) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI,** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ING. CARLOS JAVIER AMARILLA**, fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **SR. MIGUEL ANGEL GOLASIK,** en representación de la Empresa Adjudicada **SAN PABLO METALÚRGICA – CONSTRUCCIONES**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la **"REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN"**----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 45 (Cuarenta y cinco) días calendario. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

SR. MIGUEL ANGEL GOLASIK
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

ING. CARLOS JAVIER AMARILLA
Fiscal de obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

ING. FERNANDO OREGGIONI
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni

0 000013
Lote 5668496032 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270167392080**

FORM.427-1 **FECHA 14/12/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2986184	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	GOLASIK BOREZIUK MIGUEL ANGEL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 13/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 8DA3092C

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427129861848DA3092C

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

9 [illegible]014

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2986184

NRO. CERTIFICADO: 413855

FECHA EMISION: 15-12-2023

VENCIMIENTO: 14-01-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2986184

Nro. Certificado: 413855

Razon Social: MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK

Actividad(es): FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

Fecha de Inscripcion: 04-03-2022

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0312-34-0001 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel: 223 141/3 - www.ips.gov.py

0 000015

INFORME DE

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD

MIGUEL ANGEL GOLASIK

NOVIEMBRE - DICIEMBRE de 2023

INFORME DE OBRAS

OBRA: : REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO ITÁ PASO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN ID: 432.379.

UBICACIÓN:	DISTRITO:	COORDENADAS UTM:	MONTO DEL CONTRATO:
BARRIO ITA PASO	ENCARNACIÓN		156.000.046 Gs.
EMPRESA CONTRATISTA:	**Nº DE TELÉFONO:**	**Nº CONTRATO:**	**FECHA DE INICIO:**
Miguel Golasik	0984 454105	11/2022	26-12-2022
MODALIDAD / LOTE:	**PLAZO CONTRACTUAL:**	**AMPLIACIONES**	**TERMINACIÓN PREVISTA:**
CD Nº 10/2023	45 DÍAS		12/12/2023

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: diciembre del 2023

Avance de Obra: 31,13%

OBSERVACIONES GENERALES:

Se esta ejecutando colocación de cielorraso e instalaciones eléctricas

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalizacion de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapua

Fiscalización de Obras

Ing. [illegible]
Fiscal de Obras
Gobernación de [illegible]

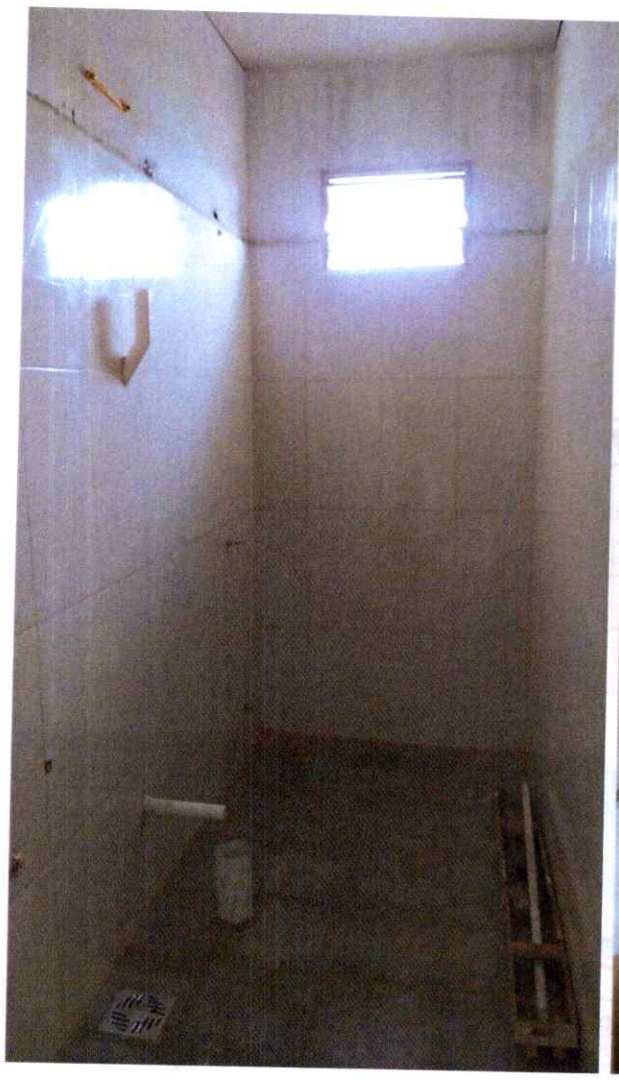

Fiscalización de Obras

Ing. [illegible]
Fiscalización de Obras
Gobernación de [illegible]

Tavusuo
Gobernación
de Itapúa

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE OBRAS			
ORDEN	ITEMS.		APROBACIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)
1	NOTA DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO		✓
2	RESUMEN DE CERTIFICADO BÁSICO		✓
3	ACTA DE MEDICIÓN		✓
4	PLANILLA DE CERTIFICADO (porcenteje de ejecución de items - incidencias - importe)		✓
5	PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		✓
	a-	CUADRO DE AVANCE (previstos - ejecutados)	✓
	b-	CURVA DE AVANCE (previstos - ejecutados)	✓
6	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO		✓
7	DOCUMENTACIONES ADMINISTRATIVAS		✓
	a-	COPIA DE ACTA DE INICIO, RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	✓
	c-	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL	✓
	d-	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	✓
8	INFORME DE LA FISCALIZACIÓN		✓
9	PRESENTAR EN 4 EJEMPLARES Y FORMATO DIGITAL PDF		✓

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

SELLO Y FIRMA DE FISCALIZACIÓN

Fecha de Aprobación 21/12/23.
