Capitán Miranda, 22 de Febrero de 2024.

Señor
Don Otmar Luciano Becker.
Intendente Municipal de Capitán Miranda.
Presente

Ref. **CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO TIPO 4,40MX6,15M CON TECHO DE CHAPA EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA CON ID: 435613**

Me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar el desembolso de la suma de dinero correspondiente a **CERTIFICADO N° 2** de la obra de referencia, que asciende a la suma de **Gs. 25.166.690 Guaraníes (Veinticinco millones ciento sesenta y seis mil seiscientos noventa.).**
Adjunto, informes, certificado de obra. Sin más de que agregar aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obra.
Reg. Prof. N° 3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

Gustavo Cardozo
Contratista.
Ruc 1941011-5.

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1941011-5 Cel.0984776495

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA.

CERTIFICADO DE OBRA.

Items del Rancho Construcción de un Baño tipo 4.40mx1.15m con techo de chapa en la Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera con ID:403633

Construcción de un Baño tipo 4.40mx1.15m con techo de chapa en la Esc. Bas. N° 733 Julián Cabrera, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Anticipo de 20% : 19-12-23			Certificado N° 1 : 31-01-24			Certificado N° 2 : 29-02-24		
Item	Código Catálogo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado
1	82101502-001	Cartel sencillo con soporte (Cartel de Obra)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000				100%	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
2	82101502-002	Cartel metálico sin soporte (Placa de Inauguración)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000				100%	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
3	72131601-002	Preparación de obra (Limpieza y preparación de terreno)	Metros cuadrados	27,1	7.500	203.250				100%	203.250	203.250	0	0	203.250
4	72131601-0074	Replanteo y marcación (Replanteo y marcación)	Metros cuadrados	27,1	7.500	203.250				100%	203.250	203.250	0	0	203.250
5	72102604-001	Servicio de Excavación Estructural (Excavación y carga de relleno con PBC)	Metros cúbicos	10	560.000	5.600.000				100%	5.600.000	5.600.000	0	0	5.600.000
6	72131601-004	Colocación de hormigon armado (Encadenados de H° A°)	Metros cúbicos	2,9	2.400.000	6.960.000				100%	6.960.000	6.960.000	0	0	6.960.000
7	72102504-001	Construcción de muro perimetral (Muro de Nivelación De 0,30 cm)	Metros cuadrados	24	185.000	4.440.000				100%	4.440.000	4.440.000	0	0	4.440.000
8	72102505-001	Relleno y compactación de terreno (Relleno y compactación de Interiores)	Metros cúbicos	13	75.000	975.000				100%	975.000	975.000	0	0	975.000
9	72131601-006	Aislación (Aislación asfáltica de muros de nivelación)	Metro lineal	44	25.000	1.100.000				100%	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
10	72102504-001	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación De 0,15 para revocar con ladrillo prensado)	Metros cuadrados	55	90.000	4.950.000				100%	4.950.000	4.950.000	0	0	4.950.000
11	72102504-001	Construcción de muro perimetral (Muro de Elevación exterior De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados)	Metros cuadrados	48	130.000	6.240.000				100%	6.240.000	6.240.000	0	0	6.240.000
12	72131601-010	Aberturas (Encuadrillado bajo aberturas 2 o 3 por hilada (2 hiladas))	Metro lineal	20	25.000	500.000				100%	500.000	500.000	0	0	500.000
13	72101601-999	Construcción / Reparación de Techo Rotante (Techo de chapa zinc trapezoidal prepintada N° 24 con perfilería metálica "C" de 75x40x15x2,5mm como correa y doble perfil "C" de 100x40x15x2,5mm como viga. Aislación con membrana de asfalto, incluye vertederos de chapa doblada n°26)	Metros cuadrados	47	290.000	13.630.000				100%	13.630.000	13.630.000	0	0	13.630.000
14	72131601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metálica, liecto en interior y acompañando la pendiente de vigas en alero)	Metros cuadrados	37	120.000	4.440.000							100%	4.440.000	4.440.000
15	72131601-0076	Servicio de instalacion de chapa (Cenefa metálica de chapa doblada N° 26 en alero)	Metro lineal	16	95.000	1.520.000							100%	1.520.000	1.520.000
16	72101602-006	Revoque de pared (Revoque de paredes Interior y exterior a una cara)	Metros cuadrados	120	42.000	5.040.000				100%	5.040.000	5.040.000	0	0	5.040.000
17	72131601-008	Revoques (Revoque de molduras de ventanas balaustres y puertas)	Metros cuadrados	35	42.000	1.470.000				100%	1.470.000	1.470.000	0	0	1.470.000
18	72131601-008	Revoques (Alisar de ventanas De revoque 1:3 (cemento-arena))	Metros cuadrados	6	42.000	252.000				100%	252.000	252.000	0	0	252.000
19	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes)	Metros cuadrados	27	43.000	1.161.000				100%	1.161.000	1.161.000	0	0	1.161.000
20	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (Carpeta alisada de cemento, Carpeta hidrófuga alisada de cemento para colocación de piso)	Metros cuadrados	22	38.000	836.000				100%	836.000	836.000	0	0	836.000
21	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (Piso cerámico PEI 0 antideslizante)	Metros cuadrados	22	115.000	2.530.000				100%	2.530.000	2.530.000	0	0	2.530.000
22	72131601-005	Instalación o colocación de zócalo (Zócalo cerámico Exterior)	Metro lineal	18	12.000	216.000				100%	216.000	216.000	0	0	216.000
23	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos (Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos, Incluye muro de nivelación, relleno y compactación, carpeta y alisado , Rampas de acceso)	Metros cuadrados	30	130.000	3.900.000				100%	3.900.000	3.900.000	0	0	3.900.000
24	72102601-0999	Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera (Placa separatoria entre mingitorios de madera enchapada de 0,35m x 0,60m)	Unidad	3	260.000	780.000							100%	780.000	780.000
25	72131601-010	Aberturas (Abertura de madera Puerta para baños enchapadas con formica de 0,60x1,60)	Unidad	4	800.000	3.200.000							100%	3.200.000	3.200.000
26	72121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas (Puerta metálica enchapada N° 20 con marcos de chapa doblada N°18 de 0,80 x 2,10, Incluye accesorios y herrajes.)	Unidad	2	1.600.000	3.200.000				100%	3.200.000	3.200.000	0%	0	3.200.000
27	72121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas (Puerta metálica enchapada N° 20 con marcos de chapa doblada N°18 de 1,00 x 2,10, Incluye accesorios y herrajes.)	Unidad	1	1.800.000	1.800.000				100%	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000
28	72131601-010	Aberturas (Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines de 0,60 x 1,00)	Unidad	4	400.000	1.600.000				100%	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000
29	72131601-010	Aberturas (Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,30)	Unidad	1	200.000	200.000				100%	200.000	200.000	0	0	200.000
30	72102509-001	Revestimiento de azulejos (Revestimiento de azulejos color a elegir. Altura 1,65m)	Metros cuadrados	66	115.000	7.590.000				100%	7.590.000	7.590.000	0	0	7.590.000
31	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de paredes revocadas al látex)	Metros cuadrados	40	32.000	1.280.000							100%	1.280.000	1.280.000
32	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas de madera con barniz sintético)	Metros cuadrados	4	32.000	128.000							100%	128.000	128.000
33	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de aberturas metálicas con sintético)	Metros cuadrados	12	32.000	384.000							100%	384.000	384.000
34	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de paredes vistas con antimoho Incoloro)	Metros cuadrados	40	32.000	1.280.000							100%	1.280.000	1.280.000
35	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura de estructura de techo con sintético)	Metros cuadrados	33	32.000	1.056.000							100%	1.056.000	1.056.000
36	72102602-004	Colocación de vidrios (Vidrios Dobles de 3mm)	Metros cuadrados	3,36	200.000	672.000							100%	672.000	672.000
37	72102508-0999	Instalación y/o reparación de espejos para pared (Espejos de 0,60 x 0,40 sin marcos, Esp. 3mm)	Metros cuadrados	1,7	320.000	544.000							100%	544.000	544.000
38	72102201-012	Mantenimiento y reparación de tablero electrico (Instalación de tablero metálico monofásico de 6 módulos)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000							100%	1.200.000	1.200.000
39	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Instalación de disyuntor termomagnético unipolar de 1x16)	Unidad	1	200.000	200.000							100%	200.000	200.000
40	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Instalación de disyuntor termomagnético unipolar de 1x10)	Unidad	4	200.000	800.000							100%	800.000	800.000
41	72102201-0998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (Instalación de Intercelula)	Unidad	1	250.000	250.000							100%	250.000	250.000
42	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Instalación de Jabalina)	Unidad	1	500.000	500.000							100%	500.000	500.000
43	72102201-0998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (Alimentación de circuitos de luces, Incluye electroductos antillama)	Unidad	1	125.000	125.000							100%	125.000	125.000
44	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Alimentación de circuitos de toma corriente, Incluye electroductos antillama)	Unidad	3	125.000	375.000							100%	375.000	375.000
45	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica (Tomacorriente)	Unidad	3	125.000	375.000							100%	375.000	375.000
46	72102201-0998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (Artefactos eléctricos LED de iluminación de 1x18W)	Unidad	11	150.000	1.650.000							100%	1.650.000	1.650.000
47	72102201-0998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación (Alimentación eléctrica aérea con cable N°9 de 2x6mm desde tablero general hasta seccional)	Metro lineal	30	90.000	2.700.000							100%	2.700.000	2.700.000
48	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAIE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e Instalación de caño pvc rígido roscable de 3/4 ")	Metro lineal	25	57.000	1.425.000				100%	1.425.000	1.425.000	0		1.425.000
49	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAIE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e Instalación de caño pvc rígido roscable de 1/2")	Metro lineal	50	48.000	2.400.000				100%	2.400.000	2.400.000	0		2.400.000
50	72101510-002	Instalacion de fontanería sanitaria (Provisión e instalación de llave de paso tipo fv con campana de 1/2")	Unidad	3	250.000	750.000				100%	750.000	750.000	0		750.000
51	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAIE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e Instalación de caño pvc de 100mm reforzado)	Metro lineal	29	75.000	2.175.000				100%	2.175.000	2.175.000	0		2.175.000
52	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAIE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e Instalación de caño pvc de 50mm reforzado)	Metro lineal	16	45.000	720.000				100%	720.000	720.000	0		720.000
53	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAIE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Provisión e Instalación de caño pvc de 40mm reforzado)	Metro lineal	10	40.000	400.000				100%	400.000	400.000	0		400.000
54	72102304-002	Instalacion de fontanería sanitaria (Provisión e instalación de registro de piso sifonado de 15x15)	Unidad	3	150.000	450.000				100%	450.000	450.000	0		450.000
55	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de inodoro con cisterna alta, Incluye inodoro con cisterna, asiento, conexiones de bajada,flexibles, anillo de vedación)	Unidad	4	800.000	3.200.000							100%	3.200.000	3.200.000
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal blanco , Incluye sopapa de desague y flexibles)	Unidad	6	700.000	4.200.000							100%	4.200.000	4.200.000
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de mingitorio , Incluye sopapa de desague y flexibles)	Unidad	3	700.000	2.100.000							100%	2.100.000	2.100.000
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de lavatorio para discapacitado sin pedestal , Incluye sopapa de desague y flexibles)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000							100%	1.000.000	1.000.000
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja, Incluye inodoro con cisterna, asiento, conexiones de bajada,flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000							100%	1.000.000	1.000.000
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Griferia de piso baño para lavatorios)	Unidad	7	260.000	1.820.000							100%	1.820.000	1.820.000
61	72101510-0998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Tabonera de adosar metálico)	Unidad	3	85.000	255.000							100%	255.000	255.000
62	72101510-0998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Portarrollo de adosar metálico)	Unidad	3	85.000	255.000							100%	255.000	255.000
63	72101510-0998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Barra de acero fijo Inoxidable de 0,60 m de largo para baño inclusive)	Unidad	1	670.000	670.000							100%	670.000	670.000
64	72102304-007	Construccion de desague cloacal (Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40)	Unidad	1	500.000	500.000				100%	500.000	500.000	0	0	500.000
65	72102304-007	Construccion de desague cloacal (Registro cloacales de 1,00 x0,60x0,40)	Unidad	1	500.000	500.000				100%	500.000	500.000	0	0	500.000
66	72102303-003	Construccion de camara septica (Instalacion sanitaria: Camara séptica de 3,00 x 1,50)	Unidad	1	2.200.000	2.200.000				100%	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
67	72102303-002	Construccion de pozo ciego (Instalacion sanitaria: Pozo absorvente de 2,50 x 3,50)	Unidad	1	3.000.000	3.000.000				100%	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
68	72152507-002	Servicio de retiro de escombros (Limpieza final)	Metros cuadrados	27,1	8.000	216.800							100%	216.800	216.800
		PRECIO TOTAL				129.742.300				70%	91.336.500	91.336.500	100%	38.405.800	129.742.300
		DEVOLUCIÓN DEL 20%									18.267.300			7.685.160	
		RETENCIÓN DE 5%									913.365			1.921.290	
		MULTAS 0,5%													
		TOTAL CERTIFICADO						25.948.460			72.156.035			28.198.690	
		CERTIFICADO ACUMULADO						25.948.460			98.089.495			123.255.185	
		PORCENTAJE A PAGAR						20%			56%			16%	
		PORCENTAJE ACUMULADO						20%			76%			95%	

SON GUARANÍES: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González T.

PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1341011-8 Cel.0984776405

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

Capitán Miranda, 22 de Febrero de 2024.

Señor

Don Otmar Luciano Becker.

Intendente Municipal de Capitán Miranda.

Presente

Me es grato dirigirme a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el siguiente:

INFORME TECNICO DE OBRA: CONT. N° 13/2023- C.D. N° 07/23-CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO TIPO 4,40MX6, 15M CON TECHO DE CHAPA EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA CON ID: 435613.

En el día de la fecha, se ha procedido a la Inspección de los trabajos de construcción de la Obra mencionada.

CONTRATISTA DE LA OBRA: la Empresa EG PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES representado por GUSTAVO CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 1.941.011 RUC 1941011-5 domiciliado en el Distrito de General Delgado República del Paraguay, **RUC Nº 3414318-1** , responsable de Construcción de la Obra contratada, quien fuera adjudicado para la realización de los trabajos de Provisión de mano de Obra y materiales para la construcción de la Obra Mencionada. Monto total contratado**: Gs 129.742.300 (Ciento veintinueve millones)** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 06 de Diciembre de 2023, con un plazo de hasta 90 (Noventa) días posterior a la firma de contrato y Acta de Inicio de Obra fecha 18 de Diciembre de 2023.

TRABAJOS REALIZADOS.

1- Una vez recorrida, media y verificada la obra, se constató cuanto sigue:

La obra se encuentra en un **100%** de avance según certificación de obra y planilla de cómputo y presupuesto a los 64 días naturales desde Firma de Acta de Inicio de Obra, corresponde el 71% del plazo total 90 días.
Se han culminado todos los ítem de obras del presente contrato. La obra se encuentra culminada.
La obra se ha ejecutado satisfactoriamente de acuerdo a planos y especificaciones técnicas para la RECEPCIÓN PROVISORIA.

LA OBRA POSEE 70% DE MANO DE OBRA LOCAL. LA OBRA POSEE CARTEL DE OBRAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRADOR EN CUANTO A CASCO CHALECOS Y SEÑ ALETICAS.

Firma de Fiscalización

Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

Firma de Contratista

Gustavo Cardozo

EG PROYECTOS SERVICIOS & CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1941011-5 Cel.0984-776405

INFORME TECNICO DE OBRA: CONT. N° 13/2023- C.D. N° 07/23-CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO TIPO 4,40MX6, 15M CON TECHO DE CHAPA EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA CON ID: 435613.

FECHA: 22/02/24.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1341011-5 Cel.0384775405

INFORME TECNICO DE OBRA: CONT. N° 13/2023- C.D. N° 07/23-CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO TIPO 4,40MX6, 15M CON TECHO DE CHAPA EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA CON ID: 435613.

FECHA: 22/02/24.

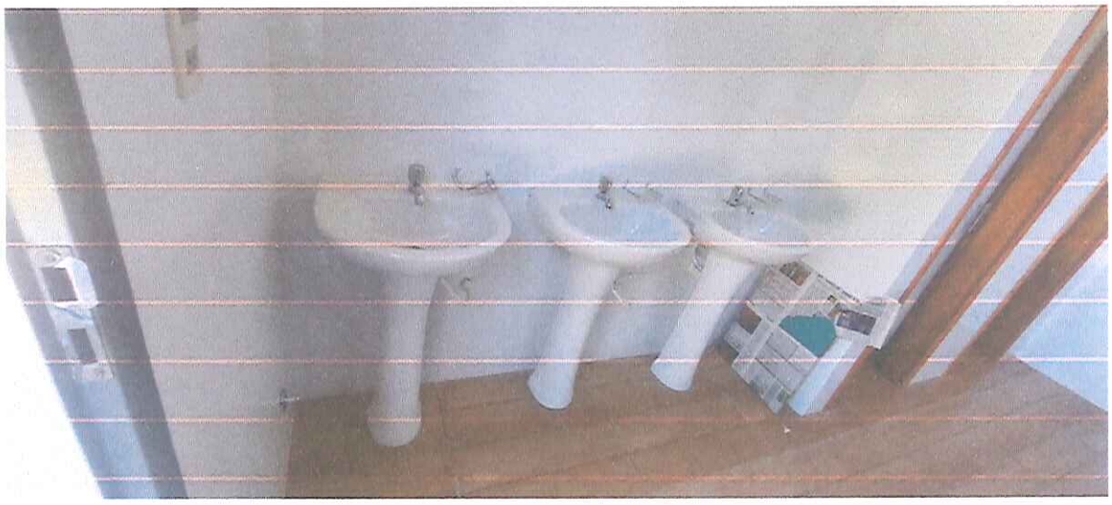

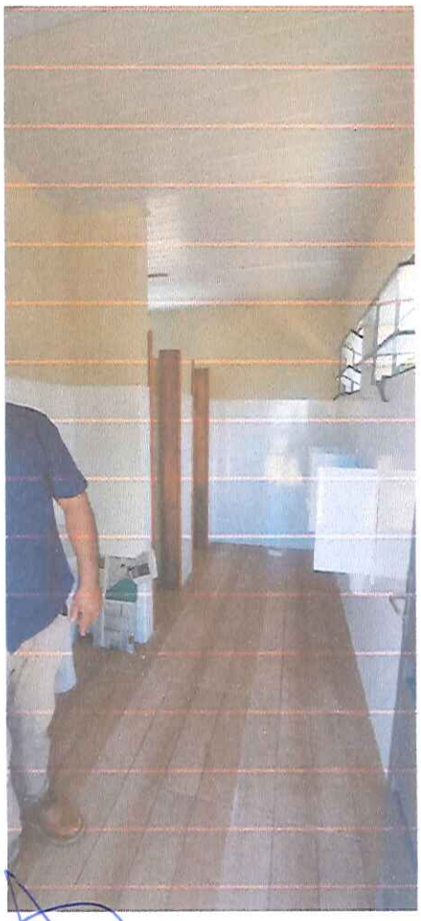

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3.333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 4641011-5 Cel.0964776603

INFORME TECNICO DE OBRA: CONT. N° 13/2023- C.D. N° 07/23-CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO TIPO 4,40MX6, 15M CON TECHO DE CHAPA EN LA ESC. BAS. N° 733 JULIÁN CABRERA CON ID: 435613.

Firma de Fiscalización
Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg.N°3333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

MUNICIPALIDAD CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Firma de Contratista
Gustavo Cardozo

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1341011-5 Cel.0984777865

Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE OBRA

COMPENSACIONES: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A LA ESCUELA PRIVADA N° 7225 EL SEMBRADOR.ID N° 423.184.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el sitio de la obra Calle Bicentenario y Ruta PY06 , se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, Otmar Luciano Becker con C.I.N° 955.704, el Fiscalizador de Obra **PEDRO RAÚL GONZÁLEZ C.I. 3.991.557;** y el Representante de la Empresa Contratista, **GUSTAVO CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 1.941.011 RUC 1941011-5** do responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de debatir sobre los siguientes puntos referente a la obra:

PRIMER PUNTO: SOBRE TRABAJOS ADICIONALES EN COMPENSACIONES EN EL PRESENTE CONTRATO.
Que se han culminado satisfactoriamente la cantidad de 3106m2 de pavimento tipo empedrado en la Calle Bertoni y la Calle Bicentenario.

SEGUNDO PUNTO En común acuerdo de las partes se decide exonerar los pagos en concepto de usufructo de maquinarias de Contratista a la Municipalidad por el monto según horas máquinas de control de planilla por el MONTO TOTAL DE 10.128.000 Gs.

TERCER PUNTO= Como medida de compensación se solicita al Contratista trabajos adicionales al contrato con la la ampliación de pavimento tipo empedrado en Calle Colectora Sur de Ruta PY06 rumbo NorESTE POR LA CANTIDAD DE 32 METROS LINEAL DE LARGO Y 7.00 METROS DE ANCHO. SUPERFICIE TOTAL= 224M2. Que incluya la provisión de material y mano de obra de pavimento pétreo sin colchón de tierra y cordón escondido de 15x30cm

TERCER PUNTO: El intendente municipal y en común acuerdo de las partes autoriza la ejecución de trabajos adicionales en concepto de compensación anteriormente dicho. Presentar presupuestos a quien corresponda ´para las adendas correspondientes

No habiendo otros puntos que tratar firman los presentes el 21 de Febrero de 2024 siendo las 09:00 hs en tres ejemplares del mismo tenor y un solo efecto.

…….	……
Arq. Pedro González Thiebeaud Fiscalizador de Obra.	Otmar Luciano Becker. Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

……
Gustavo Cardozo.
Contratista.

PROYECTOS SERVICIOS & CONSTRUCCIONES
1941011-5 Cel.0984-776405

Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE OBRA

COMPENSACIONES: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A LA ESCUELA PRIVADA N° 7225 EL SEMBRADOR.ID N° 423.184.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el sitio de la obra Calle Bicentenario y Ruta PY06 , se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, Otmar Luciano Becker con C.I.N° 955.704, el Fiscalizador de Obra **PEDRO RAÚL GONZÁLEZ C.I. 3.991.557;** y el Representante de la Empresa Contratista, **GUSTAVO CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 1.941.011 RUC 1941011-5** do responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de debatir sobre los siguientes puntos referente a la obra:

PRIMER PUNTO: SOBRE TRABAJOS ADICIONALES EN COMPENSACIONES EN EL PRESENTE CONTRATO.
Que se han culminado satisfactoriamente la cantidad de 3106m2 de pavimento tipo empedrado en la Calle Bertoni y la Calle Bicentenario.

SEGUNDO PUNTO En común acuerdo de las partes se decide exonerar los pagos en concepto de usufructo de maquinarias de Contratista a la Municipalidad por el monto según horas máquinas de control de planilla por el MONTO TOTAL DE 10.128.000 Gs.

TERCER PUNTO= Como medida de compensación se solicita al Contratista trabajos adicionales al contrato con la la ampliación de pavimento tipo empedrado en Calle Colectora Sur de Ruta PY06 rumbo NorESTE POR LA CANTIDAD DE 32 METROS LINEAL DE LARGO Y 7.00 METROS DE ANCHO. SUPERFICIE TOTAL= 224M2. Que incluya la provisión de material y mano de obra de pavimento pétreo sin colchón de tierra y cordón escondido de 15x30cm

TERCER PUNTO: El intendente municipal y en común acuerdo de las partes autoriza la ejecución de trabajos adicionales en concepto de compensación anteriormente dicho. Presentar presupuestos a quien corresponda ´para las adendas correspondientes

No habiendo otros puntos que tratar firman los presentes el 21 de Febrero de 2024 siendo las 09:00 hs en tres ejemplares del mismo tenor y un solo efecto.

.....	.....
Arq. Pedro González Thiebeaud	Otmar Luciano Becker.
Fiscalizador de Obra.	Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

.....
Gustavo Cardozo.
Contratista.

PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
1941011-5 Cel.0984777405

Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE OBRA

COMPENSACIONES: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO FRENTE A LA ESCUELA PRIVADA N° 7225 EL SEMBRADOR.ID N° 423.184.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el sitio de la obra Calle Bicentenario y Ruta PY06 , se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, Otmar Luciano Becker con C.I.N° 955.704, el Fiscalizador de Obra **PEDRO RAÚL GONZÁLEZ C.I. 3.991.557;** y el Representante de la Empresa Contratista, **GUSTAVO CARDOZO, con Cédula de Identidad N° 1.941.011 RUC 1941011-5** do responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de debatir sobre los siguientes puntos referente a la obra:

PRIMER PUNTO: SOBRE TRABAJOS ADICIONALES EN COMPENSACIONES EN EL PRESENTE CONTRATO.
Que se han culminado satisfactoriamente la cantidad de 3106m2 de pavimento tipo empedrado en la Calle Bertoni y la Calle Bicentenario.

SEGUNDO PUNTO En común acuerdo de las partes se decide exonerar los pagos en concepto de usufructo de maquinarias de Contratista a la Municipalidad por el monto según horas máquinas de control de planilla por el MONTO TOTAL DE 10.128.000 Gs.

TERCER PUNTO= Como medida de compensación se solicita al Contratista trabajos adicionales al contrato con la la ampliación de pavimento tipo empedrado en Calle Colectora Sur de Ruta PY06 rumbo NorESTE POR LA CANTIDAD DE 32 METROS LINEAL DE LARGO Y 7.00 METROS DE ANCHO. SUPERFICIE TOTAL= 224M2. Que incluya la provisión de material y mano de obra de pavimento pétreo sin colchón de tierra y cordón escondido de 15x30cm

TERCER PUNTO: El intendente municipal y en común acuerdo de las partes autoriza la ejecución de trabajos adicionales en concepto de compensación anteriormente dicho. Presentar presupuestos a quien corresponda ´para las adendas correspondientes

No habiendo otros puntos que tratar firman los presentes el 21 de Febrero de 2024 siendo las 09:00 hs en tres ejemplares del mismo tenor y un solo efecto.

…….	……
Arq. Pedro González Thiebeaud Fiscalizador de Obra.	Otmar Luciano Becker. Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA DPTO. DE OBRAS
Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

……
Gustavo Cardozo.
Contratista.

PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
1941011-5 0983847765
