FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°1 - CERTIFICADO N°1 - DICIEMBRE

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 09/2025 "Ampliación y Remodelación en el Polideportivo Municipal – 2da Etapa – Barrio Jazmin – General Jose María Delgado – Plurianual" ID N° 474.815
OBRA: Polideportivo Municipal
BENEFICIARIO: Barrio Jazmin
FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustin Yd
AVANCE DE OBRA: 18,55%
FECHA DE VISITA: 12/12/2025
FECHA DE INFORME: 12/12/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Jazmin	Gral. Delgado	960.632.768 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
EMILIO EDUARDO BOGADO VALLEJO	0995 359 159	41/2025
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
180 días	03 – diciembre – 2025	01 – junio – 2026

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 12/12 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 18,55%

Se observó al equipo de trabajo en la realización de diferentes rubros contractuales, entre los cuales se incluyen todos los trabajos preliminares para el inicio de obra como el cartel de obra, relleno y compactación, replanteo y marcación, así como también los trabajos de fundación incluyendo las excavaciones, las zapatas, las nivelaciones y el encadenado inferior, también se elevaron las mamposterías y sus respectivas aislaciones. Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados:

Ing. Agustin Yd
.....Secretaría de Obras Públicas.....
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

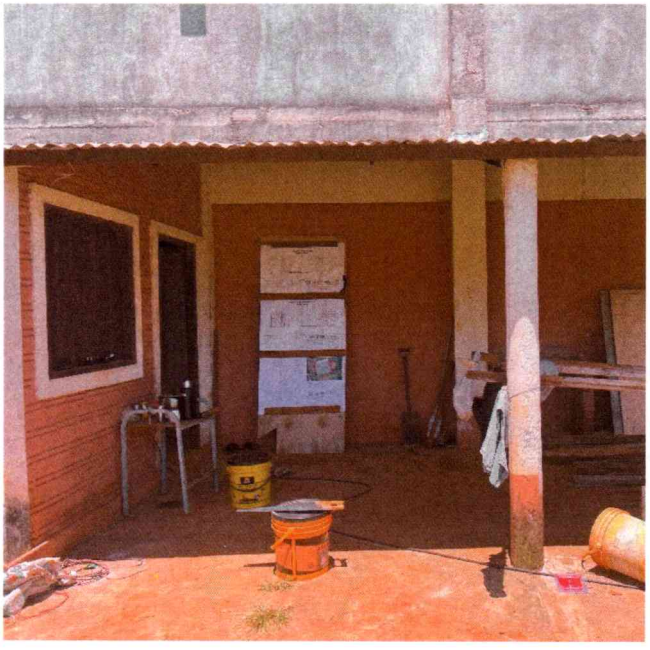

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
