MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de caminero e iluminación en Plaza Km 15 Acaray - Villa Dorita***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km 15 Acaray - Villa Dorita

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total	CERTIFICADOS ACTUAL ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	*Cartel de Obra: (1,80x2,00 mts.)*	m2	3,60	849.822	3.059.359	3,60	100	3.059.359
2	*Replanteo, Marcacion y Nivelacion de Terreno*	m2	72,12	5.831	420.532	72,12	100	420.532
	Caminero Perimetral							
3	*Provisión y colocación de Cordón prefabricado de H° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigón.*	ml	99,00	37.959	3.757.941	99,00	100	3.757.941
4	*Preparación de colchón de triturada 6ta h= 0,02m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.*	m2	72,12	186.961	13.483.627	72,12	100	13.483.627
	Instalacion Electrica							
5	*Colocación de luminaria Led de 200 W con caño galvanizado de 6mts: H y doble brazo de 1m.*	un	5,00	2.899.325	14.496.625	5,00	100	14.496.625
6	*Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)*	un	5,00	174.963	874.815	5,00	100	874.815
7	*Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)*	ml	40,00	25.861	1.034.440	40,00	100	1.034.440
8	*Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto*	gl	1,00	2.930.638	2.930.638	1,00	100	2.930.638
	Limpieza							
9	*Limpieza final de obra*	m2	72,12	8.784	633.502	72,12	100	633.502
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 43/2023			Total	₵ 40.691.479	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₵ 40.691.479

Monto de Certificado	40.691.479
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	2.034.574
Total a Pagar por Certificado	38.656.905

Miguel Cáceres
Director de Obras

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de caminero e iluminación en Plaza Km 15 Acaray - Villa Dorita***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km 15 Acaray - Villa Dorita

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Minga Guazú, a los 28 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: Construccion de Caminero e iluminacion de Plaza km km 15 Acaray - Villa Dorita - Contrato N° 43/2.023 - ID 435.049, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa La Compañia S.R.L.

N°	Descripción	Unid	Cant.	Cant.ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	*Cartel de Obra: (1,80x2,00 mts.)*	m2	3,60	3,60
2	*Replanteo, Marcacion y Nivelacion de Terreno*	m2	72,12	72,12
	Caminero Perimetral			
3	*Provisión y colocación de Cordón prefabricado de H° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigón.*	ml	99,00	99,00
4	*Preparación de colchón de triturada 6ta h= 0,02m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.*	m2	72,12	72,12
	Instalacion Electrica			
5	*Colocación de luminaria Led de 200 W con caño galvanizado de 6mts: H y doble brazo de 1m.*	un	5,00	5,00
6	*Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)*	un	5,00	5,00
7	*Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)*	ml	40,00	40,00
8	*Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto*	gl	1,00	1,00
	Limpieza			
9	*Limpieza final de obra*	m2	72,12	72,12

Miguel Caceres
Director de Obras

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACION DE PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA, KM 15 ACARAY VILLA DORITA DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 43 /2.023-ID: N° 435.049

.

CONTRATISTA: SR. HUGO RUBEN MARECO CANTERO – LA COMPAÑÍA S.R.L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS.-RUC: 80020095-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACION DE PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA, KM 15 ACARAY VILLA DORITA DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 43 /2.023-ID: N° 435.049 LOTE 02: CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACION DE PLAZA KM 15 ACARAY VILLA DORITA"** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. HUGO RUBEN MARECO CANTERO – LA COMPAÑÍA S.R.L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS.-RUC: 80020095-0.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

La Compañia S.R.L de Construcciones y Servicios

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS/CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
SERVICIOS DE PAISAJISMO Y JARDINERÍA

Cel: (0973) 500 889 - KM 20 ACARAY A 1 KM DE LA RUTA PY02 ZONA RURAL.
MINGA GUAZU - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 16712405
RUC: 80020095-0
Inicio de vigencia 03 de Octubre de 2023
Válido hasta 31 de Octubre de 2024

FACTURA

Nº 001-001- 0000458

Fecha de Emisión, 28 DE DICIEMBRE DE 2023 — Condición de Venta: **Contado** ☐ **Crédito** ☑

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

R.U.C.: 80010478-1 — Teléfono: —/—

Dirección: MINGA GUAZU — Nota de Remisión Nº: —/—

Cant.	Descripción	Precio	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Por Servicio de Const. de Caminos				
	e Iluminación en Plaza Km 25				
	Acaray - Villa Dorita - LOTE 2				
	del Contrato Nº 43/23 - LCD Nº				
	45/23 - CERT. Nº 1	38.656.905			38.656.905
SUB-TOTALES					38.656.905

TOTAL A PAGAR GS. ☑ **USD.** ☐ (En letras): Treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil novecientos cinco - — 38.656.905

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — /— **(10%)** 3.514.264 **TOTAL IVA:** 3.514.264 - -

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
(No valido para crédito fiscal)

GRAFICOLOR DE GENNY BARRIENTOS RUC. 4124698 - 5 · Av. San José casi Avda. Monday a 100 mts del Colegio San José - C.D.E. - Telefax: (061) 574 462
01 Tal. (50X3) 0000.451 al 0000.500 · C. H. I. Nº 2139

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800200950 LA COMPAÑIA S.R.L DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Teléfono/s : (0973) 500 889 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** lacompania.srl@hotmail.com

Dirección : CALLE KM 20 ACARAY A 1 KM DE LA RUTA INTERNACIONAL N° 7 ZONA RURAL - MINGA GUAZU

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 014458

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 27/06/2024

Otorgado en Asunción, el 27/06/2018

Renovado el 04/08/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800200950

10052023 1229 800200950 800200950

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

014458

Lote 5668512273 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270167589062

FORM.427-1

FECHA 18/12/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80020095	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	LA COMPAÑIA S.R.L DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 17/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : 97C108B7

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

42718002009597C108B7

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

LA COMPAÑIA SRL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

RUC

80020095-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435049 / CONTRATACION N°45/2023 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA, KM 15 ACARAY - VILLA DORITA DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU

Monto del contrato

156.691.479

Año: 2023 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	OLGA ANALIA	ROMERO MARTINEZ	Cumplio	89346	Contratista	Activo
2	ELVIO	SILVERO CAÑIZA	Cumplio	103091	Contratista	Activo

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

Usuario Impresión: hugomareco

Fecha Impresión: 18/12/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

LA COMPAÑIA SRL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

RUC

80020095-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435049 / CONTRATACION N°45/2023 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA, KM 15 ACARAY - VILLA DORITA DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU

Monto del contrato

156.691.479

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	OLGA ANALIA	ROMERO MARTINEZ	3638676	PARCIAL	LABORAL	
2	ELVIO	SILVERO CAÑIZA	2507411	PARCIAL	LABORAL	

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

Usuario Impresión: hugomareco

Fecha Impresión: 18/12/2023

LA COMPAÑIA S.R.L.

de Construcciones y Servicios

Km. 20 Acaray a 1 km. de la Ruta Internacional PY 2 – Zona Rural - Tel: 0973-500.889
Minga Guazú - Paraguay – e-mail: lacompania.srl@hotmail.com - bosques.srl@gmail.com

Contrato N° 43/23 – LCD N° 45/23 Construcción de Caminero e Iluminación en Plaza – Km 15 Acaray – Villa Dorita – Lote 2 - ID N° 435045.-

Contratista: La Compañía S.R.L. de Construcciones y Servicios.
Contratante: Municipalidad de Minga Guazu.

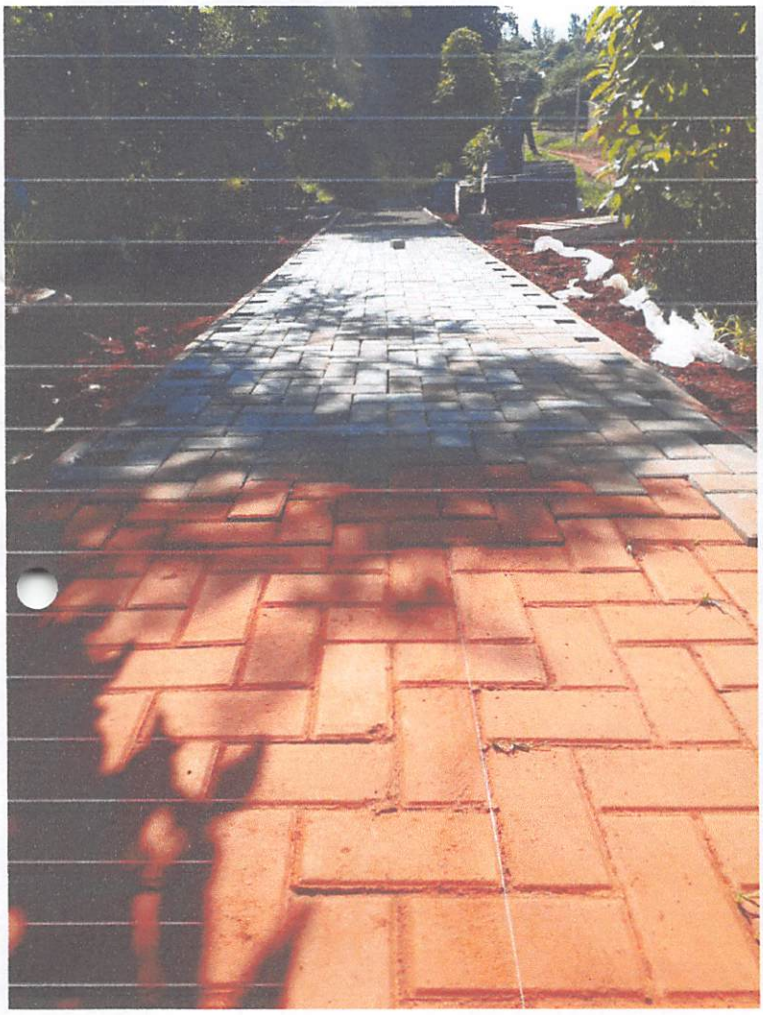

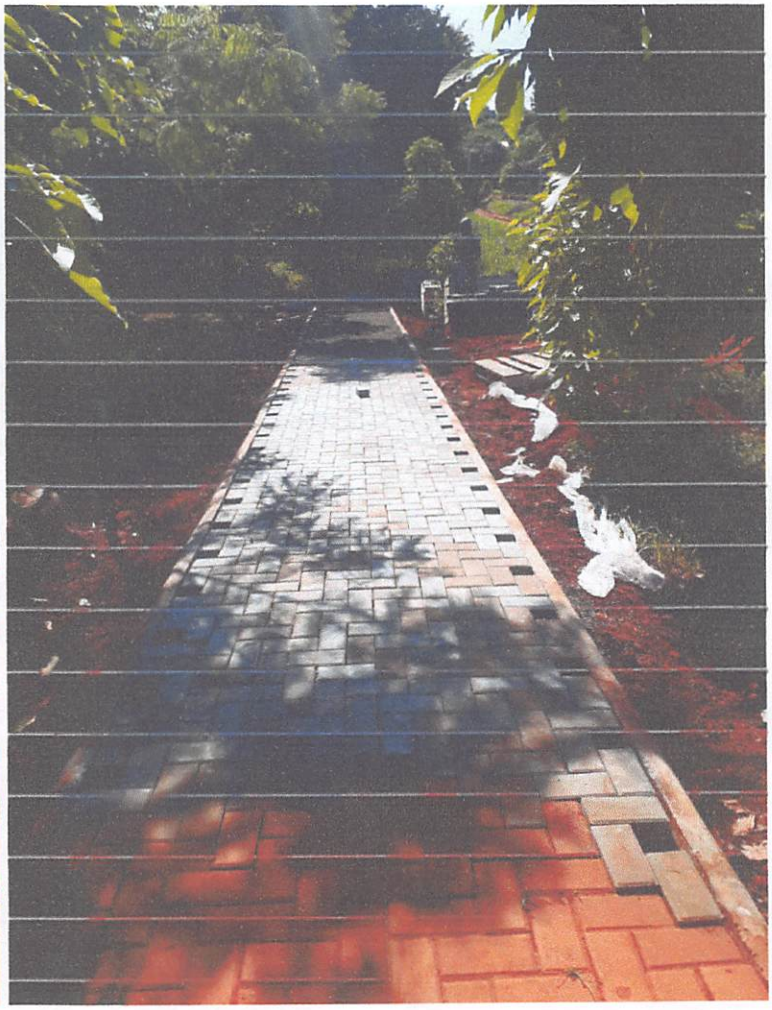

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

LA COMPAÑIA S.R.L.

de Construcciones y Servicios

Km. 20 Acaray a 1 km. de la Ruta Internacional PY 2 – Zona Rural - Tel: 0973-500.889
Minga Guazú - Paraguay – e-mail: lacompania.srl@hotmail.com - bosques.srl@gmail.com

Contrato N° 43/23 – LCD N° 45/23 Construcción de Caminero e Iluminación en Plaza – Km 15 Acaray – Villa Dorita – Lote 2 - ID N° 435045.-

Contratista: La Compañía S.R.L. de Construcciones y Servicios.
Contratante: Municipalidad de Minga Guazu.

LA COMPAÑIA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC: 80020095-0

LIBRO DE OBRA

0000173

CONTRATO Nº 43/23	
Obra: LCD Nº	45/23 - CONST. DE CAMINERO E ILUMINACION EN PLAZA KM 24 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA Y KM. 15 ACARAY VILLA DORITA - LOTE 2 - ID. 431.045
Contratante:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
Fiscalización:	
Contratista:	LA COMPAÑIA SRL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - HUGO R. MARECOS
Ubicación de la Obra:	DISTRITO DE MINGA GUAZU

DESCRIPCION

El presente LIBRO DE OBRA, que consta de Páginas triplicadas y numeradas correlativamente desde el hasta el , inclusive, queda oficialmente habilitado a partir de la fecha para las comunicaciones entre la Municipalidad de Minga Guazú (Fiscalización Dpto. de Obras) y el Contratista (Responsable), dando inicio así a los trabajos objeto del Contrato. En el mismo serán registrados todos los trabajos realizados semanalmente, como así también las novedades y recomendaciones relacionadas con las Obras de la Contratación mencionada.

FECHA: Martes 27 DE NOVIEMBRE/23

Por la Contratista LA COMPAÑIA S.R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUC: 80020095-0	Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Via:Contratante - 2da. Via: Contratista - 3ra. Via: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000174

CONTRATO Nº 43/23	
Obra: LCD Nº	45/23 - CONST. DE CAMINERO E ILUMINACION EN PLAZA KM. 28 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA; KM. 15 ACARAY VILLA DORITA - LOTE 2
Contratante:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU -ID.435.045
Fiscalización:	
Contratista:	LA COMPAÑIA S.R.L. DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - HUGO R. NARECO C.
Ubicación de la Obra:	DISTRITO DE MINGA GUAZU

DESCRIPCION

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN PLAZA KM. 15 ACARAY - VILLA DORITA

SEMANA DEL 27/11 al 02/12/23

En la Semana se procede al replanteo, marcación y nivelación del Terreno. Se manda confeccionar el Cartel de Obra. Se acopian Cordones de Hº Prefabricado y Adoquines. Lluvias abundantes en la Semana.

SEM1

SEMANA DEL 04/12 al 09/12/23

En la Semana se inicia la preparación del colchon de Triturada 6º. Comienzan la colocación de los Adoquines y se adquieren Columnas de Hº; luminarias LED, con caños galvanizados; Cables, ductos, disyuntor e interruptores, fotocélulas, cajas y llaves para el montaje por las columnas. Se coloca el Cartel de Obra. Lluvias en todos los días de la Semana.

Por la Contratista LA COMPAÑIA S.R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUC: 80020095-0	Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Via:Contratante - 2da. Via: Contratista - 3ra. Via: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000175

CONTRATO Nº 43/23

Obra: LCD Nº	45/23 - CONST. DE CAMINERO E ILUMINACION EN PLAZA KM 28 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA; KM. 4 ACARAY - VILLA DORITA - LOTE 2 - ID. 435.045
Contratante:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
Fiscalización:	
Contratista:	LA COMPAÑIA SRL. DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - HUGO R. MARECO C.
Ubicación de la Obra:	DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

DESCRIPCION

SEMANA DEL 11/12 al 16/12/23

En la Semana continua la Colocación de los Adoquines y los Cordones de Hº Prefabricados, con relleno de hormigón. Se construye en los Registros Electricos con ladrillos y con tapa de cemento. Se colocan las columnas de Hº y comienzan las instalaciones lumínicas y el cableado subterraneo. Sin lluvias en la Semana.

SEMANA DEL 18/12 al 23/12/23

Continuan las actividades de la colocación de Adoquines, como así también la colocación de las lumínicas y el ensamblaje de las luminarias LED con sus respectivas llaves TM, fotocélulas, cajas, difusores, etc. Lluvias abundantes en fecha 20/12/23.

Por la Contratista LA COMPAÑIA S.R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUC: 80020095-0	Por el Contratante
FECHA:	**FECHA:**

1ra. Via:Contratante - 2da. Via: Contratista - 3ra. Via: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000176

CONTRATO Nº 43/23	
Obra: LCD. Nº	45/23 - CONST. DE CAMINERO E ILUMINACION EN PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA; KM. N ACARAY VILLADORITA - LOTE 2 ID. 435.045
Contratante:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
Fiscalización:	
Contratista:	LA COMPAÑIA SRL. DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - HUGO R. MARECO C.
Ubicación de la Obra:	DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

DESCRIPCION

SEMANA DEL 25/12 al 30/12/23

En la Semana se procede a la culminación del caminero Adoquinado, procediendo luego a la Compactación con Rodillo liso y el esparcimiento de Arena Lavada sobre el Entrimento de Adoquin terminado. Culminan tambien las Instalaciones Eléctricas con sus registros respectivos. Se procede a la Prueba final de encendido y apagado de las luces, con mucho exito. Lluvias en la Semana.

Por ultimo se procede a la Limpieza Final y retiro de escombros.

En fecha 28/12/23 en vista de la culminación total de los trabajos, se solicita a la Fiscalización la Medición de los trabajos ejecutados para la Certificación correspondiente. Se elabora un acta de Medición Nº 1 en donde constan las cantidades y firman las partes en prueba de conformidad.

Por la Contratista LA COMPAÑIA S.R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUC: 80020095-0	Por el Contratante
FECHA:	**FECHA:**

1ra. Via:Contratante - 2da. Via: Contratista - 3ra. Via: Talonario
