GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 03

Mes: marzo

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092**	100,00%	98.841.130	70,27%	69.460.286	17,41%	17.204.226	87,68%	86.664.512
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**98.841.130**	**70,27%**	**69.460.286**	17,41%	**17.204.226**	**87,68%**	**86.664.512**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	19.768.226	13.892.057	3.440.845	17.332.902
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**19.768.226**	13.892.057	**3.440.845**	**17.332.902**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				13.763.381	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**13.763.381**	

Certificado Básico Nº	**03**
Mes:	marzo
Contrato N°:	32/23
Monto Básico:	₲ 98.841.130
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 dias
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Fecha term. c/ prórroga:	18-abr-24

SON GUARANIES: trece millones setecientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y uno.

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

2

0985171856
impactoconstructora@gmail.com

IMPACTO CONSTRUCTORA

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 03

CONTRATO Nº 32/2023

REFERENCIA: Contratación Directa N° 47/23 contrato N° 32/23
Descripción del llamado: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL"
ID: 437.092
CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos

En la Ciudad de Cambyreta, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 26 días del mes de marzo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Claudio Gaona Valenzuela, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y la Lic. Noelia Ledesma Ocampos, Representante legal de la Empresa Impacto Constructora, para la;

- "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL"

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes marzo del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

---
Representante Legal
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 8922

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 03

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

IMPACTO CONSTRUCTORA

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	32 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	18/4/2024

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 03						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 03					
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	0,012	100	0	100	0,012	0,000	0,012	1	0	1	1.196.384	-	1.196.384
2	Relevamiento topografico, Incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	0,016	100	0	100	0,016	0,000	0,016	183,5	0	183,5	1.594.065	-	1.594.065
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565	0,435	55	40	95	0,239	0,174	0,413	787,215	572,52	1359,735	23.655.811	17.204.226	40.860.037
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	0,083	100	0	100	0,083	0,000	0,083	1431,3	0	1431,3	8.155.547	-	8.155.547
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414	0,010	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	0,287	100	0	100	0,287	0,000	0,287	359	0	359	28.389.361	-	28.389.361
7	Colocacion de hormigon armado -Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237	0,131	50	0	50	0,065	0,000	0,065	3,78	0	3,78	6.469.118	-	6.469.118
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558	0,026	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
					98.841.130	**100%**				**70,3%**	**17,4%**	**87,7%**				**69.460.286**	**17.204.226**	**86.664.512**

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 03

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

Contrato N°:	32/23		
Monto del Contrato: 98.841.130 gs		**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	18/4/2024
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Mes:**	marzo

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 32/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	24.294.111	24.294.111	24.294.111	24.294.111	24,58%	24,58%	24,58%	24,58%
febrero	59.068.225	83.362.336	45.166.175	69.460.286	59,76%	84,34%	45,70%	70,27%
marzo	15.478.794	98.841.130	17.204.226	86.664.512	15,66%	100,00%	17,41%	87,68%
abril								

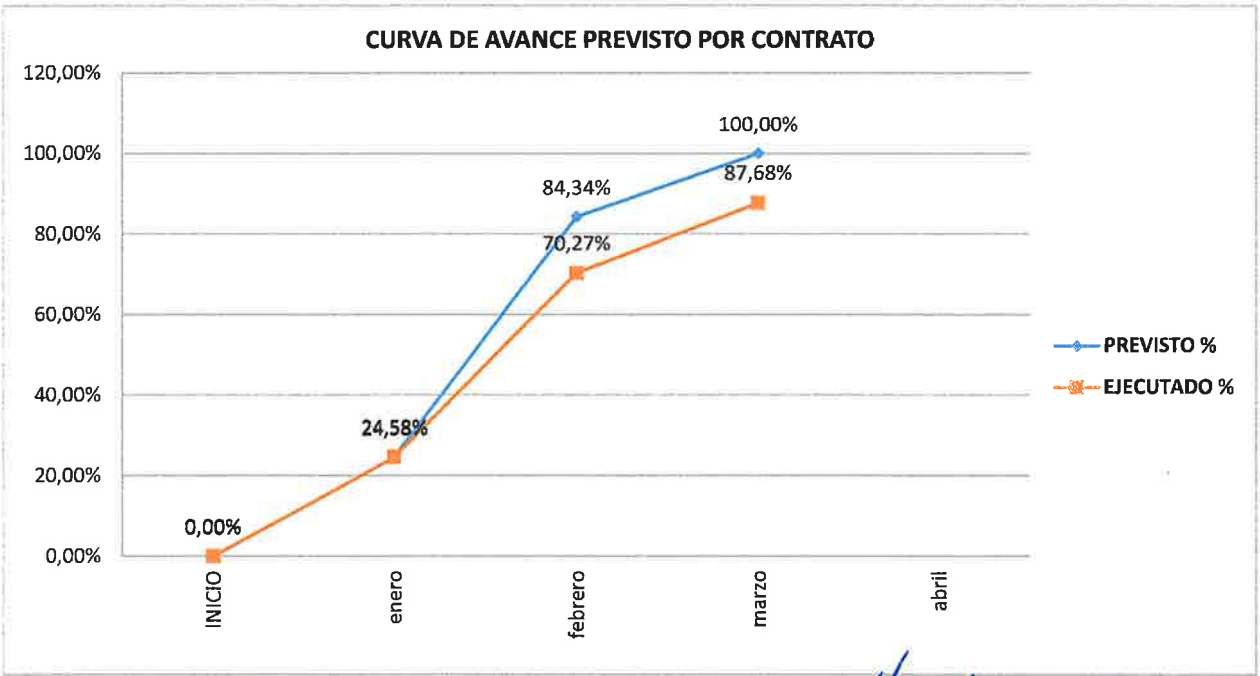

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Gauna Velenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3922

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 03

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

IMPACTO CONSTRUCTORA

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 98.841.130	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	32/23	**PRÓRROGA:**	32 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	18/4/2024

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.196.384	1.196.384	1.196.384			100%
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,5	8.687	1.594.065	1.594.065			100%
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565		43.010.565		100%
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547	1.631.109	6.524.438		100%
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414		1.016.414		100%
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359	79.079	28.389.361	19.872.553	8.516.808		100%
7	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237			12.938.237	100%
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558			2.540.558	100%
					98.841.130				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	24.294.111	59.068.225	15.478.794	98.841.130
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	24,58%	59,76%	15,66%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Sauro Weisnzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3322

6

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 03 - INFORME CERTIFICADO MES DE MARZO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 47/2023: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN ARROYO PORA" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 32/2023 - I. D. N° 437.092

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Barrio Arroyo Pora - Cambyreta

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 01/04 /2024

AVANCE DE OBRA: 87,68%

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Arroyo Pora	Cambyreta	98.841.130 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Noelia Ledesma – IMPACTO CONSTRUCTORA	0985-171-856	32/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PRORROGA OTORGADA	**FECHA DE INICIO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
32 días	18/12/2023	18/04/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 01/04/24 se pudo constatar que la empresa tuvo un avance en los trabajos en el mes de marzo.

- Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto

El avance hasta la fecha es de 87,68%, según su cronograma físico financiero correspondiente al mes de marzo de 2024.

Se menciona a su vez que la empresa se encuentra con un leve retraso en su cronograma de obras, debido en parte a las precipitaciones registradas y sus consecuencias.

Se adjuntan fotografías de la obra donde se refleja su avance.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

.....

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de Obras

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3522

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
