GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 4

MES: Marzo

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(1+2)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313	100%	520.348.500	61,99%	322.565.000	8,11%	42.220.000	70,10%	364.785.000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**520.348.500**	**61,99%**	**322.565.000**	**8,11%**	**42.220.000**	**70,10%**	**364.785.000**

Certificado Básico N°	4
Mes:	Marzo
Contrato N°:	46/2024
Monto Básico:	520.348.500
Contratista:	JL y Compañía S.A.
Fecha de Inicio:	28/11/2024
Plazo de Ejecución:	180 días
Fecha de terminación prevista:	27/5/2025
Prórroga:	0
Fecha de terminación con prórroga:	27/5/2025
Vigencia Póliza de Contrato:	13/3/2026
Vigencia Póliza de Anticipo:	12/1/2026

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	104.069.700	64.513.000	8.444.000	72.957.000
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**104.069.700**	**64.513.000**	**8.444.000**	**72.957.000**

C.I	**Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	33.776.000
C.II	Multas	0
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	**33.776.000**

SON GUARANÍES: Treinta y tres millones setecientos setenta y seis mil

Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 8[illegible]077342-0

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Claudio Gaona
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscalización de Obras

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N°: 4

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Marzo

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313			
CONTRATISTA:	JL y Compañía S.A.	FECHA DE INICIO:	28/11/2024
MONTO DE LA OFERTA:	520.348.500	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/5/2025
CONTRATO N°:	46/2024	PRÓRROGA:	0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 días	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	27/5/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICION						PLANILLA DE CERTIFICADO BASICO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de obra (1,50x2.00m)	Unidad	1,00	1.400.000	1.400.000	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1.400.000	0	1.400.000
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	19.000.000	19.000.000	0,037	100,00%	0,00%	100,00%	0,04	0,00	0,04	1,00	0,00	1,00	19.000.000	0	19.000.000
3	Demolición del puente de hormigón existente.	Unidad Medida Global	1,00	18.500.000	18.500.000	0,036	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	14,25	1.100.000	15.675.000	0,030	100,00%	0,00%	100,00%	0,03	0,00	0,03	14,25	0,00	14,25	15.675.000	0	15.675.000
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Metro lineal	40,00	6.060.000	242.400.000	0,466	95,00%	5,00%	100,00%	0,44	0,02	0,47	38,00	2,00	40,00	230.280.000	12.120.000	242.400.000
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	41,45	3.010.000	124.764.500	0,240	41,01%	24,13%	65,14%	0,10	0,06	0,16	17,00	10,00	27,00	51.170.000	30.100.000	81.270.000
7	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	24,00	630.000	15.120.000	0,029	33,33%	0,00%	33,33%	0,01	0,00	0,01	8,00	0,00	8,00	5.040.000	0	5.040.000
8	Provisión de Ripio (longitud: 1836m, ancho: 9m, altura:0,5m). No incluye flete	Metros cúbicos	8.262,00	9.500	78.489.000	0,151	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	450.000	1.800.000	0,003	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				TOTAL	520.348.500	1,00				61,99%	8,11%	70,10%				322.565.000	42.220.000	364.785.000

Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 8.077342-0

Ing. Silvio Meza
Ing. Silvio Meza
JL y Compañía S.A.
Residente de Obra

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Claudio Gaona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313

CONTRATISTA:	JL y Compañia S.A.
MONTO DE LA OFERTA GS:	520.348.500
CONTRATO N°:	46/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 días

FECHA DE INICIO:	28/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/5/2025
PRÓRROGA:	0
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	27/5/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						**PLAZO DE EJECUCIÓN**						**TOTAL**
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313												
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000						0,27%
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	19.000.000	19.000.000	11.400.000	7.600.000					3,65%
3	Demolición del puente de hormigón existente.	Unidad Medida Global	1,00	18.500.000	18.500.000						18.500.000	3,56%
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	14,25	1.100.000	15.675.000	1.567.500	4.702.500	9.405.000				3,01%
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Metro lineal	40,00	6.060.000	242.400.000	12.120.000	48.480.000	72.720.000	109.080.000			46,58%
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	41,45	3.010.000	124.764.500			12.476.450	37.429.350	74.858.700		23,98%
7	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	24,00	630.000	15.120.000					7.560.000	7.560.000	2,91%
8	Provisión de Ripio (longitud: 1836m, ancho: 9m, altura:0,5m). No incluye flete	Metros cúbicos	8.262,00	9.500	78.489.000					39.244.500	39.244.500	15,08%
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000						2.200.000	0,42%
10	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	450.000	1.800.000						1.800.000	0,35%
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000						1.000.000	0,19%

TOTAL	**520.348.500**						**TOTAL**	**100,00%**
PREVISTO MENSUAL EN GUARANÍES		26.487.500	60.782.500	94.601.450	146.509.350	121.663.200	70.304.500	**520.348.500**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		5,09%	11,68%	18,18%	28,16%	23,38%	13,51%	**100%**
ACUMULADO PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		5,09%	16,77%	34,95%	63,11%	86,49%	100,00%	

Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 8[illegible]077342-0

Ing. Claudio Caona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

5

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Marzo

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313

Contrato N°: 46/2024			
Monto del Contrato:	520.348.500	**Fecha de terminación prevista:**	27/5/2025
Plazo Contractual:	180 días	**Prórroga:**	0
Inicio de Obra:	28/11/2024	**Fecha de terminación con prórroga:**	27/5/2025

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MES 1	26.487.500	26.487.500	38.635.876 ₲	38.635.876 ₲	5,09%	5,09%	7,42%	7,42%
MES 2	60.782.500	87.270.000	183.514.124 ₲	222.150.000 ₲	11,68%	16,77%	35,27%	42,69%
MES 3	94.601.450	181.871.450	100.415.000 ₲	322.565.000 ₲	18,18%	34,95%	19,30%	61,99%
MES 4	146.509.350	328.380.800	42.220.000 ₲	364.785.000 ₲	28,16%	63,11%	8,11%	70,10%
MES 5	121.663.200	450.044.000			23,38%	86,49%		
MES 6	70.304.500	520.348.500			13,51%	100,00%		

CURVA DE AVANCE

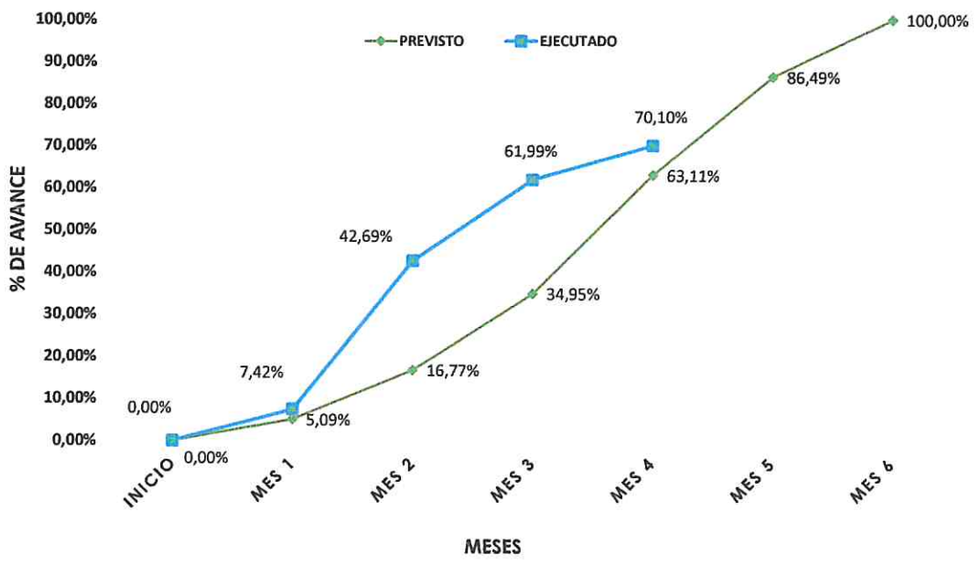

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Diegoo Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Claudio Gaona
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
