Francisco Antonio Tomboly Gianotti

Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p.

Cel.: (0981)402848
Campos Cervera Nº 5815 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15174983
Fecha Inicio Vigencia 18/octubre/2021
Fecha Fin Vigencia 31/octubre/2022
R.U.C. 1165913 - 0

FACTURA

Nº 001-001 **0000633**

Fecha: 08 / 03 / 2022

Cond. de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

Nombre o Razón Social: Secretaría Nacional de Cultura

R.U.C.: 80070610 - 3

Nota de Remisión:

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Dirección de obra para la				
	Construcción del Sitio de la				
	memoria y Centro Cultural				
	1A - Ycua Bolaños.	5.000.000	—	—	5.000.000
Sub total			—	—	5.000.000
Total a Pagar Quarenta cinco millones.					5.000.000

Liquidación del IVA (5%) (10%) 454.545 TOTAL IVA 454.545

Imp. San Alejo S.A. - Hab. SET N°. 1676 - Cecilio Baez 1059 e/ Angel Torres
Tel: 507 387 - RUC: 80054908 - 2 / E-mail: sanalejosa@ymail.com/ del 601 al 650

Original (Blanco): Cliente / Duplicado (Verde): Arch. Tributario
Triplicado (Amarillo) Contabilidad: (no válido para crédito fiscal)

Asunción, 08 de marzo de 2022.

Señores:
Lic. Rocio Mencia Iriarte
Directora General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura
República del Paraguay

Presente

Por la presente me dirijo a Usted, en el marco de la Construcción del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños, hacienda entrega del informe de avance de obra correspondiente al período enero – febrero del 2022 y su factura nº 001-001-0000633.

Atentamente,

Arq. Francisco Tomboly

Francisco Tomboly
Arquitecto
Reg. Prof. 010-0C40692

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
384 Fecha: 08/03/22 Hora: 13:05
Lucia Rios

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CAF UOA

Lic. Rocío Mencia Iriarte
Directora Gral. de Admi. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

A: Lic. Rocío Mencia Iriarte, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Francisco Tomboly, Director de Obra

Obra: Construcción del "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños" LPN Nº02/2017, Subasta a la Baja Electrónica – Tercer llamado ID Nº317.978

Fecha: 08 de marzo de 2022.

Referencia: Informe Avance de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Por el presente se remite el Informe referente al avance de las obras conforme al Contrato de Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 04 de febrero al 08 de marzo de 2022.

Informe Avance de Obras conforme al contrato
"Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Contrato N°:13/2017 - Secretaria Nacional de Cultura
Contratista: Empresa Constructora Barrail Hnos. S.A.
Fiscal de Obras: Ing. Roberto Vera Vierci
Dirección de Obras: Arq. Francisco Tomboly

Actualmente se están ejecutando tareas de ajustes de aberturas metálicas y de aluminio, ajustes y reparaciones de plomería en sanitarios públicos y en estanques de agua, reparaciones de aislaciones de techo en distintos sectores. Se trabaja en tareas de pinturas en general, limpieza de piso de piedra losa, ajustes de jardinería, pci electrónico e hidráulico. Estos son trabajos realizados por la Empresa Constructora Barrail Hnos. S. A. conforme al Contrato N°13/2017, llamado S.N.C. - L.P.N. Nº02/2017 "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños" – Tercer llamado – Subasta a la Baja Electrónica con ID N°317.978.

Avance de Obras, Desarrollo de Actividades

Se toma como fecha de cierre para la confección del presente informe la visita a la obra realizada por la Fiscalización y Dirección de Obra el día 08 de marzo del 2022.
Las tareas actualmente ejecutadas llevan a un porcentaje de avance:

- Tareas Preliminares: 100 %
- Demolición: 100 %
- Movimiento de Suelo: 100 %
- Fundaciones: 100 %
- Estructura Resistente: 100 %
- Mampostería y otros tabiques: 100 %
- Aislaciones: 100 %
- Revoques: 100 %
- Contrapisos Varios: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Zócalos: 100%
- Cielorrasos: 100 %

www.tomboly... ... +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 3127 Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040082

- Revestimiento: 100 %
- Carpintería y Herrerías Varias: 100 %
- Pintura: 100 %
- Artefactos Sanitarios: 100 %
- Mesada de granito: 100%
- Varios: 100%
- Instalación de desagüe cloacal: 100 %
- Instalación de agua corriente: 100 %
- Fitodepuración de aguas: 100 %
- Instalación de desagüe pluvial: 100 %
- Instalación eléctrica: 100 %
- Señales Débiles: 100 %
- Transformador: 100 %
- Prevención contra incendio: 100%
- Acondicionamiento térmico: 100 %
- Trabajo para reparación de estructura: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°3:

Se contemplan los siguientes trabajos: relleno para parquización con material sobrante de obra y relleno con material orgánico. Cortes de juntas de dilatación en piso de piedra losa tipo rompecabeza y colocación de junta. Ejecución de piso de hormigón lavado. Mamposterías varias de 15 y 30 y muro del auditorio de isopanel con revoques. Provisión y colocación de membrana plástica protectora y drenante tipo mcdrain. Tratamiento de revestido de la mampostería panderete. Provisión y colocación de posapiés de barandas y de nichos de mármol con placas conmemorativas y ángulos de fijación.

- Movimiento de suelo: 100 %
- Mampostería y otros tabiques: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Aislaciones: 100 %
- Carpinterías y herrerías varias: 100 %
- Pintura: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°5:

Se contemplan los siguientes trabajos estructurales: tensores en cruz en Galería, estructura de H°A° para Ágora, estructura de H°A° para mueble del Ágora, estructura de H°A° para Lucernarios. Refuerzo estructural del Ágora: apuntalamiento de losas y vigas existentes para demolición y refuerzos estructurales. Estructura de H°A° en losas y vigas. Refuerzos estructurales en Plaza de las Sombras: pilotes, cabezales y pilares metálicos. Carpetas y pisos: colocación de resina sintética en pisos de hormigón, regularización de losa de H°A y carpeta para alfombra del auditorio. Piso tipo deck de hormigón para terraza C.D.A sobre mampostería. Carpinterías y herrerías varias. Anexos de instalaciones de desagüe cloacal, instalación de agua corriente, instalación de desagüe pluvial, instalación eléctrica. Escenario del auditorio, mueble de cocina y kitchenette. Mueble del ágora. Fosa del ascensor. Tapas de cierre y terminación de mampostería para ascensor. Techo de protección de sistema de A.A. Muro de cantero de piedra bruta, planchuela metálica con nombre de víctimas, cierre de piso del C.D.A con estructura metálica y vidrio. Gárgolas metálicas de caño 100x100 para desagüe pluvial en techo Galería. Huella y contrahuella de granito verde ubatuba para escalera de hormigón. Mamparas de baño granito verde ubatuba.

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

- Estructura resistente: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Carpinterías y herrerías varias: 100 %
- Instalación de desagüe cloacal: 100 %
- Instalación de agua corriente: 100 %
- Instalación de desagüe pluvial: 100 %
- Instalación eléctrica: 100 %
- Varios: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°10:

Adenda que contempla los trabajos de demoliciones de elementos que aparecen bajo vereda, descubiertas al ejecutar tareas tales como vereda según proyecto o parquizaciones de los patios. Se contempla también la demolición y re ejecución del pavimento existente para el lugar del estacionamiento de la ambulancia, en el nivel correspondiente de calle, evitando así, el acceso y estacionamiento de vehículos particulares sobre la vereda. Membrana anti raíz, a partir de las recomendaciones de los especialistas para asegurar la duración prolongada de las aislaciones del cantero sobre la Plaza de las Luces, ya que las raíces de las plantas podrían dañarlas a mediano y largo plazo. Carpetas y pisos, ítem que prevé juntas en los pisos de piedras para facilitar la contracción y dilatación del material sin que aparezcan fisuras, piso de adoquín y cordones de vereda por trabajos de Essap, Ande y modificaciones en el desagüe pluvial, cortes adicionales en piso de adoquines, rampas de vereda en Av. Artigas y Av. Santísima Trinidad, rampa vehicular de H°A° en acceso al Estacionamiento, cordón depósito SUM (desagüe pluvial). Se contempla adicionar trabajos de Carpintería y Herrerías varias para los trabajos de puertas box de baños, readaptación del portón de estacionamiento por peso, puerta de salida de emergencia CDA y CDT, modificaciones en puerta del Espacio Ecuménico, portón pivotante acceso peatonal Artigas, escalera de varillas para puertas de emergencia, prefiltros para estanque central y estanques menores, ángulo metálico para junta de dilatación del Memorial, manijas de varillas para puertas del mueble del Ágora, protección metálica tipo babeta en pantalla de H°A° Auditorio, prolongaciones en rejas perimetrales, cielorraso de escalera de acceso al Hall del Auditorio y ducto del ascensor, barra de danza para equipamiento del SUM. Se adicionan también trabajos para los ítems zócalos, pinturas, trabajos varios, instalación de agua, fitodepuración, desagüe pluvial, instalación eléctrica y pci.

- Demoliciones: 100 %
- Aislaciones: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Carpinterías y Herrerías Varias: 100 %
- Zócalos: 100 %
- Pintura: 100 %
- Varios: 100 %
- Instalación de Agua: 100 %
- Fitodepuración: 100.00 %
- Desagüe pluvial: 100 %
- Instalación eléctrica: 100 %
- PCI: 100 %
- Avance Global: 100%

Adenda N°11:

Adenda que contempla los trabajos adicionales de instalación eléctrica surgidos con las puestas en marcha: provisión y colocación de cables T.P.R para cuatro bombas de 15HP y bomba depuradora del sistema de chorros de agua, tomas para

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621021
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 810-0040692

el escenario del Auditorio con llaves de 32 Amper, encendido de luces desde la Sala de Control del Auditorio, extensión eléctrica para la conexión de la caseta del guardia en el Sector Estacionamiento.

Incluye trabajos de instalación sanitaria: alimentación de canillas de Patio: trabajos de conexión de las cañerías desde la acometida de ESSAP para canillas de patio, válvula de retención 200 mm y llave de paso 75 mm en Estanque Central, adicional propuesto para el control del agua, evitando incidir en el nivel del tanque de PCI.

Se prevén trabajos de carpinterías y herrerías que contemplan la re ubicación de las rejas perimetrales hacia Santísima Trinidad, con el desmontaje de las rejas actuales para su reciclaje y reutilización, ejecución de dos portones nuevos, modificación de paños para completar la nueva altura y la colocación de los módulos, con caños 100x100 (fundados). Desmontaje de la Puerta acceso al Memorial y de la reja horizontal ubicada entre el cantero y el Memorial. Colocación de rejas varias en distintas ubicaciones. Colocación de una reja de protección del transformador: perimetral al transformador, con puerta de acceso y portacandado. Extensión de la baranda del Memorial, en el sector del puente de conexión con la Plaza de las Luces, para proteger el sitio de posibles accidentes. Pasamanos en rampas para favorecer el uso inclusivo del sitio. Manijones para puertas de acceso al Auditorio. Barral extra para baños de discapacitados: adicional propuesto para dar mejor respuesta al equipamiento inclusivo.

Incluye también la ejecución de la caseta del guardia en el acceso Vehicula, tipo contenedor de 20 pies de 2 ambientes con aislación térmica. Bordes de mármol de 5 cm en duchas en sanitarios. Equipamientos fijos que sostienen los basureros de clasificación de basura previstos en la licitación de Equipamiento y los bebederos públicos. Bicicleteros de varilla lisa plegada abulonada a piso.

Se contempla la realización de un revoque del muro lindero hacia Molas López y una pintura con impacril para dar mejor terminación y visualización del perímetro de la obra.

Se prevé también la reparación del hormigón al retirar rejas existentes, en caso de que queden roturas o cambios de color en el hormigón.

- Instalación eléctrica: 100 %
- Instalación sanitaria: 100 %
- Carpinterías y Herrerías Varias: 100 %
- Varios: 100 %
- Mampostería: 100 %
- Pintura: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°12:

Adenda que contempla los trabajos adicionales de modificación del sistema de PCI según las exigencias planteadas en la mesa de trabajo de la cual formó parte el departamento de prevención contra incendio de la Municipalidad de Asunción, la dirección y la fiscalización técnica de obra, la empresa Barrail Hnos y el proyectista encargado de la prevención contra incendios, el ing. Guido Duarte. A raíz de esto se llega a la modificación del proyecto presentado en esta adenda para la aprovación final de la Municipalidad para la habilitación del sitio.

- Red PCI: 100 %
- Soportería: 100 %
- Mano de obra: 100 %
- Avance Global: 100 %

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040682

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Semana de trabajo N°228 (06.02.2021 - 12.02.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: se realizan trabajos de ajustes del sistema de fitodepuración entre el estanque central y el tanque ubicado en la sala de máquinas. Cierre de registro luego de realizar los ajustes necesarios en las válvulas de retención. Continuan las tareas de ajustes del sistema de PCI Hidráulico.

- Ágora: sin notificación.

- Plaza de las Luces: ajustes y reparaciones en las rejas de cierre del memorial y la plaza de las luces.

- Techo Galería: sin notificación.

- Auditorio y sectores de servicio: continuan las de ajustes de plomería: reparación de válvulas de descarga y ajustes de canillas.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: se realizan tareas ajustes de instalación eléctrica y trabajos de pintura en varios sectores.

- Memorial: sin notificación.

Semana de trabajo N°229 (13.02.2022 - 19.02.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: continúan los trabajos de ajustes de las cañerías de PCI Hidráulico. Se realiza la carga de los estanques y la prueba del sistema de fitodepuración después de los ultimos trabajos de ajustes.

- Ágora: sin notificación

- Plaza de las Luces: se realizan tareas de limpieza del piso de piedra losa tipo rompecabezas.

- Techo Galería: se realizan trabajos de reparación de las aislaciones del techo.

- Auditorio y sectores de servicio: continuan las de ajustes de plomería: reparación de válvulas de descarga y ajustes de canillas.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: se realizan tareas de ajustes de puertas corredizas. Se realizan trabajos de reparación de aislación de techos.

- Memorial: avances en la colocación de señalizaciones de PCI Electrónico.

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040092

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Semana de trabajo N°230 (20.02.2022 - 26.02.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: avances en los trabajos de PCI Hidráulico. Trabajos de colocación de los equipamientos de hormigón en los lugares determinados por el plano de arquitectura.

- Ágora: sin notificación.

- Plaza de las Luces: sin notificación.

- Techo Galería: continúan las tareas de ajustes de la aislación de los techos.

- Auditorio y sectores de servicio: se realizan trabajos de ajuste de las aislaciones correspondientes a la dosa del ascensor. Colocación, reparaciñon y pintura faltante en la reja y bajanda del sector de escalera en el nivel de inicio.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: continúan las tareas de ajustes de la aislación de los techos.

- Memorial: continuan los trabajos de pintura y ajustes de barandas.

Semana de trabajo N°231 (27.02.2022 - 02.05.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: se realizan trabajos de ajustes del sistema de PCI Hidràulico y Electrónico. Trabajos de reparación de las aislaciones. Ajustes de pinturas varias, reparaciones de coqueras de los equipamientos de hormigón.

- Ágora: sin notificación.

- Plaza de las Luces: se realizan trabajos de reparación y ajuste del piso de piedra losa tipo rompecabeza, limpieza general y pintura de herrería en varios sectores.

- Techo Galería: sin notificación.

- Auditorio y sectores de servicio: sin notificación.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: se realizan trabajos de reparaciones varias, ajustes de herrerìas, ajustes de pintura en varios sectores.

- Memorial: sin notificación.

Se notifica la reunión en obra, realizada entre los representantes técnicos de la empresa constructora, la residente de obra, el fiscal y los directores técnicos para revisar el listado de faltantes para realizar la recepción finial presentado por los directores. Se realizan las indicaciones necesarias para culminar la obra en forma.

Es nuestro informe.

Arq. Francisco Tomboly

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040892

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

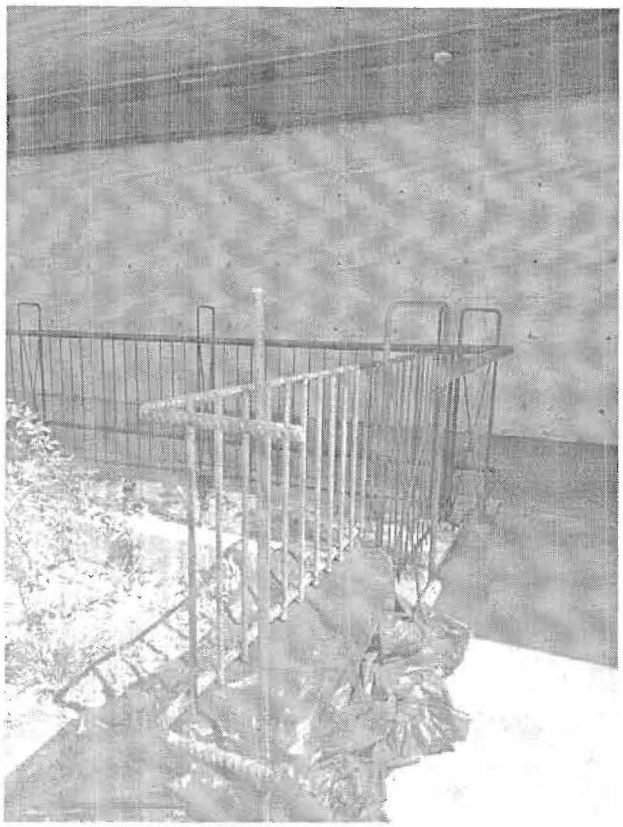

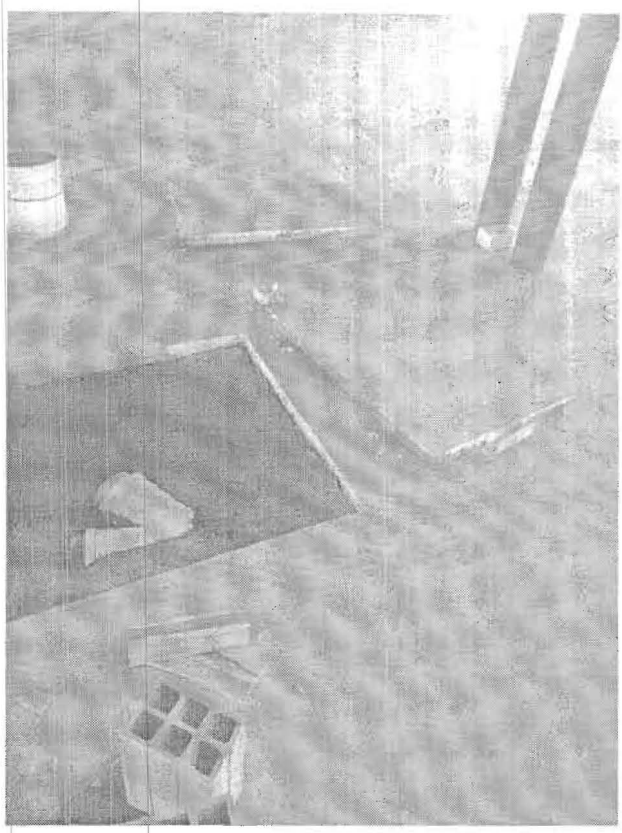

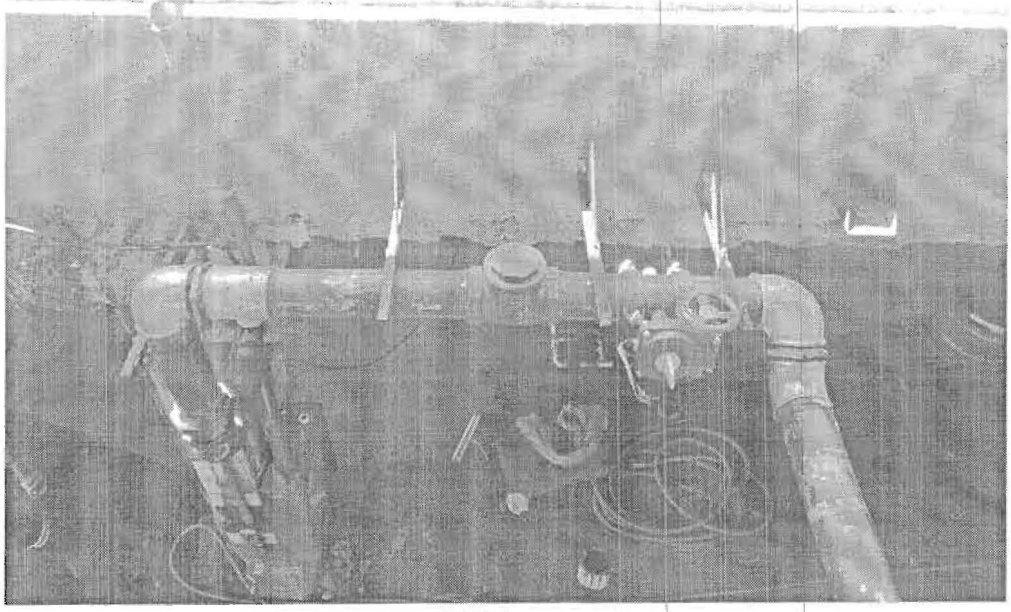

Semana 228

Foto 1: Arriba a la izquierda. Ajustes de la baranda del Memorial. Cierre de espacios indicados por la Dirección Técnica.

Foto 2: Arriba a la derecha. Cierre del registro de fitodepuración en relación al estanque central, luego del ajuste de las válvulas de retención.

Foto 3: Abajo. Ajustes de la cañería de PCI Hidráulico en la Plaza de las Sombras.

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040092

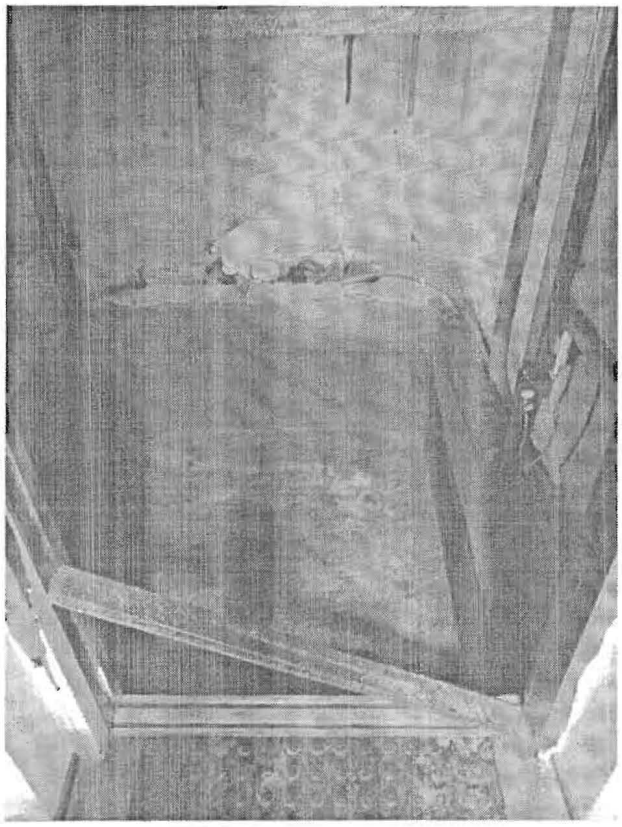

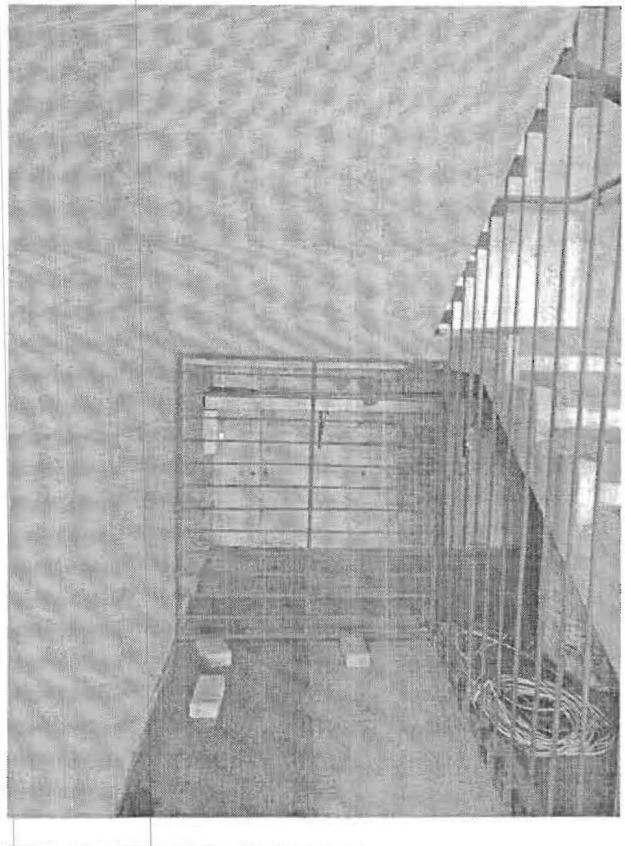

Semana 230

Foto 1: Arriba a la izquierda. Trabajos de reparación de la aislación de la fosa del ascensor..

Foto 2: Arriba a la derecha. Colocación de reja de cierre bajo la escalera de acceso al Auditorio, reparación y pintura.

Foto 3: Abajo. Trabajos de reparación de la aislación del Techo Galería.

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040092

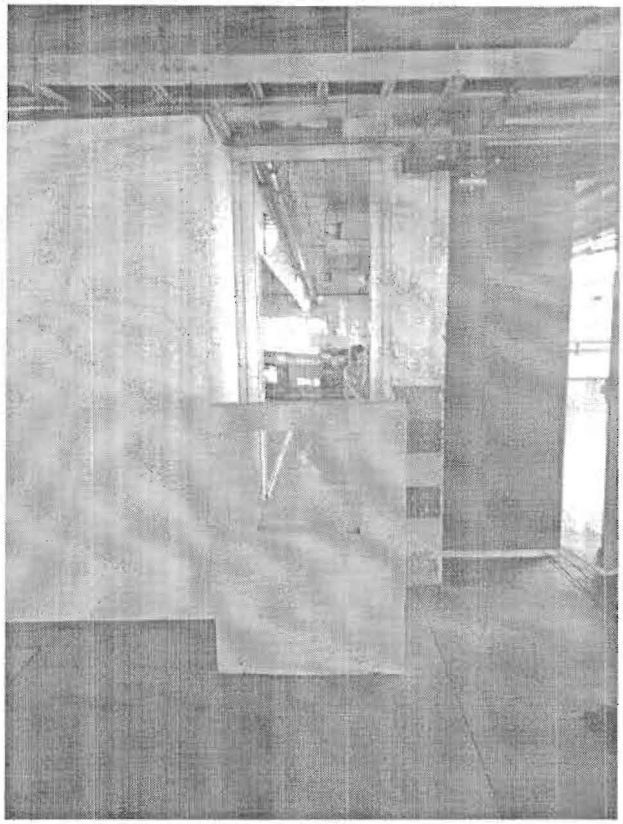

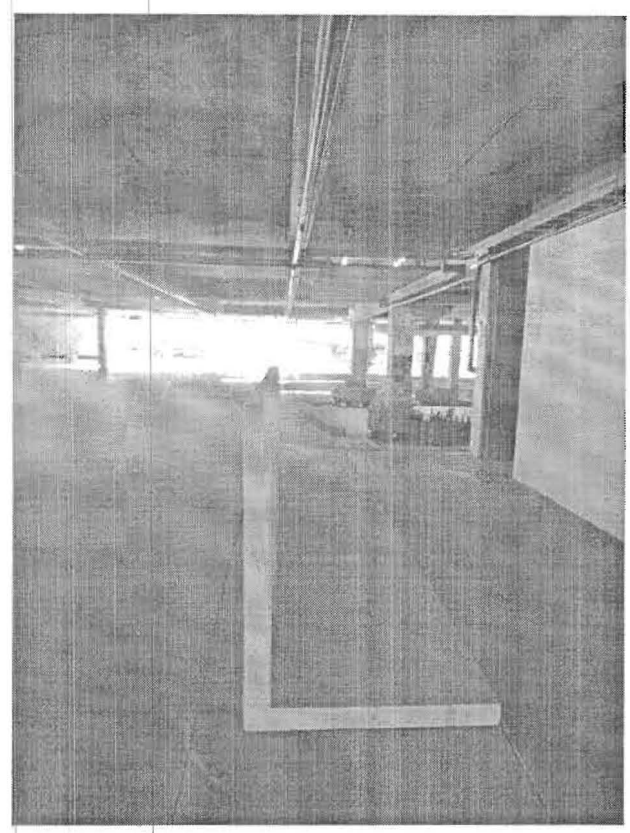

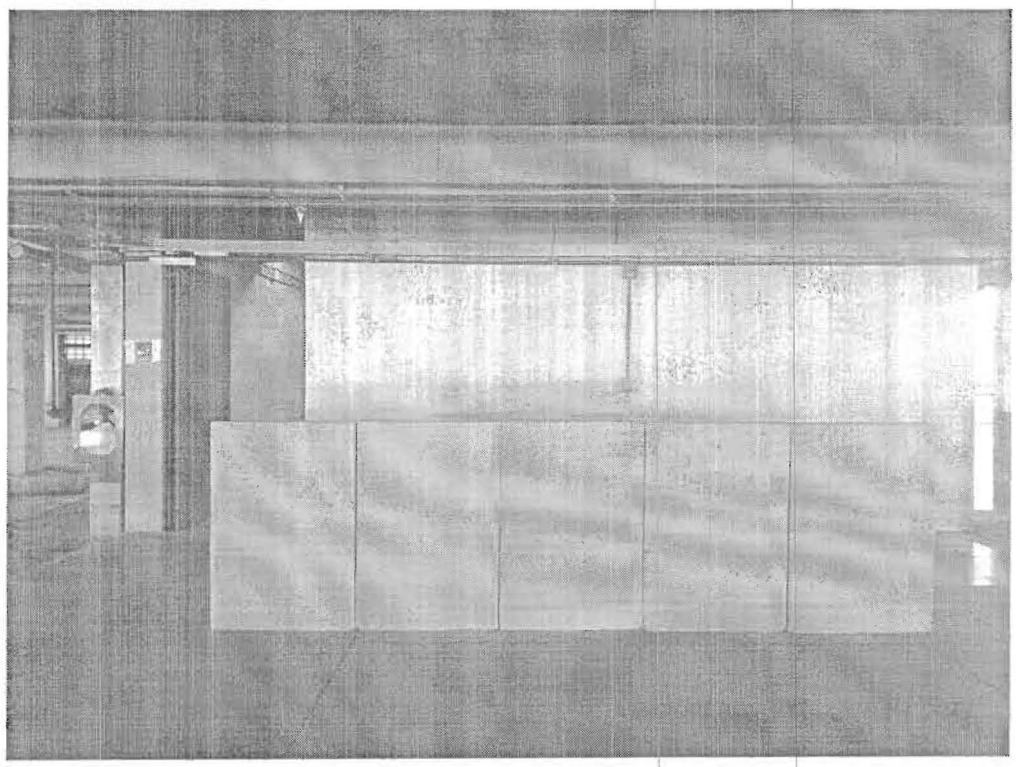

Semana 231

Foto 1, 2 y 3: colocación de los equipamientos de hormigón (porta basureros y porta bebederos) en los lugares determinados por los planos de arquitectura.

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

A: Lic. Rocío Mencia Iriarte, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Francisco Tomboly, Director de Obra
Ing. Roberto Vera Vierci, Fiscal de Obras

Obra: Equipamiento del "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Fecha: 08 de Febrero de 2022.

Referencia: Informe Avance de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Por el presente se remite el Informe referente al avance de las obras conforme al Contrato de Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 04 de febrero al 08 de marzo de 2022.

Informe Avance de Obras conforme al contrato
"Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Actualmente se ejecutan en obra coordinadamente las licitaciones correspondientes al equipamiento del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños. El estado de avance de cada licitación se detalla a continuación, en relación a las recepciones realizadas en el transcurso de este tiempo y los trabajos realizados en obra.

1. FILMAT: Licitación Publica Nacional N° 02/2019 "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.489.

Sin notificación.

2. ELECTROPAR S.A: Licitación Publica Nacional N° 02/2019 "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.489.

Sin notificación.

3. VEKTOR S.R.L: Licitación Publica Nacional N° 03/2019 "Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.490.

Sin notificación.

4. COMACO S.R.L: Licitación Publica Nacional N° 03/2019 "Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.490.

Sin notificación.

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 110-0040692

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

5. VIR: Licitación Publica Nacional N° 03/2019 "Acondicionamiento Acústico y electromecánico del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 371.423.

Sin notificación

6. ASTELEV ASCENSORES: Licitación Publica Nacional N° 09/2019 "Acondicionamiento Acústico y electromecánico del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 371.423.

Sin notificación

Es nuestro informe.

Arq. Francisco Tomboly

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

A: Lic. Rocío Mencia Iriarte, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Francisco Tomboly, Director de Obra
Ing. Roberto Vera Vierci, Fiscal de Obras

Obra: Equipamiento del "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Fecha: 08 de marzo de 2021.

Referencia: Informe Avance de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Por el presente se remite el Informe referente al avance de las obras conforme al Contrato de Obra "Adquisición de Mueble y Enseres de Oficina para el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura" correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 04 de febrero al 08 de marzo de 2021.

Informe Avance de Obras conforme al contrato
"Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

La actual licitación adjudicada se conforma de cinco lotes a continuación detallados:

- Lote N°1: Muebles: recepción de
- Lote N°2: Cortinas Antisolares
- Lote N°3: Enseres
- Lote N°4: Basureros
- Lote N°5: Escalera

En el transcurso del mes se realizaron los ajustes necesarios para la recepción correcta, en cumplimiento con las especificaciones técnicas indicadas en la licitación adjudicada. Ubicación de los muebles en los lugares indicados por el plano de arquitectura.

Es nuestro informe.

Arq. Francisco Tomboly
Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040892

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

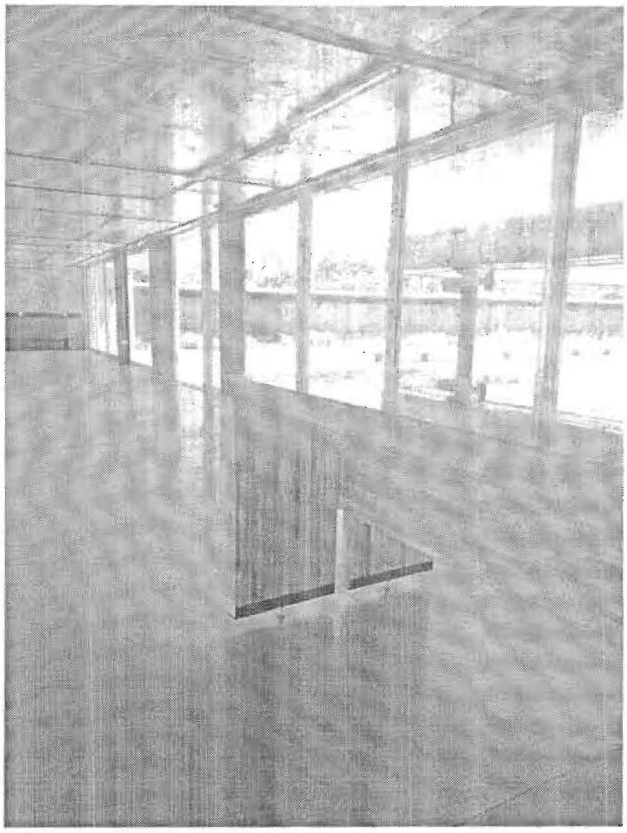

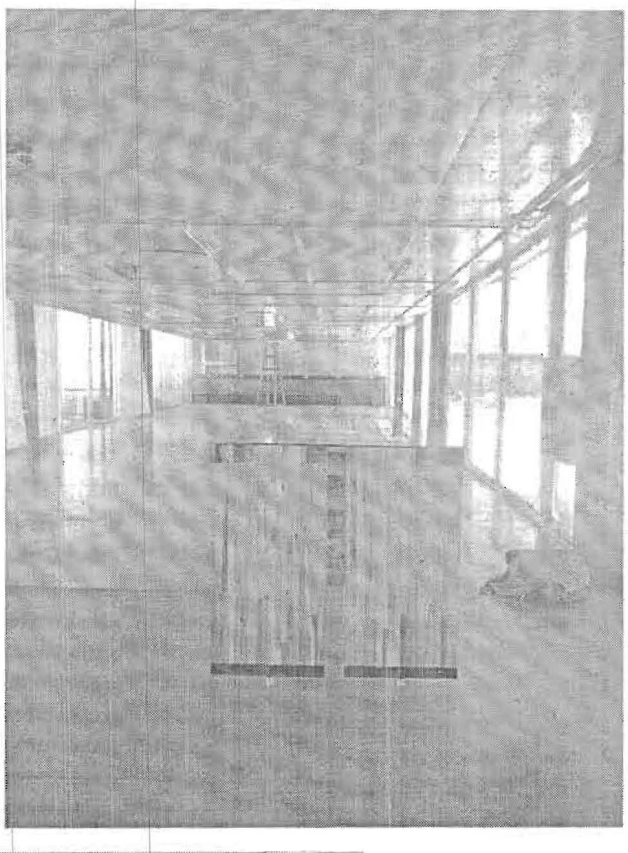

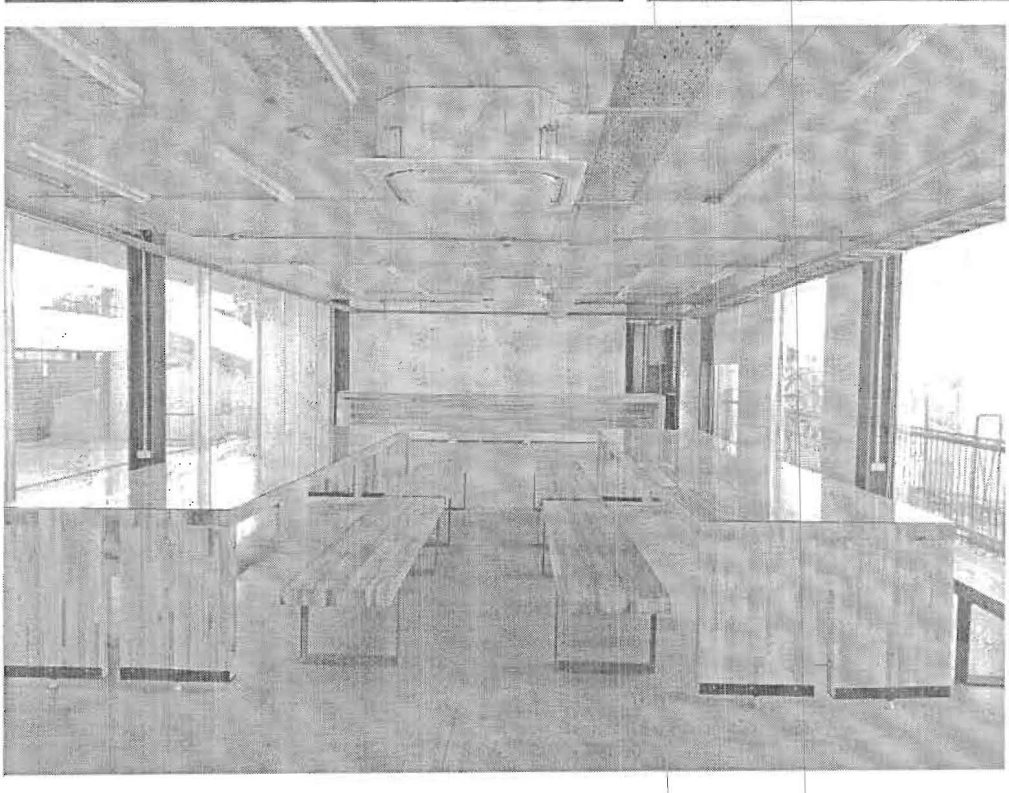

Colocación de los muebles recepcionados en los lugares indicados por la planta de arquitectura.

www.tomboly carisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040092

Lote 4165372732 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270130494890

FECHA 08/03/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	1165913	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	TOMBOLY GIANOTTI FRANCISCO ANTONIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 07/04/2022

NÚMERO DE CONTROL : 84780809

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271116591384780809

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040892
