Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CORONEL OVIEDO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°07/2023 ID Nº 430.363

DISTRITO BENEFICIARIO:

CORONEL OVIEDO – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CNEL. OVIEDO - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 07/2023 ID Nº 430.432.-

FECHA:

01 DE JUNIO DE 2023

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 16/05/2023 con un plazo de ejecución de 120 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **SERVICIOS GOLD**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio Azucena - Fracción Torales**	100%	0%	100%
2	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	100%	0%	100%
5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
6	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	100%	0%	100%
8	Limpieza Final	100%	0%	100%
9	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio Boquerón**	0%	0%	0%
10	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
12	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	0%	0%	0%
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
14	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
16	Limpieza Final	0%	0%	0%
17	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio Calle Hovy**	0%	0%	0%
18	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
20	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	0%	0%	0%
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
22	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
24	Limpieza Final	0%	0%	0%
25	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio Kaygua Kokue**	100%	0%	100%
26	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
27	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
28	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	100%	0%	100%
29	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
30	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

31	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	100%	0%	100%
32	Limpieza Final	100%	0%	100%
33	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio Potrerito**	100%	0%	100%
34	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
35	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
36	Baden cuneta de H° A° 1,50e=10cm	0%	0%	0%
37	Muro de piedra ancho 30cm altura variable	0%	0%	0%
38	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	0%	0%	0%
39	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
40	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
41	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
42	Limpieza Final	0%	0%	0%
43	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio San Blas**	0%	0%	0%
44	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
45	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
46	Cordón cuneta de 60 cm	0%	0%	0%
47	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	0%	0%	0%
48	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
49	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
50	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
51	Limpieza Final	0%	0%	0%
52	**Cartel de Obra 1.80 x 2.00 - Barrio San Luis**	100%	0%	100%
53	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
54	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
55	Baden cuneta de H° A° 1,50e=10cm	100%	0%	100%
56	Cordón de H° de 50cm x 30cm x10cm	100%	0%	100%
57	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
58	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
59	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	100%	0%	100%
60	Limpieza Final	100%	0%	100%

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

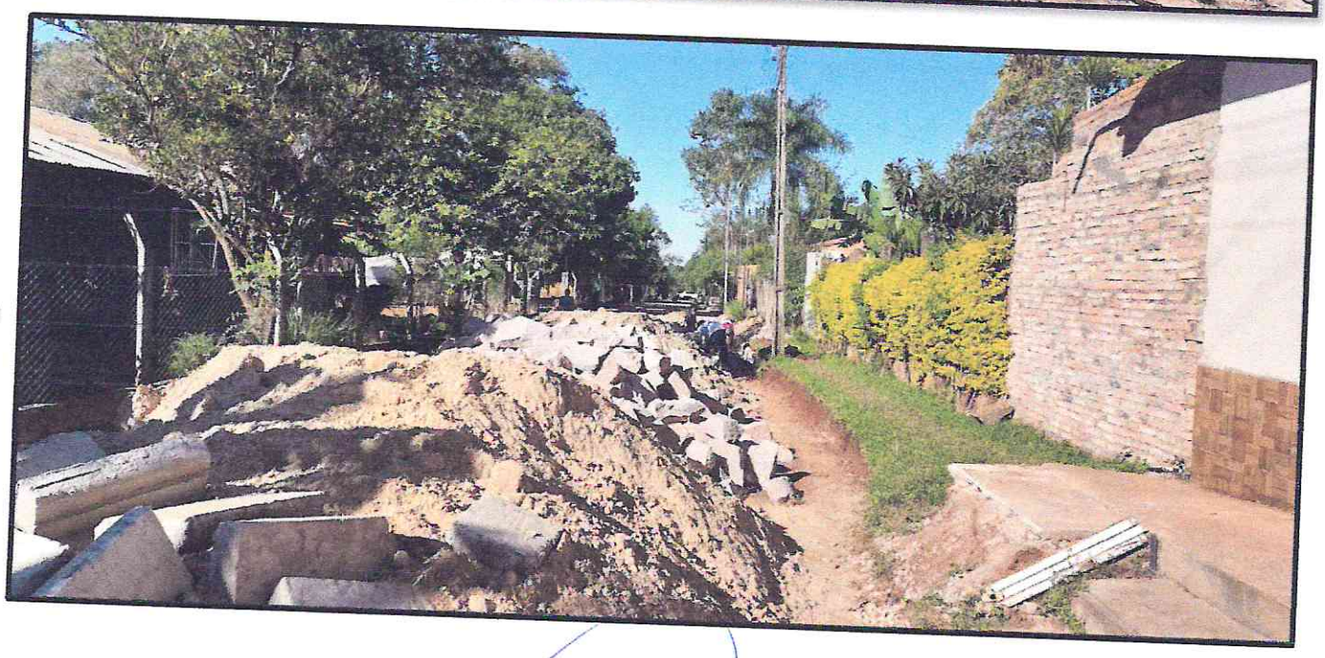

Arq. Víctor Mendieta
Secretario Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación
Dto. de Caaguazú
