SAN PABLO
Metalúrgica - Construcciones

Encarnación, 04 de octubre del 2023

Señor:
Intendente Municipal de Encarnación
ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Presente

Oferente: *San Pablo Metalúrgica – Construcciones.-*
Convocante: *Municipalidad de Encarnación.-*
Modalidad: *Licitación Concurso de Oferta Nº 07/2023.-*
Id del Llamado Nº: *421.631.-*
Nombre del Llamado: *Obras de Infraestructura en Diversas Instituciones Educativas*

Tengo el Agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar la aceptación y aprobación del Certificado de Obra N° 6 con relación al Contrato Nº 11/2023" **Obras de Infraestructura en Diversas Instituciones Educativas " Lote N° 1 – Construcción de 4 aulas en la Escuela Básica N° 572 "John F. Kennedy".-**

Acompaña la presente solicitud los siguientes documentos.-.

1.- Acta de Medición N° 6.-
2.- Certificado de Obra N° 6 / 2023.-
3.- Factura correspondiente al Certificado de Obra.-
4.- Certificado de Cumplimiento Tributario.-
5.- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.-
6.- Imágenes Fotográficas

Sin Otro particular y en espera de una respuesta favorable le saludo muy atentamente.

San Pablo Metalúrgica - Construcciones"
Miguel A. Golasik
Representante Legal

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

Escaneado con CamScanner

ACTA DE MEDICION

OBRA: C.O. N° 11/2023 " Obras de Infraestructura en Diversas Instituciones Educativas con ID: 421.631.-

CONTRATISTA: Miguel Ángel Golasik – San Pablo Metalúrgica Construcciones

En el Distrito de Encarnación, Departamento de Itapuá, República del Paraguay, a los 3 días del mes de Octubre de 2023, se reúnen en representación de la Municipalidad de Encarnación, el Arq. Venancio Zarate Director de Fonacide, como Fiscal de Obra y el Sr Miguel Ángel Golasik como representante legal de San Pablo Metalúrgica – Construcciones empresa contratista de la "**Obras de Infraestructura en Diversas Instituciones Educativas.-**

Suscriben el presente Acta los representante arriba mencionados, los mismo han procedidos a la verificación de los trabajos ejecutados. En la Verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla de Certificación Obra N° 6 /2023.-

De plena conformidad de las partes, se suscriben el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

Miguel A. Golasik
Representante Legal
San Pablo Metalúrgica – Construcciones

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Fiscal de Obra
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 6

OBRA: *OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CIUDAD DE ENCARNACION*

CONTRATACION DIRECTA N°: 11 / 2023 — ***PERIODO:*** 05 / 2023

ID N°: 421.631 — ***MONTO DEL CONTRATO:*** 530.000.000 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	% Acumulada Anterior	% Ejecutado en el periodo	Acumulada Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Certificado Obra N° 6	530.000.000	55,33%	11,53%	66,86%	293.222.702	61.115.132	354.337.834
					ESTE CERTIFICADO	61.115.132	

RESUMEN

	Monto del Contrato	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
A) Deduciones de anticipo	106.000.000	58.644.540	12.223.026	70.867.567
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				12.223.026
MONTO DE CERTIFICADO				48.892.106
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	26.500.000	14.661.135	3.055.757	17.716.892
MONTO DE FACTURA				***45.836.350***
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				17.716.892

Miguel Angel Golasik B.
San Pablo Metalúrgica y Construcciones
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE

Escaneado con CamScanner

Contratista: Miguel Angel Golasik B. - San Pablo Metalurgica - Construcciones

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CIUDAD DE ENCARNACION ID. Nº: 421.631

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
Lote Nº 1 - Construcción de 4 aulas en la Escuela Básica Nº 572 "John F. Kennedy"														
1	Construccion de Cerco perimetral (a-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera)	Unidad	1,00	606.630	606.630	1,00	0,00	1,00	606.630	0	606.630	100%	0%	100%
2	Cartel metalico con soporte (b-Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.)	Unidad	1,00	1.110.000	1.110.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
3	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (a-Provisión y Colocación de techo de chapa trapezoidal color rojo N° 26, conforme a especificaciones técnicas y planilla de cómputo métrico)	Metros cuadrados	329,00	203.000	66.787.000	295,00	34,00	329,00	59.885.000	6.902.000	66.787.000	90%	10%	100%
4	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos (Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm, con caño negro estructural de 40x40mm. (aulas, galerías y escalera))	Metros cuadrados	271,00	70.000	18.970.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
5	Servicio de instalacion de chapa (c- Cenefa o Babetas de chapa Nº26 desarrollo 100 cm)	Metro lineal	20,00	78.500	1.570.000	0,00	20,00	20,00	0	1.570.000	1.570.000	0%	100%	100%
6	Pilar (a-Pilares de Hormigón Armado)	Metros cúbicos	4,50	1.950.000	8.775.000	4,50	0,00	4,50	8.775.000	0	8.775.000	100%	0%	100%
7	Colocacion de hormigon armado (b- Vigas de Hormigón Armado (20x40) en escalera)	Metros cúbicos	0,50	1.985.000	992.500	0,50	0,00	0,50	992.500	0	992.500	100%	0%	100%
8	Colocacion de hormigon armado (c- Encadenado de Hormigón Armado 20x30)	Metros cúbicos	9,00	2.100.000	18.900.000	9,00	0,00	9,00	18.900.000	0	18.900.000	100%	0%	100%
9	Escalera (d- Escalera de HºAº)	Metros cúbicos	3,30	2.050.000	6.765.000	3,30	0,00	3,30	6.765.000	0	6.765.000	100%	0%	100%
10	Construccion de losa (e- Losas sobre puertas)	Metros cúbicos	0,50	2.050.000	1.025.000	1,00	0,00	1,00	1.025.000	0	1.025.000	100%	0%	100%
11	Mamposteria (a- De 0,15 visto a una cara de Lad. Común prensado.)	Metros cuadrados	327,00	107.380	35.113.260	327,00	0,00	327,00	35.113.260	0	35.113.260	100%	0%	100%
12	Servicio de trabajos en hierro estructural (b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32,00	17.500	560.000	32,00	0,00	32,00	560.000	0	560.000	100%	0%	100%
13	Servicio de trabajos en hierro estructural (c- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.)	Metro lineal	230,00	6.350	1.460.500	230,00	0,00	230,00	1.460.500	0	1.460.500	100%	0%	100%
14	Revoques (a- De pilares y vigas de Hormigón Armado a tres capas con hidrófugo.)	Metros cuadrados	61,33	78.520	4.815.632	0,00	61,33	61,33	0	4.815.632	4.815.632	0%	100%	100%
15	Revoques (b- A tres capas y filtrado para interiores)	Metros cuadrados	385,00	77.000	29.645.000	285,00	100,00	385,00	21.945.000	7.700.000	29.645.000	74%	26%	100%

Dr. Venancio Zárate
Director de Catastro
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

16	Revoques (c- A tres capas y filtrado para cielorraso con cerecitas (Losa acceso)	Metros cuadrados	5,00	81.100	405.500	0,00	5,00	5,00	0	405.500	405.500	0%	100%	100%
17	Revoque de pared (e- Revoque impermeable en Paredes Exteriores: azotada 1:3+hidrofugo esp: 0,5cm, a 2 capas (Grueso+Filtrado o fino)	Metros cuadrados	120,00	77.500	9.300.000	0,00	84,00	84,00	0	6.510.000	6.510.000	0%	70%	70%
18	Colocacion de pisos - contrapisos (a- Piso cerámico antideslizante 0,40x0,40m (en aula, galería y escalera).con nivelación, color gris o marrón.)	Metros cuadrados	288,00	132.500	38.160.000	0,00	200,00	200,00	0	26.500.000	26.500.000	0%	69%	69%
19	Instalacion o colocacion de zocalo (a- Zócalo cerámico 0,10x0,30 color gris o marrón)	Metro lineal	160,00	23.500	3.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
20	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas (a- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,30 x 2,10 (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa tipo o similar doble paleta) Ver detalle de abertura.)	Unidad	4,00	925.000	3.700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
21	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Ventana corrediza de 1.50mts x 1.20mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 8 mm incoloro.)	Unidad	16,00	1.725.000	27.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
22	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad (Baranda metálica en galería (reja) con caño circular de 50 ø pasamano, 40x40 de bajo y caño circular 7/8 cada 10 cm. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. La fiscalización dará el detalle const.)	Metros cuadrados	44,20	235.000	10.387.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
23	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad (Baranda metálica en escalera con caño circular de 50 ø pasamano. Pintado con antióxido y pintura sintética color negro. Ver detalle.)	Metro lineal	12,00	182.500	2.190.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
24	Alfeizar o antepecho (Alfeizar de ventana)	Metro lineal	70,00	11.300	791.000	0,00	70,00	70,00	0	791.000	791.000	0%	100%	100%
25	Servicio de pintura de exteriores (a-Impermeabilizante, resistente a los factores climáticos, en pared exterior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme)	Metros cuadrados	120,00	30.000	3.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
26	Servicio de pintura de exteriores (b- Pintura Impermeables, tres manos, color cerámico, sobre ladrillo a la vista, exterior, lijado, limpiado con pintura impermeable)	Metros cuadrados	118,00	21.000	2.478.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
27	Servicio de pintura de interiores (c-Impermeable , en pared interior c/enduido color blanco hasta lograr una superficie bien uniforme)	Metros cuadrados	385,00	30.000	11.550.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
28	Servicio de pintura (d- Vigas y pilares impermeable,sellador + 2 manos.)	Metros cuadrados	61,33	30.200	1.852.166	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
29	Servicio de pintura (e- Puerta y marco metálicas con antióxido y sintético, pintura de color gris oscuro.)	Metros cuadrados	25,00	25.850	646.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Arq. Venancio Zárate
Director Rehacido
Municipalidad de Encarnación
FONACIDE

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

30	Servicio de pintura (f- Canaleta de Bajadas horizontal y vertical con antioxido, sintético de color gris oscuro.)	Metro lineal	151,00	17.250	2.604.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
31	Servicio de pintura (g- De barandas metálicas con antióxido.)	Metros cuadrados	14,00	44.500	623.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
32	Servicio de colocacion de canaletas (a- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 0,65 m. Soportes con grampas de planchuela 5/8"x3/16" (cada 1,5 m.) soldado en uniones de las canaletas y en su desarrolo total.)	Metro lineal	151,00	60.000	9.060.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
33	Construccion e instalaciones electricas (a- Provisión e instalación de alimentación con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal (Incluye ducto PVC, caño electroducto, terminales de cobre, llave TM trifasica,otros)	Metro lineal	30,00	84.000	2.520.000	15,00	15,00	30,00	1.260.000	1.260.000	2.520.000	50%	50%	100%
34	Construccion e instalaciones electricas (b- Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano))	Unidad Medida Global	1,00	2.550.000	2.550.000	0,50	0,50	1,00	1.275.000	1.275.000	2.550.000	50%	50%	100%
35	Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. conforme a E.E.T.T y cómputo mètrico)	Unidad	4,00	340.000	1.360.000	3,00	1,00	4,00	1.020.000	340.000	1.360.000	75%	25%	100%
36	Construccion e instalaciones electricas (d- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	35,00	98.000	3.430.000	20,00	15,00	35,00	1.960.000	1.470.000	3.430.000	57%	43%	100%
37	Construccion e instalaciones electricas (e- Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm, e27 (incluye lampara led 40W 6500k)	Unidad	36,00	266.000	9.576.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
38	Construccion e instalaciones electricas (f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	12,00	147.500	1.770.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
39	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (g- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metálica, aleta de 56 pulgadas (Incluye sistema de soporte con caño metálico hasta altura correspondiente)	Unidad	16,00	597.500	9.560.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
40	Construccion e instalaciones electricas (h- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)	Unidad	16,00	98.500	1.576.000	0,00	16,00	16,00	0	1.576.000	1.576.000	0%	100%	100%
41	Instalacion de aire acondicionado (i- Provisión e Instalación de equipo Aire acondicionado 18.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial)	Unidad	4,00	3.780.000	15.120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación
FONACIDE

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

42	Instalacion de sistema de seguridad (Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha.)	Unidad Medida Global	1,00	3.350.000	3.350.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
43	Instalacion de sistema de seguridad (Cámara Minl de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video.)	Unidad	8,00	232.500	1.860.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
44	Pizarra acrilica sin pedestal (a- Pizarrones de tipo acrílico. Medidas: 1,25 x 3,00m y 0,90 m de antepecho. Con borde de aluminio y porta borrador y pincel)	Unidad	4,00	750.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
45	Limpieza de obra (limpieza final)	Global	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
Lote Nº 2 - Reparación de Sanitarios y otros en el Colegio Nacional República Argentina														
1	Preparacion de obra (a- Limpieza y preparación del terreno)	Metros cuadrados	50,00	5.250	262.500	50,00	0,00	50,00	262.500	0	262.500	100%	0%	100%
2	Construccion de Cerco perimetral (b-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera, letrero señalización adecuada de hombres trabajando prohibido pasar.)	Unidad Medida Global	1,00	497.500	497.500	1,00	0,00	1,00	497.500	0	497.500	100%	0%	100%
3	Cartel metalico con soporte (c- Cartel de Obra 2 x 1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.)	Unidad Medida Global	1,00	975.000	975.000	1,00	0,00	1,00	975.000	0	975.000	100%	0%	100%
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	37,60	4.870	183.112	37,60	0,00	37,60	183.112	0	183.112	100%	0%	100%
5	Servicio de Excavación Estructural (Excavación y carga de cimiento con PBC.)	Metros cúbicos	10,00	280.000	2.800.000	10,00	0,00	10,00	2.800.000	0	2.800.000	100%	0%	100%
6	Servicio de Excavación Estructural (a- Excavación para contrafuertes)	Metros cúbicos	5,00	58.500	292.500	5,00	0,00	5,00	292.500	0	292.500	100%	0%	100%
7	Colocacion de hormigon armado (b- Viga de H° A° 20x50 refuerzo tipo U envolvente)	Metros cúbicos	1,00	2.097.500	2.097.500	1,00	0,00	1,00	2.097.500	0	2.097.500	100%	0%	100%
8	Pilar (c- Pilar de H° A° (0,25x0,20m) trapezoidal tipo contrafuerte)	Metros cúbicos	1,00	2.035.000	2.035.000	1,00	0,00	1,00	2.035.000	0	2.035.000	100%	0%	100%
9	Colocacion de hormigon armado (d- Zapata de H° A° (0,60x0,60m)	Metros cúbicos	1,50	2.035.000	3.052.500	1,50	0,00	1,50	3.052.500	0	3.052.500	100%	0%	100%
10	Servicio de trabajos en hierro estructural (e- Envarillado y reparación de fisuras en pared exitente)	Metro lineal	20,00	51.420	1.028.400	20,00	0,00	20,00	1.028.400	0	1.028.400	100%	0%	100%
11	Reparación de techo (a- Retiro con recuperación de tejas existentes)	Metros cuadrados	50,00	20.000	1.000.000	50,00	0,00	50,00	1.000.000	0	1.000.000	100%	0%	100%

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

FONACIDE

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

12	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (b-Techo de chapa zinc trapezoidal 20 % pend. (Color rojo cerámico)y membrana Asfaltica 3 mm o similar, bajo chapa, s/tejuelones y estructura existente (incluye alfajias para clavadores de chapa.)	Metros cuadrados	50,00	175.000	8.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
13	Reparación de techo (c-Reparacion de techo sector encuentro de techo y mampostería en bloque principal Planta Alta, terminación en pintura, colocación de vidrio tipo balancín, reparación en techo con membrana o silicona donde exista filtraciones.)	Unidad	1,00	1.485.000	1.485.000	1,00	0,00	1,00	1.485.000	0	1.485.000	100%	0%	100%
14	Servicio de instalacion de chapa (d- Cenefa de chapa Nro. 26 desarrollo 0.55 cm pintado color cerámico)	Metro lineal	12,00	65.000	780.000	12,00	0,00	12,00	780.000	0	780.000	100%	0%	100%
15	Revoques (a- Revoques impermeable de paredes interior y exterior a 2 capas impermeable)	Metros cuadrados	30,00	55.000	1.650.000	30,00	0,00	30,00	1.650.000	0	1.650.000	100%	0%	100%
16	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de H° de cascotes)	Metros cuadrados	10,00	34.500	345.000	10,00	0,00	10,00	345.000	0	345.000	100%	0%	100%
17	Colocacion de pisos - contrapisos a- Piso Cerámico de alta Resistencia 0,40x0,40 m color a definir con la fiscalización.)	Metros cuadrados	40,00	88.000	3.520.000	40,00	0,00	40,00	3.520.000	0	3.520.000	100%	0%	100%
18	Instalacion o colocacion de zocalo (a- Colocación de zócalo cerámico.)	Metro lineal	50,00	47.750	2.387.500	50,00	0,00	50,00	2.387.500	0	2.387.500	100%	0%	100%
19	Servicio de pintura (a- Pintura de paredes al látex interior - exterior.)	Metros cuadrados	80,00	34.000	2.720.000	80,00	0,00	80,00	2.720.000	0	2.720.000	100%	0%	100%
20	Servicio de pintura de aberturas (b- Pintura de aberturas de madera con barniz oscuro)	Metros cuadrados	30,00	28.500	855.000	20,00	0,00	20,00	570.000	0	570.000	67%	0%	67%
21	Servicio de pintura de exteriores (c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico, base agua con resina acrilica (Premium).	Metros cuadrados	48,00	40.000	1.920.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
22	Servicio de pintura (d- Pintura de maderamen y tejuelones con barniz)	Metros cuadrados	40,00	28.000	1.120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
23	Servicio de pintura de interiores (e- de fachada interior y en aulas interior, losa y paredes. La fiscalización elegirá los colores)	Metros cuadrados	1.168,00	19.250	22.484.000	1.168,00	0,00	1.168,00	22.484.000	0	22.484.000	100%	0%	100%
24	Servicio de colocacion de canaletas (a- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,55 m. Colocado con grampas de planchuela 5/8"x 3/16" c/80 cm. o tijera de por medio)	Metro lineal	8,20	71.500	586.300	8,20	0,00	8,20	586.300	0	586.300	100%	0%	100%
25	Servicio de instalacion de chapa (b- Provisión y Colocación de bajada de chapa galv. Nº 24 (des. 40 cm). Con grampas de planchuela 5/8"x3/16" c/2.00 m.)	Metro lineal	7,00	72.000	504.000	7,00	0,00	7,00	504.000	0	504.000	100%	0%	100%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN FONACIDE

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

26	Construccion e instalaciones electricas (a- Provisión e instalación de Tablero metal embutido con barra RST+N+T de 36TM (Incluye llaves termomagneticas, terminales, cableado multifilar, rotulo)	Unidad Medida Global	1,00	3.400.000	3.400.000	1,00	0,00	1,00	3.400.000	0	3.400.000	100%	0%	100%
27	Construccion e instalaciones electricas (b- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x35mm2 hasta el tablero principal (Incluye conector dentado, morsa de retención)	Metro lineal	65,00	43.000	2.795.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
28	Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de tablero plastico externo de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye llaves termomagneticas según esquema unifilar)	Unidad	1,00	2.345.000	2.345.000	1,00	0,00	1,00	2.345.000	0	2.345.000	100%	0%	100%
29	Construccion e instalaciones electricas (d- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (Conforme a E.E.T.T y computo metrico)	Unidad	6,00	430.000	2.580.000	6,00	0,00	6,00	2.580.000	0	2.580.000	100%	0%	100%
30	Construccion e instalaciones electricas (e- Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 30cm e27 con lampara de 50W luz fria (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto)	Unidad	30,00	323.500	9.705.000	30,00	0,00	30,00	9.705.000	0	9.705.000	100%	0%	100%
31	Construccion e instalaciones electricas (f- Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16W (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocelula)	Unidad	9,00	190.000	1.710.000	9,00	0,00	9,00	1.710.000	0	1.710.000	100%	0%	100%
32	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo (g- Provisión e instalación de equipo ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades (Incluye sistema de soporte)	Unidad	8,00	650.000	5.200.000	8,00	0,00	8,00	5.200.000	0	5.200.000	100%	0%	100%
33	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y puntos de iluminación (incluye ducto pvc gris 25mm, soporte plastico, curvas pvc, caja externa,cableado multifilar, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	20,00	134.500	2.690.000	20,00	0,00	20,00	2.690.000	0	2.690.000	100%	0%	100%
34	Construccion e instalaciones electricas (h- Provisión e instalación de ducto pvc 25mm gris, Incluye caja de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa pvc)	Metro lineal	75,00	31.500	2.362.500	75,00	0,00	75,00	2.362.500	0	2.362.500	100%	0%	100%
35	Instalacion de aire acondicionado (j- Provisión e Instalación de equipo Aire acondicionado 18.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial)	Unidad	6,00	4.000.000	24.000.000	6,00	0,00	6,00	24.000.000	0	24.000.000	100%	0%	100%
36	Instalacion de aire acondicionado (k- Provisión e Instalación de equipo Aire acondicionado 12.000BTU (Incluye desague con caño pvc embutido hasta el desague pluvial)	Unidad	1,00	2.450.000	2.450.000	1,00	0,00	1,00	2.450.000	0	2.450.000	100%	0%	100%

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN FONACIDE

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

37	Instalacion de sistema de seguridad (Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha)	Unidad Medida Global	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	0,00	1,00	3.500.000	0	3.500.000	100%	0%	100%
38	Instalacion de sistema de seguridad (Cámara Mini de 1080P. Caja de conexión, Conector P4, Conector Video.)	Unidad	8,00	230.000	1.840.000	8,00	0,00	8,00	1.840.000	0	1.840.000	100%	0%	100%
39	Inodoros	Unidad	6,00	290.000	1.740.000	6,00	0,00	6,00	1.740.000	0	1.740.000	100%	0%	100%
40	Cisterna de inodoro para baño (b- Cisterna para inodoros)	Unidad	6,00	70.000	420.000	6,00	0,00	6,00	420.000	0	420.000	100%	0%	100%
41	Grifo o canilla (c- Grifería para lavatorios a pulsador)	Unidad	6,00	300.000	1.800.000	6,00	0,00	6,00	1.800.000	0	1.800.000	100%	0%	100%
42	Pulsador a boton (d- Pulsador para mingitorios)	Unidad	3,00	365.000	1.095.000	3,00	0,00	3,00	1.095.000	0	1.095.000	100%	0%	100%
43	Mingitorio de pared y Accesorios (e- Mingitorios)	Unidad	3,00	370.000	1.110.000	3,00	0,00	3,00	1.110.000	0	1.110.000	100%	0%	100%
44	Tapa para inodoro (f- Tapa y asiento p/Inodoro MDF con parachoques de goma)	Unidad	6,00	80.000	480.000	6,00	0,00	6,00	480.000	0	480.000	100%	0%	100%
45	Enchufe interrno de inodoro (g- Flexible metálico cromado 40)	Unidad	6,00	75.000	450.000	6,00	0,00	6,00	450.000	0	450.000	100%	0%	100%
46	Separador de granito (h- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75).	Unidad	3,00	250.000	750.000	3,00	0,00	3,00	750.000	0	750.000	100%	0%	100%
47	Montaje / Desmontaje de pileta (i- Cambio de pileta existente por lavatorio de granito natural con bacha de acero inoxidable(3) griferia fv tipo canilla 3 - 1,60x0,50.)	Unidad	1,00	1.985.000	1.985.000	1,00	0,00	1,00	1.985.000	0	1.985.000	100%	0%	100%
48	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Reparación y pintura de las puertas de boxes con pasadores plano de 51 mm)	Unidad	5,00	155.000	775.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
49	Espejos (Espejo 1,50x0,8)	Unidad	2,00	270.000	540.000	2,00	0,00	2,00	540.000	0	540.000	100%	0%	100%
50	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS (Alimentaciòn de agua cte)	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	0,00	1,00	1.200.000	0	1.200.000	100%	0%	100%
51	Construccion de desague cloacal (Desague cloacal)	Unidad	1,00	2.450.000	2.450.000	1,00	0,00	1,00	2.450.000	0	2.450.000	100%	0%	100%
52	Mantenimiento y Reparacion de Pozo ciego (Desagote de pozo)	Unidad	1,00	800.000	800.000	1,00	0,00	1,00	800.000	0	800.000	100%	0%	100%
53	Construccion e instalaciones electricas (a- Provisión e instalación de cable cable multifilar 2x4mm2 (incluye caño electroducto pvc 25mm, curva, soporte plastico, caja externa 100x100mm con tapa)	Metro lineal	30,00	29.650	889.500	30,00	0,00	30,00	889.500	0	889.500	100%	0%	100%
54	Construccion e instalaciones electricas (b- Provisión e instalación de tablero plastico embutido de 2 TM (Incluye llaves tm)	Unidad Medida Global	1,00	264.000	264.000	1,00	0,00	1,00	264.000	0	264.000	100%	0%	100%
55	Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (Incluye ducto pvc gris 25mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	3,00	100.000	300.000	3,00	0,00	3,00	300.000	0	300.000	100%	0%	100%

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

56	Construccion e instalaciones electricas (d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fria incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo)	Unidad	6,00	148.000	888.000	6,00	0,00	6,00	888.000	0	888.000	100%	0%	100%
57	Construccion e instalaciones electricas (h- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales (Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros)	Unidad Medida Global	1,00	500.000	500.000	1,00	0,00	1,00	500.000	0	500.000	100%	0%	100%
58	Limpieza de obra (Limpieza final)	Unidad Medida Global	1,00	980.000	980.000	1,00	0,00	1,00	980.000	0	980.000	100%	0%	100%
	Construccion de Cerco perimetral (b-Vallado Perimetral: cinta de Precaución postes de madera, letrero señalización adecuada de hombres trabajando prohibido pasar.)	Unidad Medida Global	1,60	497.500	796.000	1,60	0,00	1,60	796.000	0	796.000	100%	0%	100%
	Servicio de Excavación Estructural (a- Excavación para contrafuertes)	Metros cúbicos	2,50	58.500	146.250	2,50	0,00	2,50	146.250	0	146.250	100%	0%	100%
	Colocacion de hormigon armado (b- Viga de H° A° 20x50 refuerzo tipo U envolvente)	Metros cúbicos	1,40	2.097.500	2.936.500	1,40	0,00	1,40	2.936.500	0	2.936.500	100%	0%	100%
	Pilar (c- Pilar de H° A° (0,25x0,20m) trapezoidal tipo contrafuerte)	Metros cúbicos	4,25	2.035.000	8.648.750	4,25	0,00	4,25	8.648.750	0	8.648.750	100%	0%	100%
	Colocacion de hormigon armado (d- Zapata de H° A° (0,60x0,60m)	Metros cúbicos	0,83	2.035.000	1.683.500	0,83	0,00	0,83	1.689.050	0	1.689.050	100%	0%	100%
	Reparación de techo (a- Retiro con recuperación de tejas existentes)	Metros cuadrados	20,00	20.000	400.000	20,00	0,00	20,00	400.000	0	400.000	100%	0%	100%
	Construccion e instalaciones electricas (c- Provisión e instalación de tablero plastico externo de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye llaves termomagneticas según esquema unifilar)	Unidad	0,20	2.345.000	469.000	0,20	0,00	0,20	469.000	0	469.000	100%	0%	100%
	Construccion e Instalaciones electricas (d- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 18.000BTU. (Conforme a E.E.T.T y computo metrico)	Unidad	1,00	430.000	430.000	1,00	0,00	1,00	430.000	0	430.000	100%	0%	100%
	Espejos (Espejo 1,50x0,8)	Unidad	0,50	270.000	135.000	0,50	0,00	0,50	135.000	0	135.000	100%	0%	100%
Precio Total					**530.000.000**	**MONTO BRUTO**			**61.115.132**		**354.337.834**	**55,33%**	**11,53%**	**66,86%**

Descuento 20% Anticipo	**12.223.026**
Descuento 5% Retencion Fondo Reparo	**3.055.757**
Monto Neto a Cobrar	***45.836.349***

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Miguel Angel Golasik B.
San Pablo Metalúrgica y Construcciones
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

FOTOGRAFIAS

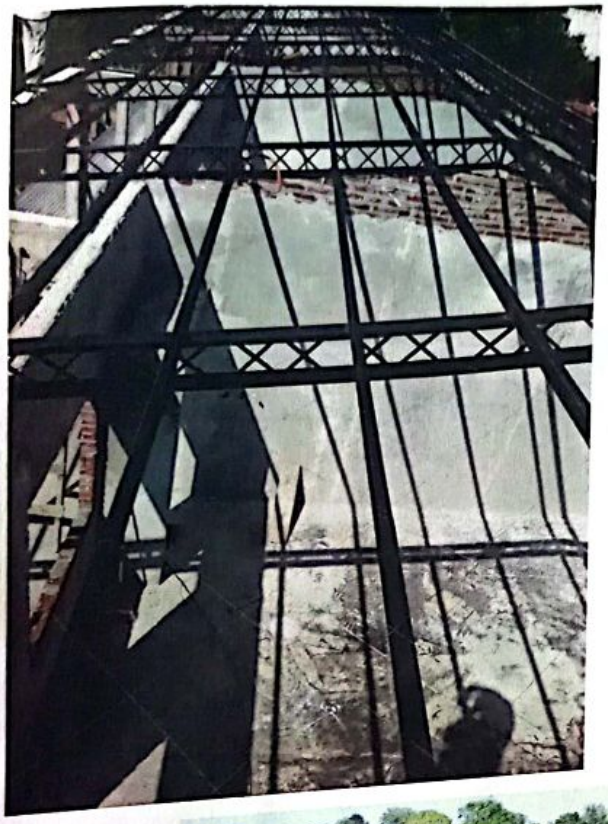

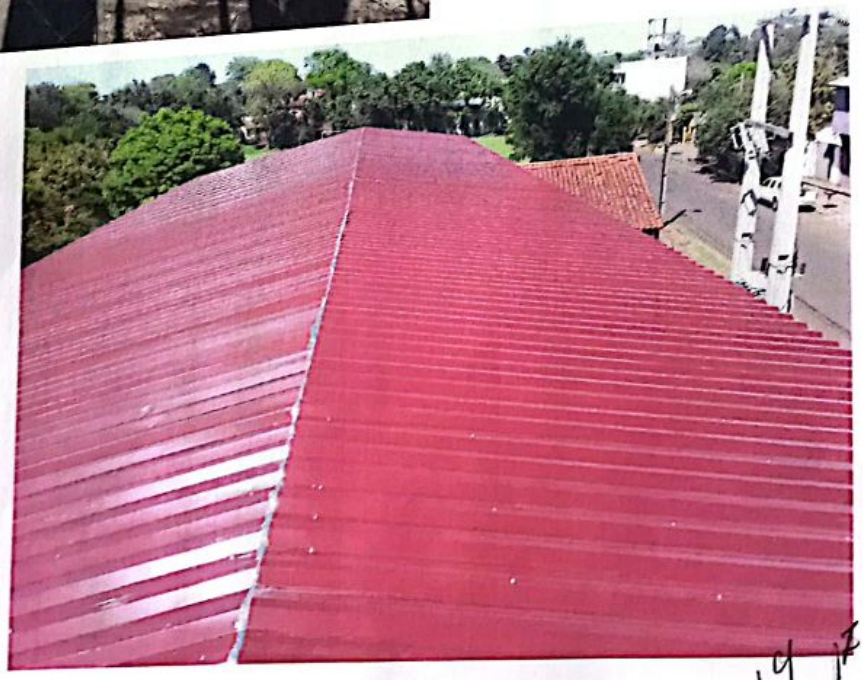

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Golasik
RUC 184-5

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

Escaneado con CamScanner

SAN PABLO

Metalúrgica - Construcciones

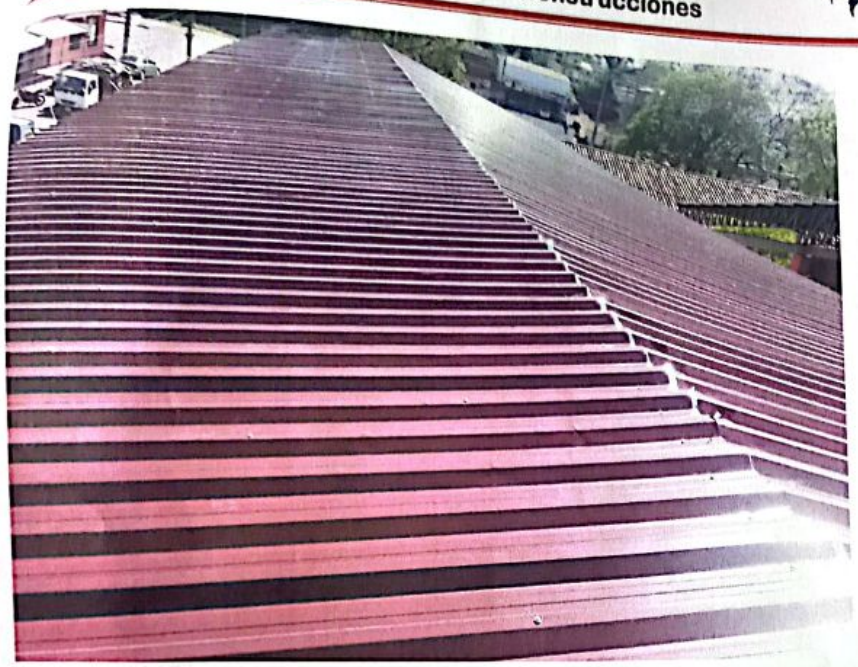

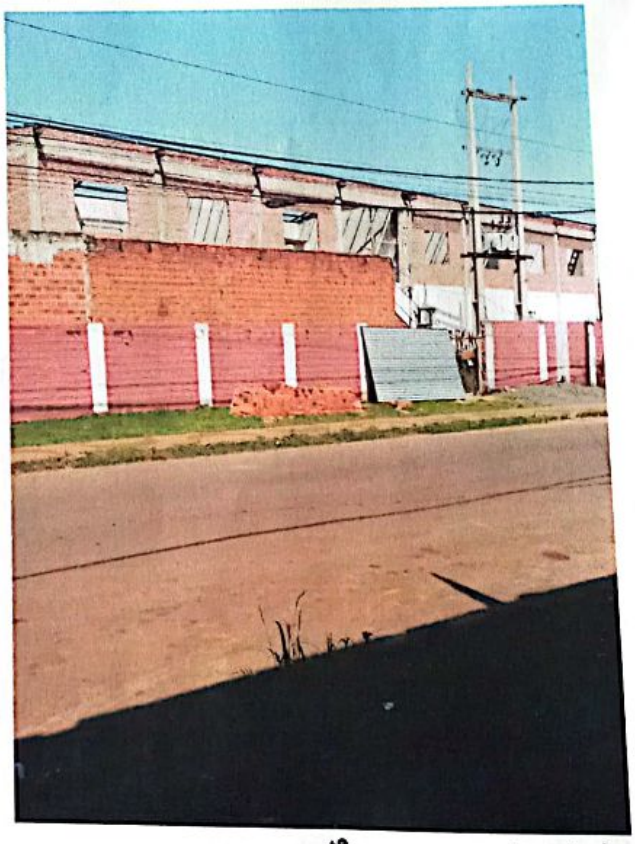

Arq. Venancio Zárate
Director Fiscalizador
Municipalidad de Encarnación

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

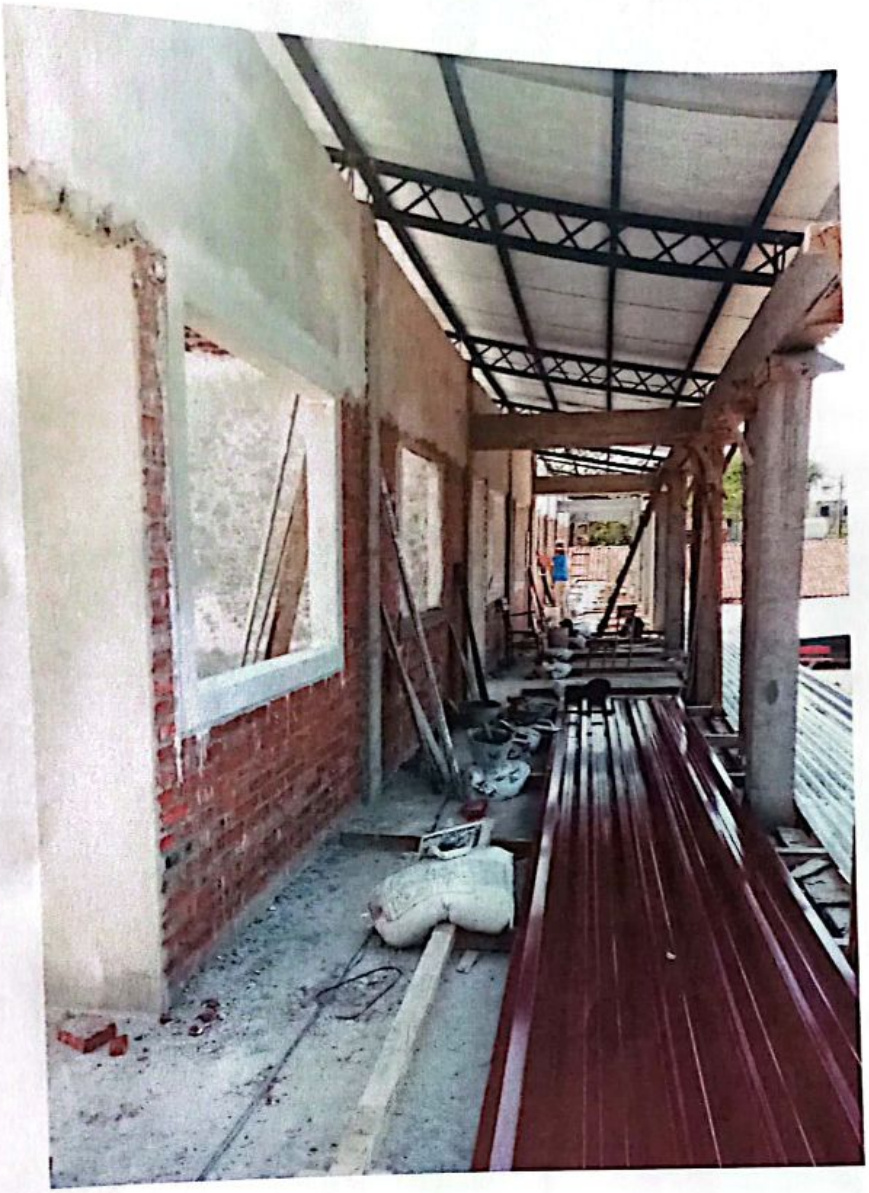

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.985.184-5

Escaneado con CamScanner
