DICTAMEN DEL ADMINISTRADOR

FECHA: 10/02/2025

ANTECEDENTES

- Contrato N.º 116/2024 de fecha 02/12/2024.
- Circular GPL/LOGISTICA N° 05/2025 de fecha 06/02/2025.

MARCO NORMATIVO

- Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas"
- Decreto N° 2264/24 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 7021 del 9 de diciembre de 2022".
- Resolución DNCP N° 230/25 "Por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 7021/22 - De Suministro y Contrataciones Públicas"
- Resolución N.°13, Acta N.º 24 de fecha 30/05/2022 «Norma Reglamentaria – Lineamientos para los procesos de contrataciones públicas del Banco Central del Paraguay».

CONSIDERACIONES

Por Resolución Resolución N° 2 Acta N° 55 de fecha 14/11/2024 se ha adjudicado a la firma TSV DEL PARAGUAY S.R.L. la LPN N° 35/24 para la "Adquisición de Equipos para Inspección y Detección de Explosivos en Vehículos y Equipos de Rayos X - ID: 443.942" por lo cual se suscribió, entre ambas partes, el Contrato N° 116/2024 de fecha 02/12/2024.

El plazo de vigencia del contrato será desde la suscripción de este hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. El plazo de entrega para la adquisición e instalación de los equipos es de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la suscripción del contrato, es decir hasta el 31/05/2025.

Víctor Portillo
Jefe
División de Operaciones

En fecha 07/02/25 mediante correo electrónico el Proveedor TSV del Paraguay S.R.L., propone un cronograma de trabajos (pretendiendo comenzar los trabajos el 08/02/25), detallando el tiempo de clausura estimado para el portón N°4, sector donde se instalará el escáner bajo vehículo que atañe a los trabajos contratados.

Por otra parte, conforme a la Circular GPL/LOGISTICA N° 05/2025 de fecha 06/02/2025, se ha indicado que el portón N°1 se encontrará clausurado desde 12/02/25 hasta el 09/05/25, debido a trabajos impostergables de cañerías que se deben realizar.

A continuación, el correo del Proveedor proponiendo el cronograma:

Victor Daniel Portillo Galvan

De: Cesar Lenguaza <cesar.lenguaza@tsv.com.py>
Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2025 09:23
Para: Victor Daniel Portillo Galvan
CC: Gustavo Verdun; Julio Torres Gonzalez; José Alfonso
Asunto: Cronograma de ejecución LPN 35/2024
Datos adjuntos: Cronograma_BCP_UVSS_35_2024.pdf

Buenos días,

Adjunto remito el cronograma de actividades solicitado en el Lote N°1: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X correspondiente al contrato 35/2024, de conformidad a lo requerido en la Sección: Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas – CPS, del Pliego de Bases y Condiciones.

Cualquier consulta o duda me encuentro a las órdenes.

TSV
Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay

Cesar Lenguaza
Coordinador de Servicios
cesar.lenguaza@tsv.com.py
+595 (974) 191271

Victor Portillo
Jefe
División de Operaciones

Cronograma.

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1	Inicio de proyecto: Firma d...	0 days	2/12/24 08:00 AM	2/12/24 08:00 AM
2	Planeacion	115 days	2/12/24 08:00 AM	10/05/25 05:00 PM
3	Importación de equipos	160 days	2/12/24 08:00 AM	10/05/25 05:00 PM
4	Relevamiento para obra ...	20 days	2/12/24 08:00 AM	27/12/24 05:00 PM
5	Ejecución	72 days	8/02/25 08:00 AM	20/05/25 05:00 PM
6	Adecuación de obras civiles	20 days	8/02/25 08:00 AM	7/03/25 05:00 PM
7	Instalación de UNSS	7 days	11/05/25 08:00 AM	20/05/25 05:00 PM
8	Instalacion de camara A...	7 days	11/05/25 08:00 AM	20/05/25 05:00 PM
9	Instalación de Estación d...	7 days	11/05/25 08:00 AM	20/05/25 05:00 PM
10	Equipos Implementados	0 days	20/05/25 05:00 PM	20/05/25 05:00 PM
11	Cierre	4 days	21/05/25 08:00 AM	26/05/25 05:00 PM
12	Fiscalización	3 days	21/05/25 08:00 AM	23/05/25 05:00 PM
13	Elaboración y Firma de A...	1 day	26/05/25 08:00 AM	26/05/25 05:00 PM
14	Entrega de Nota de Rem...	1 day	26/05/25 08:00 AM	26/05/25 05:00 PM
15	Entrega de Informe Téc...	1 day	26/05/25 08:00 AM	26/05/25 05:00 PM
16	Fin del Proyecto	0 days	26/05/25 05:00 PM	26/05/25 05:00 PM

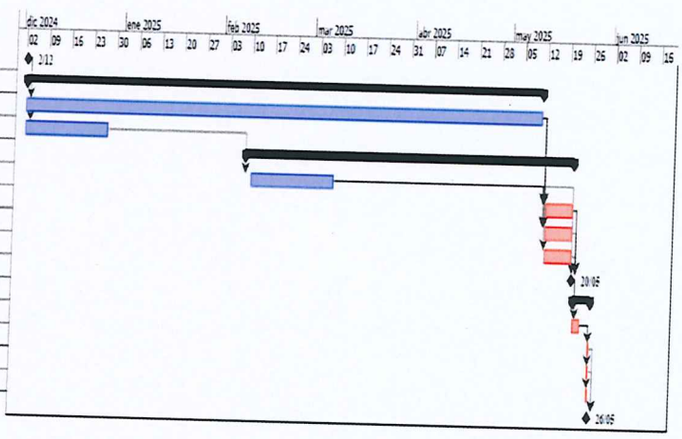

Asimismo, se copia la Circular GPL/LOGISTICA N° 05/2025:

Víctor Portillo
Jefe
División de Operaciones

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

Asunción, 06 de febrero de 2025

CIRCULAR GPL/LOGISTICA N° 05/2025

AVISO DE TRABAJOS DE CAMBIO DE CAÑERÍA CLOACAL COLAPSADA EN LA ZONA EXTERIOR DEL ACCESO FUNCIONARIOS

Se comunica a todos los funcionarios del Banco Central del Paraguay, que a partir del **12 de febrero y hasta el 09 de mayo de 2025,** se estarán realizando trabajos de cambio de una cañería cloacal colapsada en la zona exterior del acceso de funcionarios. La circulación en la zona se verá restringida por estos trabajos.

- La circulación vehicular por el portón 1, zona del acceso funcionarios, estará inhabilitada, se podrá utilizar como alternativa el portón 4.

- El acceso peatonal de funcionarios se encontrará clausurado. Como alternativa será habilitado el acceso sur del SS1, tanto para ingreso como para salida. Se recuerda que es obligatorio pasar por el reloj marcador para las marcaciones, así como por el puesto de seguridad para control de maletas, termos y equipos.

Viviana María Samudio Cáceres
Firmado digitalmente por Viviana María Samudio Cáceres
Fecha: 2025.02.06 08:40:29 -03'00'

VIVIANA SAMUDIO
Encargada de Despacho
Departamento de Logística

ADOLFO ALFONSO VILLALBA
Firmado digitalmente por ADOLFO ALFONSO VILLALBA
Fecha: 2025.02.07 09:46:31 -03'00'

ADOLFO ALFONSO
Encargado de Despacho
Gerencia de Patrimonio y Logística

Preser *rar con*

Víctor Portillo
Jefe
División de Operaciones

En atención a que ambos portones son los dos accesos vehiculares principales a la Institución, que a su vez son contiguos, que no es viable clausurar ambos portones a la vez y que los trabajos en el portón N° 1 son impostergables, procedimos a notificar vía correo electrónico a la contratista de la imposibilidad de comenzar los trabajos en la fecha propuesta.

Ya que el tiempo de clausura del Portón N° 1 será de 87(ochenta y siete) días, desde 12/02/25 al 09/05/25, es por esto que comunicamos al Proveedor la imposibilidad de comenzar los trabajos en la fecha propuesta (08/02/25) los cuales implicarían la clausura del portón 4 y considerando que la diferencia de días entre la fecha propuesta de inicio de los trabajos y la fecha de culminación de los trabajos en el portón N°1 es de 90 (noventa) días, este plazo es el que será considerado para desplazar la fecha límite para la entrega de los trabajos contratados.

Comunicación al proveedor de la imposibilidad de comenzar los trabajos:

Víctor Portillo
Jefe

Victor Daniel Portillo Galvan

De: Victor Daniel Portillo Galvan
Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2025 13:31
Para: 'Cesar Lenguaza'
CC: Gustavo Verdun; Julio Torres Gonzalez; 'José Alfonso'
Asunto: RE: Cronograma de ejecución LPN 35/2024

Buenas Tardes Cesar.

El día de hoy nos comunicaron que el Portón 1 estará clausurado desde la próxima semana, por unos trabajos de emergencia impostergables de desagüe cloacal, al ser tanto el portón 1 como el número 4 los únicos accesos vehiculares sobre Federación Rusa habilitados para el funcionariado y visitas, será imposible clausurar ambos portones a la vez, por lo que indefectiblemente deberemos esperar a que los trabajos del portón 1 culminen para empezar nuestra implementación en el portón 4.

Se presentan los siguientes escenarios:

- Mejor escenario: Las obras del Portón 1 culminan en 45 días calendarios, por lo podríamos comenzar los trabajos el 24/03/2025.
- Peor escenario: Las obras del Portón 1 culminan en 90 días calendarios, por lo podríamos comenzar los trabajos el 08/05/2025.

En cualquiera de los dos casos, **este tiempo de retraso** al inicio de los trabajos (el cual proyectaron para el 08/02/2025) **no será atribuible al contratista** (TSV del Paraguay) ya que se debe a un evento de fuerza mayor (obras civiles de desagüe cloacal).

Ni bien las obras del Portón 1 estén culminando les daremos aviso para coordinar el inicio de los trabajos contratados para el Portón 4.

Saludos.

VICTOR DANIEL
PORTILLO GALVÁN

Departamento de Seguridad
División Operaciones

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Sub Suelo 1 Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 619 - 2181

CONCLUSION

Considerando, los factores de fuerza mayor no imputables al Proveedor que imposibilitaron el cumplimiento pactado originalmente en el Contrato N° 116/24, como área administradora del contrato, se procede a conceder al Proveedor TSV PARAGUAY S.R.L., un desplazamiento del

Victor Portillo
Jefe
División de Operaciones

plazo de la ejecución contractual por la cantidad de 90 (noventa) días calendario para la culminación de los trabajos, siendo así la nueva fecha límite para la entrega e instalación de los equipos el **29/08/2025.**

Atentamente,

Víctor Portillo
Jefe
División de Operaciones

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

El presente dictamen con la recepción del Proveedor es suficientemente válido como notificación al mismo.

RECIBIDO POR

Firma: .....

Aclaración de Firma: José Alfonso

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0
