GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre 2023/Enero 2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097	100%	184.153.529	0,00%	0	28,24%	52.012.277	28,24%	52.012.277
A	**Total por Contrato**	**100%**	**184.153.529**	**0,00%**	**0**	**28,24%**	**52.012.277**	**28,24%**	**52.012.277**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	36.830.706	0	10.402.455	10.402.455
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**36.830.706**	**0**	**10.402.455**	**10.402.455**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				41.609.822	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**41.609.822**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre 2023/Enero 2024**
Contrato N°:	**80/23**
Monto Básico:	**184.153.529**
Contratista:	**Arq. Fabio López**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 días**
Fecha de terminación prevista:	**17-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Cuarenta y un millones seiscientos nueve mil ochocientos veintidos.-

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

3(tres)

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre 2023/Enero 2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097			
CONTRATISTA:	Arq. Fabio López	FECHA DE INICIO:	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	184.153.529	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	17-mar-24
CONTRATO N°:	80/23	PRÓRROGA:	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación	Metro lineal	400	7.629	3.051.600	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,017	0,017	0,00	400,00	400,00	0	3.051.600	3.051.600
2	Cartel de Obra (200x1.50)	Unidad Medida Global	1	1.000.277	1.000.277	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	1,00	1,00	0	1.000.277	1.000.277
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad Medida Global	1	3.465.300	3.465.300	0,019	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,019	0,019	0,00	1,00	1,00	0	3.465.300	3.465.300
4	Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-"	Metros cuadrados	2.800	7.847	21.971.600	0,119	0,00%	28,57%	28,57%	-	0,034	0,034	0,00	800,00	800,00	0	6.277.600	6.277.600
5	Colocacion de hormigon armado - "CORDON CUNETA de hormigon elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. "	Metro lineal	800	75.950	60.760.000	0,330	0,00%	37,50%	37,50%	-	0,124	0,124	0,00	300,00	300,00	0	22.785.000	22.785.000
6	Colocacion de hormigon armado - CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metros cúbicos	2,56	990.450	2.535.552	0,014	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesror minimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.800	30.865	86.422.000	0,469	0,00%	17,86%	17,86%	-	0,084	0,084	0,00	500,00	500,00	0	15.432.500	15.432.500
8	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	3.200	1.546	4.947.200	0,027	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					**184.153.529**	**100%**				**0,00%**	**28,24%**	**28,24%**				**0**	**52.012.277**	**52.012.277**

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Spinzi
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre 2023/Enero 2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097

CONTRATISTA:	Arq. Fabio López	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	184.153.529	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	80/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
						DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
1	Replanteo y marcación	Metro lineal	400	7.629	3.051.600	3.051.600						1,66%
2	Cartel de Obra (200x1.50)	Unidad Medida Global	1	1.000.277	1.000.277	1.000.277						0,54%
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad Medida Global	1	3.465.300	3.465.300	3.465.300						1,88%
4	Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-"	Metros cuadrados	2.800	7.847	21.971.600	2.700.000	3.000.000	12.761.600	3.510.000			11,93%
5	Colocacion de hormigon armado - "CORDON CUNETA de hormigon elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. "	Metro lineal	800	75.950	60.760.000	8.500.000	12.600.000	24.310.000	15.350.000			32,99%
6	Colocacion de hormigon armado - CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metros cúbicos	2,56	990.450	2.535.552			2.535.552				1,38%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesror minimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.800	30.865	86.422.000	5.120.000	9.460.000	48.597.000	23.245.000			46,93%
8	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	3.200	1.546	4.947.200				4.947.200			2,69%
	Total				**184.153.529**							100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						23.837.177	25.060.000	88.204.152	47.052.200	0	0	**184.153.529**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						12,94%	13,61%	47,90%	25,55%	0,00%	0,00%	**100%**

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal
Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapua

5/cmo)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: Diciembre 2023/Enero 2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097

Contrato N°: 80/23			
Monto del Contrato:	184.153.529	**Fecha de terminación prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 días	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	23.837.177	23.837.177	23.405.525	23.405.525	12,94%	12,94%	12,71%	12,71%
Enero	25.060.000	48.897.177	28.606.752	52.012.277	13,61%	26,55%	15,53%	28,24%
Febrero	88.204.152	137.101.329			47,90%	74,45%		
Marzo	47.052.200	184.153.529			25,55%	100,00%		

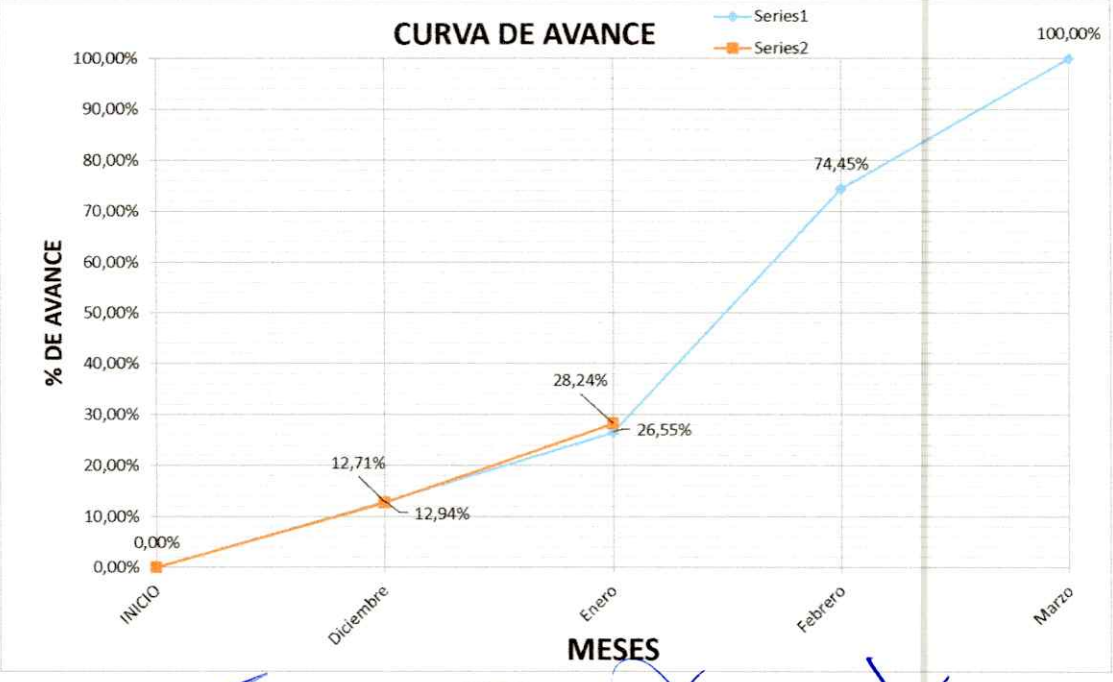

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oroggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

6(seis)

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRA: "Construcción de Empedrado con cordón de Hormigón – Barrio Primavera – Distrito de Trinidad – Plurianual"

UBICACIÓN: TRINIDAD	**DISTRITO:** TRINIDAD	**COORDENADAS UTM:** ---	**MONTO DE LA OBRA:** **184.153.529gs**
EMPRESA CONTRATISTA: Arq. Fabio López	**Nº DE TELÉFONO:** **0983440928**	**Nº CONTRATO:** **80/2023**	**FECHA DE INICIO:** **18/12/2023**
MODALIDAD / LOTE: Contratación Directa N° 45/2023	**PLAZO CONTRACTUAL:** 90 DÍAS CALENDARIO	**AMPLIACIONES (ADENDA):**	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 17/03/2024

FISCALES A CARGO: Secretaría de Obras

FECHA DE VISITA: Diciembre/ Enero del 2024

AVANCE DE OBRA: 28.24 %

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza la carga de H° en cordón cuneta. Avance normal según plazo contractual.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Construcción de Empedrado con cordón de Hormigón – Barrio Primavera – Distrito de Trinidad.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Ossgioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

7 (siete)

Construcción de Empedrado con cordón de Hormigón – Barrio Primavera – Distrito de Trinidad.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

8(ocho)

Construcción de Empedrado con cordón de Hormigón – Barrio Primavera – Distrito de Trinidad – Control de calidad y medida – Señalizaciones.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

9(nueve)
