GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 10

MES: SEPTIEMBRE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(1+2)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313	100%	520.348.500	99,81%	519.348.500	0,19%	1.000.000	100,00%	520.348.500
A	**Total por Contrato**	**100%**	**520.348.500**	**99,81%**	**519.348.500**	**0,19%**	**1.000.000**	**100,00%**	**520.348.500**

Certificado Básico N°	10
Mes:	SEPTIEMBRE
Contrato N°:	46/2024
Monto Básico:	520.348.500
Contratista:	JL y Compañía S.A.
Fecha de Inicio:	28/11/2024
Plazo de Ejecución:	180 días
Fecha de terminación prevista:	27/5/2025
Prórroga (Dias)	113
Fecha de terminación con prórroga:	17/9/2025
Vigencia Póliza de Contrato:	13/3/2026
Vigencia Póliza de Anticipo:	12/1/2026

B	**Deducciones a la fecha**			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	104.069.700	103.869.700	200.000	104.069.700
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**104.069.700**	**103.869.700**	**200.000**	**104.069.700**

C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	800.000
C.II	Multas	0
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	**800.000**

SON GUARANÍES:

Ochocientos mil.-

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transp.

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 10

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: SEPTIEMBRE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID Nº 453.313			
CONTRATISTA:	JL y Compañía S.A.	FECHA DE INICIO:	28/11/2024
MONTO DE LA OFERTA:	520.348.500	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/5/2025
CONTRATO Nº:	46/2024	PRÓRROGA (DÍAS):	113
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 días	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	17/9/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICION						PLANILLA DE CERTIFICADO BASICO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID Nº 453.313							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1,00	1.400.000	1.400.000	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1.400.000	0	1.400.000
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	19.000.000	19.000.000	0,037	100,00%	0,00%	100,00%	0,04	0,00	0,04	1,00	0,00	1,00	19.000.000	0	19.000.000
3	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	27,00	1.100.000	29.700.000	0,057	100,00%	0,00%	100,00%	0,06	0,00	0,06	27,00	0,00	27,00	29.700.000	0	29.700.000
4	Provisión y colocación de alcantarillado celular de Hº Aº de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Metro lineal	40,00	6.060.000	242.400.000	0,466	100,00%	0,00%	100,00%	0,47	0,00	0,47	40,00	0,00	40,00	242.400.000	0	242.400.000
5	Cabezal de Hº Aº (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	36,00	3.010.000	108.360.000	0,208	100,00%	0,00%	100,00%	0,21	0,00	0,21	36,00	0,00	36,00	108.360.000	0	108.360.000
6	Baranda de Hº Aº - prefabricada.	Metro lineal	24,00	630.000	15.120.000	0,029	100,00%	0,00%	100,00%	0,03	0,00	0,03	24,00	0,00	24,00	15.120.000	0	15.120.000
7	Provisión de Ripio (longitud. 1836m, ancho: 9m, altura 0,5m). No incluye flete	Metros cúbicos	9.828,26	9.500	93.368.500	0,179	100,00%	0,00%	100,00%	0,18	0,00	0,18	9.828,26	0,00	9.828,26	93.368.500	0	93.368.500
8	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2.200.000	0	2.200.000
9	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	450.000	1.800.000	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1.800.000	0	1.800.000
10	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000
11	Relevamienot topografico. Replanteo y marcacion para ubicación de puente y apertura de calles	Unidad	1,00	6.000.000	6.000.000	0,012	100,00%	0,00%	100,00%	0,01	0,00	0,01	1,00	0,00	1,00	6.000.000	0	6.000.000
				TOTAL	520.348.500	1,00				99,81%	0,19%	100,00%				519.348.500	1.000.000	520.348.500

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

Ing. Silvio Meza
Ing. Silvio Meza
JL y Compañía S.A
Residente de Obra

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313

CONTRATISTA:	JL y Compañia S.A.
MONTO DE LA OFERTA GS:	520.348.500
CONTRATO N°:	46/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 dias

FECHA DE INICIO:	28/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/5/2025
PRÓRROGA:	113
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	17/9/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313												
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000						0,27%
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	19.000.000	19.000.000	11.400.000	7.600.000					3,65%
3	Demolición del puente de hormigón existente.	Unidad Medida Global	1,00	18.500.000	18.500.000						18.500.000	3,56%
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	14,25	1.100.000	15.675.000	1.567.500	4.702.500	9.405.000				3,01%
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Metro lineal	40,00	6.060.000	242.400.000	12.120.000	48.480.000	72.720.000	109.080.000			46,58%
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	41,45	3.010.000	124.764.500			12.476.450	37.429.350	74.858.700		23,98%
7	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	24,00	630.000	15.120.000					7.560.000	7.560.000	2,91%
8	Provisión de Ripio (longitud: 1836m, ancho: 9m, altura:0,5m). No incluye flete	Metros cúbicos	8.262,00	9.500	78.489.000					39.244.500	39.244.500	15,08%
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000						2.200.000	0,42%
10	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	450.000	1.800.000						1.800.000	0,35%
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.000.000	1.000.000						1.000.000	0,19%

TOTAL	**520.348.500**						**TOTAL**	**100,00%**
PREVISTO MENSUAL EN GUARANÍES		26.487.500	60.782.500	94.601.450	146.509.350	121.663.200	70.304.500	**520.348.500**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		5,09%	11,68%	18,18%	28,16%	23,38%	13,51%	**100%**
ACUMULADO PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		5,09%	16,77%	34,95%	63,11%	86,49%	100,00%	

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
Ing. Diego Jara
JL y Compañia S.A.
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

5

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: SEPTIEMBRE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANA Y ALTO VERA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL- ID N° 453.313			
Contrato N°: 46/2024			
Monto del Contrato:	520.348.500	Fecha de terminación prevista:	27/5/2025
Plazo Contractual:	180 días	Prórroga:	113
Inicio de Obra:	28/11/2024	Fecha de terminación con prórroga:	17/9/2025

CUADRO DE AVANCE								
MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MES 1	26.487.500	26.487.500	38.635.876 ₲	38.635.876 ₲	5,09%	5,09%	7,42%	7,42%
MES 2	60.782.500	87.270.000	183.514.124 ₲	222.150.000 ₲	11,68%	16,77%	35,27%	42,69%
MES 3	94.601.450	181.871.450	100.415.000 ₲	322.565.000 ₲	18,18%	34,95%	19,30%	61,99%
MES 4	146.509.350	328.380.800	42.220.000 ₲	364.785.000 ₲	28,16%	63,11%	8,11%	70,10%
MES 5	121.663.200	450.044.000	101.770.000 ₲	466.555.000 ₲	23,38%	86,49%	19,56%	89,66%
MES 6	70.304.500	520.348.500	17.889.000 ₲	484.444.000 ₲	13,51%	100,00%	3,44%	93,10%
MES 7			11.000.000 ₲	495.444.000 ₲			2,11%	95,21%
MES 8			13.775.000 ₲	509.219.000 ₲			2,65%	97,86%
MES 9			10.129.500 ₲	519.348.500 ₲			1,95%	99,81%
MES 10			1.000.000 ₲	520.348.500 ₲			0,19%	100,00%

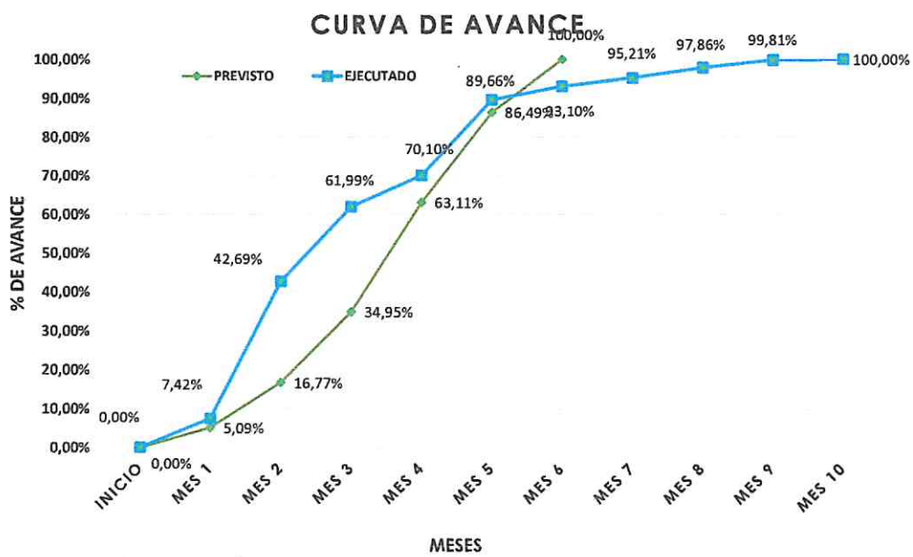

J L y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Diegoo Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
