CONTRATISTA	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	Certificado Mensual de Trabajo
TECO SRL		NRO° 1
RUC: 80055872-3	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Abril/2023

Asfaltado y Bacheo superficial de calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el Marco de la declaración de Emergencia Vial Resol. 58/2022 ID: 426058

MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	18,496,677,023	Fecha del Contrato:	16-mar-23	AVANCE EJECUTADO DEL MES	12.66%
			Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	1-abr-23	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	9.08%
			Plazo Contractual (Meses):	06	AVANCE TEORICO ACUMULADO	9.08%

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	CANTIDADES CERTIFICADAS			% PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			Cantidad Contractual	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		Gs.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Desbroce y Limpieza	Ha	1.82		1.82	1.82	100.00%	11,869,569	-	21,602,616	21,602,616
2	Terraplen	m³	3,375.00			-	0.00%	53,941	-	-	-
3	Reparación de empedrado	m²	1,500.00		120.00	120.00	8.00%	62,203	-	7,464,360	7,464,360
4	Sub base granular estabilizada con CBR>80	m³	1,428.75			-	0.00%	255,408	-	-	-
5	Base granular con CBR>100	m³	1,428.75			-	0.00%	325,872	-	-	-
6	Riego de Imprimacion Asltica	m²	6,750.00			-	0.00%	11,227	-	-	-
7	Riego de liga	m²	118,848.00		10,934.02	10,934.02	9.20%	6,843	-	74,821,471	74,821,471
8	Carpeta de Concreto Asfaltico	m²	88,742.30		8,193.06	8,193.06	9.23%	141,283	-	1,157,539,825	1,157,539,825
9	Bacheo superficial con mezcla asfaltica	m²	30,105.70		3,311.63	3,311.63	11.00%	116,910	-	387,162,313	387,162,313
10	Alcantarillas Celulares de Hº Aº Ø 1,00 x 1,00 m	m lineal	20.00			-	0.00%	4,319,418	-	-	-
11	Cordón de Hormigón Simple	m lineal	600.00			-	0.00%	80,340	-	-	-
12	Cordón Cuneta de Hormigón	m lineal	500.00			-	0.00%	189,255	-	-	-
13	Cuneta trapezoidal revestida de Hormigón	m lineal	300.00			-	0.00%	473,510	-	-	-
14	Baden de Hº Aº e=17 cm.	m²	100.00		60.00	60.00	60.00%	514,475	-	30,868,500	30,868,500
						TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			-	**1,679,459,085**	**1,679,459,085**
						RETENCIÖN CAUCIONAL 5%			-	**83,972,954**	**83,972,954**
						TOTAL GENERAL CON I.V.A.			-	**1,595,486,131**	**1,595,486,131**

CONTRATISTA
TECO SRL

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Arq. Miguel [illegible]
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

CONTRATISTA	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	Certificado Mensual de Trabajo
TECO SRL		NRO° 1
RUC: 80055872-3	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Abril/2023

Asfaltado y Bacheo superficial de calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el Marco de la declaración de Emergencia Vial Resol. 58/2022
ID: 426058

CRONOGRA FISICO -FINANCIERO

CERTIFICADO NRO 1

				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Ítem	Descripción del Rubro	Contractual	Porcentaje	Dia 1-30	Dia 31-61	Dia 62-93	Dia 94-124	Dia 125-156	Dia 157-187
1	Desbroce y Limpieza	21,602,616.00	0.12%	50.00%	50.00%				
2	Terraplen	182,050,875.00	0.98%	50.00%	50.00%				
3	Reparación de empedrado	93,304,500.00	0.50%	20.00%	20.00%	30.00%	30.00%		
4	Sub base granular estabilizada con CBR>80	364,914,180.00	1.97%	50.00%	50.00%				
5	Base granular con CBR>100	465,589,620.00	2.52%		50.00%	50.00%			
6.1	Riego de Imprimacion Asltica	75,782,250.00	0.41%		50.00%	50.00%			
6.2	Riego de liga	813,276,864.00	4.40%	10.00%	15.00%	25.00%	20.00%	20.00%	10.00%
6.3	Carpeta de Concreto Asfaltico	12,537,778,371.00	67.78%	10.00%	15.00%	25.00%	20.00%	20.00%	10.00%
6.4	Bacheo superficial con mezcla asfaltica	3,519,657,387.00	19.03%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	
6.5	Alcantarillas Celulares de Hº Aº Ø 1,00 x 1,00 m	86,388,360.00	0.47%		100.00%				
6.6	Cordón de Hormigón Simple	48,204,000.00	0.26%		40.00%	60.00%			
6.7	Cordón Cuneta de Hormigón	94,627,500.00	0.51%		40.00%	60.00%			
6.8	Cuneta trapezoidal revestida de Hormigón	142,053,000.00	0.77%		40.00%	60.00%			
7.1	Baden de Hº Aº e=17 cm.	51,447,500.00	0.28%		50.00%	50.00%			
PORCENTUAL ACUMULADO TEORICO		18,496,677,023	100.00%	12.66%	18.96%	24.53%	18.39%	18.24%	7.22%
PORCENTUAL ACUMULADO PROPUESTO				12.66%	31.62%	56.15%	74.54%	92.78%	100.00%

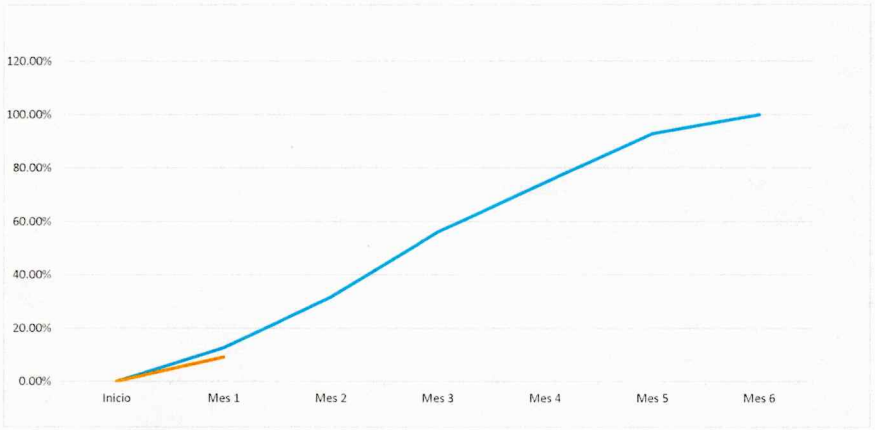

Meses	Inicio	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Dias	Inicio	Dia 1-30	Dia 31-61	Dia 62-93	Dia 94-124	Dia 125-156	Dia 157-187
PORCENTUAL ACUMULADO TEORICO	0.00%	12.66%	31.62%	56.15%	74.54%	92.78%	100.00%
PORCENTUAL ACUMULADO REAL	0.00%	9.08%					

CONTRATISTA
TECO SRL
TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

Dpto. de Obras y Bienes Municipales - Municipalidad de Pedro Juan Caballero

FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE PEDRO J. CABALLERO
Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

CONTRATISTA	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	Certificado Mensual de Trabajo
TECO SRL		NRO° 1
RUC: 80055872-3	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Abril/2023

Asfaltado y Bacheo superficial de calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el Marco de la declaración de Emergencia Vial Resol. 58/2022 ID: 426058

MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 18,496,677,023	Fecha del Contrato:	16-mar-23	AVANCE EJECUTADO DEL MES	12.66%
		Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	1-abr-23	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	9.08%
		Plazo Contractual (Meses):	06	AVANCE TEORICO ACUMULADO	9.08%

ESTADISTICOS

I	**RETENCIONES**	**TOTAL Gs.**
	1. Retenciones del mes	83,972,954
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	-
	3. Devolución de retenciones	-
	4. Retenciones acumuladas	83,972,954
II	**AJUSTES**	**TOTAL Gs.**
	1. Ajustes del mes	-
	2. Regularizacion de reajuste	-
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	-
	4. Ajustes acumulados	-
III	**PENALIZACION**	**TOTAL Gs.**
	1. Penalización del mes	-
	2. Devolución de penalizaciones del mes	-
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	-
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	-
	5. Penalizaciones acumuladas	-
IV	**RESUMEN**	**TOTAL Gs.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	1,595,486,131
	2. Retenciones acumuladas	83,972,954
	3. Ajustes acumulados	-
	4. Penalizaciones acumuladas	-
	5. Monto total pagado hasta la fecha (1+2+3-4)	1,679,459,085

CONTRATISTA
TECO SRL

TECO S.R.L. RUC: 80055872-3

Dpto. de Obras y Bienes Municipales Municipalidad de Pedro J. C.

FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE PEDRO J. CABALLERO

Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

CONTRATISTA	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	Certificado Mensual de Trabajo
TECO SRL		NRO° 1
RUC: 80055872-3	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Abril/2023

Asfaltado y Bacheo superficial de calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el Marco de la declaración de Emergencia Vial Resol. 58/2022 ID: 426058

MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 18,496,677,023	Fecha del Contrato:	16-mar-23	AVANCE EJECUTADO DEL MES	12.66%
		Fecha de Inicio del Plazo Contractual:	1-abr-23	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	9.08%
		Plazo Contractual (Meses):	06	AVANCE TEORICO ACUMULADO	9.08%

ESTADISTICOS

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL Gs.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1,679,459,085
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	-
	3. Monto de los trabajos del mes	1,679,459,085
	4. Certificado del mes	1,679,459,085
	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL Gs.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1,679,459,085
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	-
	3. Regularización de reajuste ()	-
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1,679,459,085
	6. Retención de garantía (5%)	83,972,954
	7. Penalización (IVA incl.)	-
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) **(4-5+7)**	**1,756,828,703**
	#¿NOMBRE?	

TECO S.R.L. RUC: 80055872-3

Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

CONTRATISTA	Municipalidad de Pedro Juan Caballero	Certificado Mensual de Trabajo
TECO SRL		NRO° 1
RUC: 80055872-3	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Abril/2023

Asfaltado y Bacheo superficial de calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el Marco de la declaración de Emergencia Vial Resol. 58/2022 ID: 426058

ACTA DE MEDICION

En la localidad de Predo Juan Cabalero, Dpto. de Amambay, el día 03 de Mayo del 2023 se reúnen por una parte el Ing. Erik Roberto Wolf Pozzo por la otra, el Arq. Miguel Rojas en su caracter de encargado del Departamento de obras de la Municipalidad, a los efectos de labrar la presente Acta de Medición Nro 1 del Mes de Abril del 2023que corresponde a la Obra: Asfaltado y Bacheo superficial de calles de la ciudad de Pedro Juan Caballero en el Marco de la declaración de Emergencia Vial Resol. 58/2022 ID: 426058

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbroce y Limpieza	Ha	1.82
3	Reparación de empedrado	m2	120.00
7	Riego de liga	m2	10,934.02
8	Carpeta de Concreto Asfaltico	m2	8,193.06
9	Bacheo superficial con mezcla asfaltica	m2	3,311.63
14	Baden de H° A° e=17 cm.	m2	60.00

En prueba de conformidad se firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes intervinientes.

CONTRATISTA
TECO SRL
RUC: 80055872-3

FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE PEDRO J. CABALLERO

Arq. Miguel Andres Rojas Leon
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipale
