GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 5

Mes: Abril

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID Nº 455889

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados								
				Hasta Certificado Anterior			Certificado Presente			Total Certificado a la Fecha		
		%	(1)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2)	% Avance de Obra	% Avance de Obra según Contrato	(3)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario											
A.I	MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID Nº 455889	100%	314.764.324	50,71%	37,42%	159.632.397	10,82%	9,04%	34.071.332	61,54%	46,46%	193.703.729
A	Total por Contrato	100%	314.764.324	50,71%	37,42%	159.632.397	10,82%	9,04%	34.071.332	61,54%	46,46%	193.703.729

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	62.952.865	31.926.479	6.814.266	38.740.745
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	-	0
B	Total Deducciones		62.952.865	31.926.479	6.814.266	38.740.745
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				27.257.066	
C.II	Multas				0	
C	Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				27.257.066	

Certificado Básico Nº	5
Mes:	Abril
Contrato N°:	77/24
Monto Básico:	314.764.324
Contratista	HM Construcciones - Hector Omar Mereles
Fecha de Inicio:	2-dic-24
Plazo de Ejecución:	150 días
Fecha de Terminación contractual:	1-may-25
Prorroga	30 días
Fecha de Terminación:	31-may-25

SON GUARANIES: Veintisiete Millones, Doscientos Cincuenta y Siete Mil, Sesentay Seis.

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental
Secretaria de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Diaz
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Hector Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

CERTIFICADO BASICO DE OBRAS N° 5

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

CONTRATISTA: HM Construcciones - Hector Mereles	
MONTO DE LA OFERTA: 314.764 324 Gs	

FECHA:	1/5/2025
CONTRATO N°:	77/24
PLAZO:	150 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 5						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 5					
MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889				HM Construcciones			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL	Metros cuadrados	132,400	2.562	339.209	0,11%	100%	0%	100%	0,11%	0,00%	0,11%	132,40		132,40	339 209	0	339 209
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	132,400	3.416	452.278	0,14%	100%	0%	100%	0,14%	0,00%	0,14%	132,40		132,40	452 278	0	452 278
3	Placa de inauguración	Unidad	1,000	1.066.027	1.066.027	0,34%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia	Unidad Medida Global	1,000	1.074.953	1.074.953	0,34%	100%	0%	100%	0,34%	0,00%	0,34%	1,00		1,00	1 074 953	0	1 074 953
5	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad Medida Global	1,000	2.103.539	2.103.539	0,67%	100%	0%	100%	0,67%	0,00%	0,67%	1,00		1,00	2 103 539	0	2 103 539
6	Vallado de obra, h= 1,50 (22*11)	Metros cuadrados	99,000	53.144	5.261.256	1,67%	100%	0%	100%	1,67%	0,00%	1,67%	99,00		99,00	5 261 256	0	5 261 256
7	Excavación de suelo	Metros cúbicos	14,600	75.242	1.098.533	0,35%	100%	0%	100%	0,35%	0,00%	0,35%	14,60		14,60	1 098 533	0	1 098 533
8	Base de PBC	Metros cúbicos	10,300	415.369	4.278.301	1,36%	100%	0%	100%	1,36%	0,00%	1,36%	10,30		10,30	4 278 301	0	4 278 301
9	Zapata de H° A°	Metros cúbicos	3,370	2.035.282	6.858.900	2,18%	100%	0%	100%	2,18%	0,00%	2,18%	3,37		3,37	6 858 900	0	6 858 900
10	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	2,910	2.035.282	5.922.671	1,88%	100%	0%	100%	1,88%	0,00%	1,88%	2,91		2,91	5 922 671	0	5 922 671
11	Encadenado Inferior 0,15 x 0,25 de H° A°	Metros cúbicos	3,440	2.035.282	7.001.370	2,22%	100%	0%	100%	2,22%	0,00%	2,22%	3,44		3,44	7 001 370	0	7 001 370
12	Encadenado Superiror 0,15 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	3,440	2.035.282	7.001.370	2,22%	100%	0%	100%	2,22%	0,00%	2,22%	3,44		3,44	7 001 370	0	7 001 370
13	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	13,750	181.579	2.496.711	0,79%	100%	0%	100%	0,79%	0,00%	0,79%	13,75		13,75	2 496 711	0	2 496 711
14	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	35,000	109.548	3.834.180	1,22%	100%	0%	100%	1,22%	0,00%	1,22%	35,00		35,00	3 834 180	0	3 834 180
15	Aislación asfáltica de paredes en U	Metro lineal	90,000	23.029	2.072.610	0,66%	100%	0%	100%	0,66%	0,00%	0,66%	90,00		90,00	2 072 610	0	2 072 610
16	Mampostería de 0.15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	272,360	107.963	29.404.803	9,34%	100%	0%	100%	9,34%	0,00%	9,34%	272,36		272,36	29 404 803	0	29 404 803
17	Envarillado sobre abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	26,000	28.341	736.866	0,23%	100%	0%	100%	0,23%	0,00%	0,23%	26,00		26,00	736 866	0	736 866
18	Azotada Hidrófuga interior, exterior, sanitario 2,10m	Metros cuadrados	262,300	25.378	6.656.649	2,11%	80%	11%	91%	1,69%	0,24%	1,94%	210,00	30,00	240,00	5 329 380	761 340	6 090 720
19	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	524,300	34.941	18.319.566	5,82%	82%	6%	88%	4,77%	0,33%	5,11%	430,00	30,00	460,00	15 024 630	1 048 230	16 072 860
20	Prov y coloc de techo chapa termo acúst de 4 cm prepint CABREADA pefril "U" de 100 c/zig zag ángulo 1" x 1/8 a 45° y 90° clavaderos caño estruct 40x60 y pared de 1,20 c/ 1,00m incl provy colocación cumbrera y bordes laterales chap dobl N° 26	Metros cuadrados	161,300	323.603	52.197.164	16,58%	81%	12%	93%	13,37%	2,06%	15,42%	130,00	20,00	150,00	42 068 390	6 472 060	48 540 450
21	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	30,500	99.745	3.042.223	0,97%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
22	Badeta de chapa doblada N° 26	Metro lineal	9,450	102.603	969.598	0,31%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
23	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	6,000	311.631	1.869.786	0,59%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
24	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común-hasta la calle	Metro lineal	25,000	71.774	1.794.350	0,57%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
25	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	121,850	31.656	3.857.284	1,23%	92%	0%	92%	1,13%	0,00%	1,13%	112,00		112,00	3 545 472	0	3 545 472

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-1
Edelira - Itapúa

Ing. Andrés Diaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

26	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	121,850	118.379	14.424.481	4,58%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
27	Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	68,050	40.226	2.737.379	0,87%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
28	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	48,200	84.252	4.060.946	1,29%	0%	41%	41%	0,00%	0,54%	0,54%	0,00	20,00	20,00	0	1.685.040	1.685.040
29	Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m	Unidad	1,000	1.097.498	1.097.498	0,35%	0%	50%	50%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00	0,50	0,50	0	548.749	548.749
30	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	3,000	734.621	2.203.863	0,70%	0%	100%	100%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00	3,00	3,00	0	2.203.863	2.203.863
31	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m	Unidad	3,000	627.308	1.881.924	0,60%	0%	100%	100%	0,00%	0,60%	0,60%	0,00	3,00	3,00	0	1.881.924	1.881.924
32	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	40,150	655.413	26.314.832	8,36%	0%	62%	62%	0,00%	5,21%	5,21%	0,00	25,00	25,00	0	16.385.325	16.385.325
33	Vidrio de 5mm para recepción de 1 m de altura	Metros cuadrados	4,050	506.621	2.051.815	0,65%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
34	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	186,700	26.094	4.871.750	1,55%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
35	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	95,450	28.147	2.686.631	0,85%	0%	42%	42%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00	40,00	40,00	0	1.125.880	1.125.880
36	Pintura epoxi de paredes interior y exterior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	148,500	28.147	4.179.830	1,33%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
37	Pintura de zócalo de nivelación al sintético	Metros cuadrados	12,300	20.566	252.962	0,08%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
38	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	26,900	26.558	714.410	0,23%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
39	Provisión e instalacion de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	Metro lineal	10,000	72.164	721.640	0,23%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
40	Provision e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad	1,000	1.692.116	1.692.116	0,54%	50%	0%	50%	0,27%	0,00%	0,27%	0,50		0,50	846.058	0	846.058
41	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	10,000	118.420	1.184.200	0,38%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
42	Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (Incluye tapa de HºAº)	Unidad	2,000	271.393	542.786	0,17%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
43	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	8,000	118.441	947.528	0,30%	50%	0%	50%	0,15%	0,00%	0,15%	4,00		4,00	473.764	0	473.764
44	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial)	Unidad	26,000	151.591	3.941.366	1,25%	0%	38%	38%	0,00%	0,48%	0,48%	0,00	10,00	10,00	0	1.515.910	1.515.910
45	Prov e instal de circ eléct p/AA incluye picado de pared ducteado con caño corrugado antillama revoc y cablea con term de caja conex c/tapa ciega blanco tamb incl caño pvc pasante p/desague del Aire y interruptor bipolar	Unidad	3,000	444.503	1.333.509	0,42%	67%	0%	67%	0,28%	0,00%	0,28%	2,00		2,00	889.006	0	889.006
46	Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k (Incluye ducto antillamas, cableado multifilar)	Unidad	20,000	571.837	11.436.740	3,63%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
47	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	6,000	153.108	918.648	0,29%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
48	Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica)	Unidad	2,000	620.772	1.241.544	0,39%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
49	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye, encendido con fotocelula, alimentación con cable multifilar NYY, caño electroducto, registro)	Unidad	1,000	1.257.128	1.257.128	0,40%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
50	Provisión e instalación de aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	3,000	2.708.227	8.124.681	2,58%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
51	Instalación de circuito cerrado y señal debil. (Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros)	Unidad	1,000	442.756	442.756	0,14%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
52	Alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4	Metro lineal	15,000	22.822	342.330	0,11%	100%	0%	100%	0,11%	0,00%	0,11%	15,00		15,00	342.330	0	342.330
53	Instalación de Agua Corriente para piletas lavamano empotrados en granito	Unidad	2,000	273.870	547.740	0,17%	100%	0%	100%	0,17%	0,00%	0,17%	2,00		2,00	547.740	0	547.740
54	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	3,000	684.675	2.054.025	0,65%	100%	0%	100%	0,65%	0,00%	0,65%	3,00		3,00	2.054.025	0	2.054.025
55	Desagüe de lavamanos	Unidad	2,000	273.870	547.740	0,17%	100%	0%	100%	0,17%	0,00%	0,17%	2,00		2,00	547.740	0	547.740
56	Instalación de Desagüe Clocal de sanitario hasta el 1er registro	Unidad	3,000	1.186.770	3.560.310	1,13%	100%	0%	100%	1,13%	0,00%	1,13%	3,00		3,00	3.560.310	0	3.560.310
57	Cámara de Inspección	Unidad	5,000	443.011	2.215.055	0,70%	0%	20%	20%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00	1,00	1,00	0	443.011	443.011
58	Cámara Séptica	Unidad	1,000	2.177.806	2.177.806	0,69%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
59	Pozo Absorvente	Unidad	1,000	3.151.906	3.151.906	1,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

60	Ducha eléctrica, incluye bujes flexibles	Unidad	2,000	200.838	401.676	0,13%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
61	Inodoro sisterna baja	Unidad	3,000	1.278.060	3.834.180	1,22%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
62	Lavamanos con granito	Unidad	4,000	593.385	2.373.540	0,75%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
63	Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2	Unidad	1,000	228.225	228.225	0,07%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
64	Jabonera de porcelana	Unidad	7,000	73.032	511.224	0,16%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
65	Papelera de porcelana	Unidad	3,000	73.032	219.096	0,07%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
66	Toallero, percha de porcelana	Unidad	7,000	73.032	511.224	0,16%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
67	Caja cifonada 15x15	Unidad	5,000	82.161	410.805	0,13%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
68	Mesada de granito (receccion)	Metros cuadrados	2,050	1.232.415	2.526.451	0,80%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
69	Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	47,650	85.392	4.068.929	1,29%	84%	0%	84%	1,09%	0,00%	1,09%	40,00		40,00	3.415.680	0	3.415.680
70	Rampa de acceso peatonal de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	12,300	85.392	1.050.322	0,33%	100%	0%	100%	0,33%	0,00%	0,33%	12,30		12,30	1.050.322	0	1.050.322
71	Letras corpóreas de 40 cm de altura	Unidad	19,000	661.852	12.575.188	4,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
72	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	132,400	3.651	483.392	0,15%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0	0	0
Total					314.764.324	100%				50,71%	10,82%	61,54%				159.632.397	34.071.332	193.703.729

Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Héctor Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-4
Edelira - Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

CONTRATISTA: HM Construcciones - Hector Mereles	
MONTO DE LA OFERTA: 314.764.324 Gs.	

FECHA DE INICIO:	2/12/2024
CONTRATO N°:	77/24
PLAZO:	150 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889				HM Construcciones - Hector Mereles		PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
1	Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL	Metros cuadrados	132,400	2.562	339.209	339.209						0,11%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	132,400	3.416	452.278	452.278						0,14%
3	Placa de inauguración	Unidad	1,000	1.066.027	1.066.027						1.066.027	0,34%
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia	Unidad Medida Global	1,000	1.074.953	1.074.953	1.074.953						0,34%
5	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad Medida Global	1,000	2.103.539	2.103.539	2.103.539						0,67%
6	Vallado de obra, h= 1,50 (22*11)	Metros cuadrados	99,000	53.144	5.261.256	5.261.256						1,67%
7	Excavación de suelo	Metros cúbicos	14,600	75.242	1.098.533	1.098.533						0,35%
8	Base de PBC	Metros cúbicos	10,300	415.369	4.278.301	4.278.301						1,36%
9	Zapata de H° A°	Metros cúbicos	3,370	2.035.282	6.858.900	6.858.900						2,18%
10	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	2,910	2.035.282	5.922.671	5.922.671						1,88%
11	Encadenado Inferior 0,15 x 0,25 de H° A°	Metros cúbicos	3,440	2.035.282	7.001.370	7.001.370						2,22%
12	Encadenado Superiror 0,15 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	3,440	2.035.282	7.001.370	7.001.370						2,22%
13	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	13,750	181.579	2.496.711	2.496.711						0,79%
14	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	35,000	109.548	3.834.180	3.834.180						1,22%
15	Aislación asfáltica de paredes en U	Metro lineal	90,000	23.029	2.072.610	2.072.610						0,66%
16	Mampostería de 0.15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	272,360	107.963	29.404.803	20.583.362	8.821.441					9,34%
17	Envarillado sobre abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	26,000	28.341	736.866	736.866						0,23%
18	Azotada Hidrófuga interior, exterior, sanitario 2,10m	Metros cuadrados	262,300	25.378	6.656.649		6.656.649					2,11%
19	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	524,300	34.941	18.319.566		7.327.827	10.991.740				5,82%
20	Prov y coloc de techo chapa termo acúst de 4 cm prepint CABREADA pefril "U" de 100 c/zig zag ángulo 1" x 1/8 a 45° y 90° clavaderos caño estruct 40x60 y pared de 1,20 c/ 1,00m Incl provy colocación cumbrera y bordes laterales chap dobl Nº 26	Metros cuadrados	161,300	323.603	52.197.164					26.098.582	26.098.582	16,58%

Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839
Edelira - Itapúa

21	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	30,500	99.745	3.042.223						3.042.223	0,97%
22	Badeta de chapa doblada N° 26	Metro lineal	9,450	102.603	969.598						969.598	0,31%
23	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	6,000	311.631	1.869.786				1.869.786			0,59%
24	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	25,000	71.774	1.794.350		1.794.350					0,57%
25	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	121,850	31.656	3.857.284		1.542.913	2.314.370				1,23%
26	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	121,850	118.379	14.424.481			7.212.241	7.212.241			4,58%
27	Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	68,050	40.226	2.737.379				2.737.379			0,87%
28	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	48,200	84.252	4.060.946				4.060.946			1,29%
29	Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m	Unidad	1,000	1.097.498	1.097.498					1.097.498		0,35%
30	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	3,000	734.621	2.203.863					2.203.863		0,70%
31	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m	Unidad	3,000	627.308	1.881.924					1.881.924		0,60%
32	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	40,150	655.413	26.314.832					26.314.832		8,36%
33	Vidrio de 5mm para recepción de 1 m de altura	Metros cuadrados	4,050	506.621	2.051.815					2.051.815		0,65%
34	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	186,700	26.094	4.871.750						4.871.750	1,55%
35	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	95,450	28.147	2.686.631						2.686.631	0,85%
36	Pintura epoxi de paredes interior y exterior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	148,500	28.147	4.179.830						4.179.830	1,33%
37	Pintura de zócalo de nivelación al sintético	Metros cuadrados	12,300	20.566	252.962						252.962	0,08%
38	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	26,900	26.558	714.410						714.410	0,23%
39	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	Metro lineal	10,000	72.164	721.640					721.640		0,23%
40	Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad	1,000	1.692.116	1.692.116					1.692.116		0,54%
41	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	10,000	118.420	1.184.200					1.184.200		0,38%
42	Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (Incluye tapa de HºAº)	Unidad	2,000	271.393	542.786					542.786		0,17%
43	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	8,000	118.441	947.528					947.528		0,30%
44	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial)	Unidad	26,000	151.591	3.941.366					3.941.366		1,25%
45	Prov e instal de circ eléct p/AA incluye picado de pared ducteado con caño corrugado antillama revoc y cablea con term de caja conex c/tapa ciega blanco tamb incl caño pvc pasante p/desague del Aire y interruptor bipolar	Unidad	3,000	444.503	1.333.509					1.333.509		0,42%

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-1
Edelira - Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

9

46	Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k (Incluye ducto antillamas, cableado multifilar)	Unidad	20,000	571.837	11.436.740						11.436.740	3,63%
47	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	6,000	153.108	918.648						918.648	0,29%
48	Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica)	Unidad	2,000	620.772	1.241.544					1.241.544		0,39%
49	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye. encendido con fotocelula, alimentación con cable multifilar NYY, caño electroducto, registro)	Unidad	1,000	1.257.128	1.257.128						1.257.128	0,40%
50	Provisión e instalación de aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	3,000	2.708.227	8.124.681						8.124.681	2,58%
51	Instalación de circuito cerrado y señal debil. (Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros)	Unidad	1,000	442.756	442.756					442.756		0,14%
52	Alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4	Metro lineal	15,000	22.822	342.330					342.330		0,11%
53	Instalación de Agua Corriente para piletas lavamano empotrados en granito	Unidad	2,000	273.870	547.740					547.740		0,17%
54	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	3,000	684.675	2.054.025					2.054.025		0,65%
55	Desagüe de lavamanos	Unidad	2,000	273.870	547.740				547.740			0,17%
56	Instalación de Desagüe Clocal de sanitario hasta el 1er registro	Unidad	3,000	1.186.770	3.560.310				3.560.310			1,13%
57	Cámara de Inspección	Unidad	5,000	443.011	2.215.055				2.215.055			0,70%
58	Cámara Séptica	Unidad	1,000	2.177.806	2.177.806				2.177.806			0,69%
59	Pozo Absorvente	Unidad	1,000	3.151.906	3.151.906					3.151.906		1,00%
60	Ducha eléctrica, incluye bujes flexibles	Unidad	2,000	200.838	401.676					401.676		0,13%
61	Inodoro sisterna baja	Unidad	3,000	1.278.060	3.834.180						3.834.180	1,22%
62	Lavamanos con granito	Unidad	4,000	593.385	2.373.540						2.373.540	0,75%
63	Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2	Unidad	1,000	228.225	228.225						228.225	0,07%
64	Jabonera de porcelana	Unidad	7,000	73.032	511.224						511.224	0,16%
65	Papelera de porcelana	Unidad	3,000	73.032	219.096						219.096	0,07%
66	Toallero, percha de porcelana	Unidad	7,000	73.032	511.224						511.224	0,16%
67	Caja cifonada 15x15	Unidad	5,000	82.161	410.805						410.805	0,13%
68	Mesada de granito (receccion)	Metros cuadrados	2,050	1.232.415	2.526.451						2.526.451	0,80%
69	Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	47,650	85.392	4.068.929				4.068.929			1,29%
70	Rampa de acceso peatonal de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	12,300	85.392	1.050.322					1.050.322		0,33%
71	Letras corpóreas de 40 cm de altura	Unidad	19,000	661.852	12.575.188						12.575.188	4,00%
72	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	132,400	3.651	483.392						483.392	0,15%
Total					314.764.324							100%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						71.116.109	26.143.180	20.518.351	28.450.192	79.243.958	89.292.534	314.764.324
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						22,59%	8,31%	6,52%	9,04%	25,18%	28,37%	100%

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Diaz
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Diaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Hector Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839
Edelira - Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

Contrato N°	77/24	Mes:	Abril
Monto del Contrato:	314.764.324	Term. Prevista contractual:	1/5/2025
Plazo Contractual:	150 días	Ampliaciones:	30 días
Inicio de Obra:	2-dic-24	Term. Prevista :	31/5/2025

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N° 77/24

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	71.116.109	71.116.109	78.691.081	78.691.081	22,59%	22,59%	25,00%	25,00%
Enero	26.143.180	97.259.290	15.649.361	94.340.442	8,31%	30,90%	4,97%	29,97%
Febrero	20.518.351	117.777.640	23.113.240	117.453.682	6,52%	37,42%	7,34%	37,31%
Marzo	28.450.192	146.227.832	42.178.715	159.632.397	9,04%	46,46%	13,40%	50,71%
Abril	79.243.958	225.471.790	34.071.332		25,18%	71,63%	10,82%	61,54%
Mayo	89.292.534	314.764.324	0		28,37%	100,00%	0,00%	

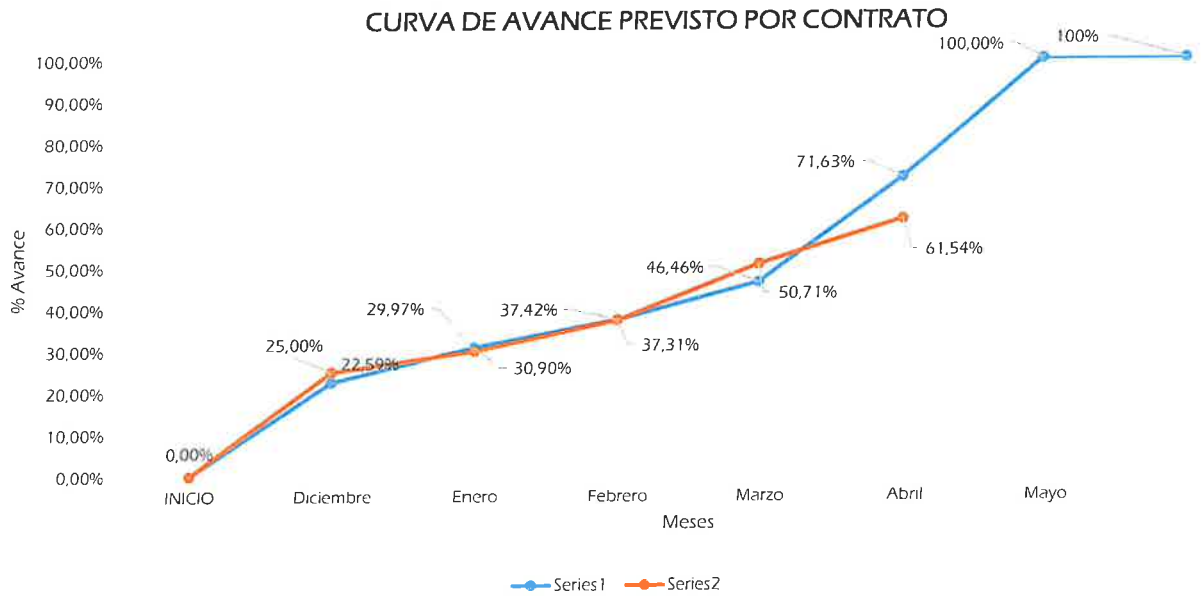

Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Hector Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

N° RUC:	**23838396**
Razón Social o Contribuyente:	**HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ**
Nombre Comercial:	**HM CONSTRUCCIONES**
Dirección:	**CALLE PIRAPEY 45 1RA LINEA CL8991 - EDELIRA**
Teléfono:	**0985-741351**
Correo electrónico:	**hectormereles75@hotmail.com**

Nro. de Registro REPSE **018798**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y normativas vigentes concordantes.

Otorgado en Asunción el **03/05/2022**

Fecha de última renovación el **07/05/2024**

Este registro tiene fecha de vencimiento el **07/05/2026**

Constancia generada el **03/10/2024 07:55:09**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

DETALLES

N° RUC:	**23838396**
Razón Social o Contribuyente:	**HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ**
Nombre Comercial:	**HM CONSTRUCCIONES**
NSP:	**1.0103.11.00 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS)**

Nombre Establecimiento:	**HECTOR OMAR MERELES GONZÁLEZ - HM CONSTRUCCIONES**
Dirección:	**MARIA AUXILIADORA CASI SAN JUAN // CASA - TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA**
NSP:	**1.0103.11.00 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO)**

Constancia generada el **03/10/2024 07:55:09**

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270199083385

FECHA 28/04/2025

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2383839	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERELES GONZALEZ HECTOR OMAR

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 28/05/2025

NÚMERO DE CONTROL : 7A1007B6

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427123838397A1007B6

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado:	Hector Omar Mereles González	**RUC:**	2383839-6
Entidad Contratante:	Uoc Itapua	**Descripción del Llamado / Contrato**	455889 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA- PLURIANUAL
Monto del Contrato:	314.764.324		

Número	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Estado	Fecha desvinculación
1	Pedro Abel	Gonzalez Ayala	4520241	EXCLUSIVA	LABORAL	Desvinculado	03/02/2025
2	Walter Ovidio	Ayala Saucedo	4760600	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
3	Hector Omar	Mereles Gonzalez	2383839	EXCLUSIVA	CIVIL	Desvinculado	16/12/2024
4	Martin	Ayala Barberan	3694829	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
5	Luciano	Santacruz Romero	6061126	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	

Usuario Impresión: 2383839 - HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ

Fecha Impresión: 28/04/2025

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado:	Hector Omar Mereles González	**RUC:**	2383839-6
Entidad Contratante:	Uoc Itapua	**Descripción del Llamado / Contrato**	455889 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL
Monto del Contrato:	314.764.324	**Año / Periodo:**	2025 / MARZO

Número	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Funciones Exclusivas	Remuneración (Guaraníes)	Relación	Estado
1	Martin	Ayala Barberan	3694829	Cumple	1.937.286	LABORAL	Activo
2	Walter Ovidio	Ayala Saucedo	4760600	Cumple	1.937.286	LABORAL	Activo
3	Luciano	Santacruz Romero	6061126	Cumple	1.937.286	LABORAL	Activo

Usuario Impresión: 2383839 - HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ

Fecha Impresión: 04/04/2025

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 2383839

NRO. CERTIFICADO: 484499

FECHA EMISION: 14-04-2025

VENCIMIENTO: 14-05-2025

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2383839

Nro. Certificado: 484499

Razon Social: HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 03-05-2022

Cantidad de Asegurados: 4

Nro. Patronal(es): 0366-40-0021 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°5 - CERTIFICADO N°5 - ABRIL

MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº: 21/2024 "AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL" ID N° 455889

OBRA: Ampliación de Centro Oftalmológico

BENEFICIARIO: Distrito de Tomas Romero Pereira

FISCAL DE OBRAS: Ing. Andrés Díaz

AVANCE DE OBRA: 9,04%

AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 61,54%

FECHA DE VISITA: 30/04/25

FECHA DE INFORME: 02/05/25

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Hospital Distrital de T.R. Pereira	Tomas Romero Pereira	314.764.324 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
HM Construcciones	0985741351	77/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL**
150 días	02 – Diciembre - 2024	01 – Mayo - 2025
PRORROGA POR LLUVIA	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
30 días	31- Mayo - 2025	

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 30/04 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 57,51 % acumulado.

Se observó al equipo de trabajo en la realización de diferentes rubros contractuales, entre los cuales se incluyen los trabajos de revoques interior y exterior, pinturas, colocación de aberturas ventanas y puertas e inst. eléctricas .

La obra avanza según lo proyectado, siguiendo las indicaciones, realizando controles de calidad.

Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obra

Fiscalización de Obras

Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irazabal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE OBRAS			
ORDEN	**ITEMS.**		**APROBACIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE)**
1	NOTA DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO		/
2	RESUMEN DE CERTIFICADO BÁSICO		/
3	ACTA DE MEDICIÓN		/
4	PLANILLA DE CERTIFICADO (porcenteje de ejecución de items - incidencias - importe)		/
5	PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		/
	a-	CUADRO DE AVANCE (previstos - ejecutados)	/
	b-	CURVA DE AVANCE (previstos - ejecutados)	/
6	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO		/
7	DOCUMENTACIONES ADMINISTRATIVAS		/
	a-	COPIA DE ACTA DE INICIO, RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA	/
	c-	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL	/
	d-	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	/
8	INFORME DE LA FISCALIZACIÓN		/
9	PRESENTAR EN 4 EJEMPLARES Y FORMATO DIGITAL PDF		/

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

SELLO Y FIRMA DE FISCALIZACIÓN

Fecha de Aprobación 02/05/25

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchor
Encarnación - Itapúa - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 486/2025

POR LA CUAL SE DISPONE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 77/2024, OBRA: AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA - PLURIANUAL - CONTRATISTA: HÉCTOR OMAR MÉRELES GONZÁLEZ – I.D. N° 455.889.----------

Encarnación, 22 de abril de 2025.-

V I S T O:

Los expedientes N° 5700/2025, N° 5701/2025, N° 5702/2025 y el expediente N° 5703/2025, por las cuales se han solicitado una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y, ----------

CONDIDERANDO:

Que, en fecha 07 de abril del 2025, el contratista ha presentado escritos de solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 77/2024, de la obra: **"AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA - PLURIANUAL - I.D. N° 455.889"**, por afectaciones producidas por los días de lluvias en los meses de diciembre del año 2024, enero, febrero y marzo del año 2025.----------

Que, mediante el Dictamen U.F.C. N° 129/2025, de fecha 21 de abril del 2025 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

En primer lugar, se debe señalar que el Artículo N° 107 DEL DECRETO N° 2264/24 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", dispone en cuanto a la Prórroga de la ejecución contractual que el desplazamiento de la ejecución contractual deberá ser equivalente al periodo durante el cual el proveedor, consultor o contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.----------

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003 y el cual se encuentra vigente y por lo tanto aplicable a los procedimientos regidos por la ley 7021/22, en su art. 2 establece: Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, ***es parecer de la Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 30 (treinta) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre del año 2024, enero, febrero y marzo del año 2025, que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.***----------

Que, La Ley N° 426/1994, *"Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental"* dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. *a) "...cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico..."*; como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las que las leyes establezcan. ---------

POR TANTO, Y EN EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: HACER LUGAR a las solicitudes de prórroga de plazo presentada por el contratista **HÉCTOR OMAR MÉRELES GONZÁLEZ**, en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 77/2024 de la obra **AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA - PLURIANUAL - I.D. N° 455.889**, por el plazo de 30 (treinta) días corridos.----------

ARTÍCULO 2: NOTIFICAR al señor Héctor Omar Méreles González, del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----

ARTÍCULO 3: INTIMAR a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 77/2024, de referencia.----------

ARTÍCULO 4: REMITIR copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

ARTÍCULO 5: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Abg. Carmina Natalia Benítez B.
Secretaria General

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa
