GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju´i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju´i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623	100%	259.084.512	0,00%	0	17,30%	44.817.440	17,30%	44.817.440
A	**Total por Contrato**	**100%**	**259.084.512**	**0,00%**	**0**	**17,30%**	**44.817.440**	**17,30%**	**44.817.440**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	51.816.902	0	8.963.488	8.963.488
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**51.816.902**	**0**	**8.963.488**	**8.963.488**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				35.853.952	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**35.853.952**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**70/2023**
Monto Básico:	**259.084.513**
Contratista:	**Felix Bernal Caceres**
Fecha de Inicio:	**13-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**120 Dias**
Fecha de terminación prevista:	**11-abr-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Treinta y cinco millones, ochocientos cincuenta y tres mil, novecientos cincuenta y dos.-

Felix Bernal Caceres
Contratista - Representante Legal

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero

Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju'i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623

CONTRATISTA:	Felix Bernal Caceres	**FECHA DE INICIO:**	13-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	259.084.513	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	11-abr-24
CONTRATO N°:	70/2023	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 Dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju'i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	720	2.127	1.531.440	0,006	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,006	0,006	0,00	720	720,00	0	1.531.440	1.531.440
2	Replanteo y marcación, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	720	3.446	2.481.120	0,010	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,010	0,010	0,00	720	720,00	0	2.481.120	2.481.120
3	Cartel metalico con soporte - Cartel de la Obra -Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.165.500	1.165.500	0,004	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,004	0,004	0,00	1	1,00	0	1.165.500	1.165.500
4	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para nivelación 0.30cm.	Metros cúbicos	15,5	75.740	1.173.970	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	15,5	15,50	0	1.173.970	1.173.970
5	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para pilotines 0.40x0.40x0.80	Metros cúbicos	3,5	77.980	272.930	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	3,5	3,50	0	272.930	272.930
6	Colocacion de hormigon armado - Carga de pilotines de anclaje de vallado con hormigón.	Metros cúbicos	0,8	1.615.600	1.292.480	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	0,80	0,80	0	1.292.480	1.292.480
7	Colocacion de hormigon armado - Piso de hormigón armado (hormigon elaborado fck 200 kg/cm2). Espesor 12 cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con pavidul y helicoptero.	Metros cuadrados	720	205.000	147.600.000	0,570	0,00%	14,47%	14,47%	-	0,082	0,082	0,00	104,18	104,18	0	21.355.875	21.355.875
8	Mamposteria - De 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	33,6	176.610	5.934.096	0,023	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,023	0,023	0,00	33,60	33,60	0	5.934.096	5.934.096
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	165	58.240	9.609.600	0,037	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,037	0,037	0,00	165,00	165,00	0	9.609.600	9.609.600
10	Revoques - De paredes exteriores - exterior a una capa de mu	Metros cuadrados	32,85	36.302	1.192.520	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Preparacion de obra - Vallado - Colocación de tubo de acero galvanizado 2''	Metro lineal	96	90.790	8.715.840	0,034	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Preparacion de obra -Tejido romboidal alambre recocido Galv	Metros cuadrados	120	115.570	13.868.400	0,054	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Colocacion de pisos - contrapisos - Junta de dilatación (detalle	Metro lineal	208	43.932	9.137.856	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Servicio de pintura - Pintura de Terminación de Superficie: Pir	Metros cuadrados	720	59.570	42.890.400	0,166	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Colocacion de estructuras deportivas - Arcos metálicos para fu	Unidad	2	4.432.120	8.864.240	0,034	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Colocacion de estructuras deportivas - Poste para red de vóle	Unidad	2	913.500	1.827.000	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	720	2.121	1.527.120	0,006	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					**259.084.512**	**100%**				**0,00%**	**17,30%**	**17,30%**				**0**	**44.817.440**	**44.817.440**

Felix Bernal Caceres
Contratista Representante Legal

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscalización de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapua

3/hoj

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre - Enero

Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju'i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623			
CONTRATISTA:	Felix Bernal Caceres	FECHA DE INICIO:	13-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	259.084.513	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	11-abr-24
CONTRATO N°:	70/2023	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 Días	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju'i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623						PLAZO DE EJECUCIÓN					TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
1	Preparacion de obra - Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	720	2.127	1.531.440	1.531.440					0,59%
2	Replanteo y marcación, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	720	3.446	2.481.120	2.481.120					0,96%
3	Cartel metalico con soporte - Cartel de la Obra -Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.165.500	1.165.500	1.165.500					0,45%
4	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para nivelación 0.30cm.	Metros cúbicos	15,5	75.740	1.173.970	1.173.970					0,45%
5	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para pilotines 0.40x0.40x0.80	Metros cúbicos	3,5	77.980	272.930	272.930					0,11%
6	Colocacion de hormigon armado - Carga de pilotines de anclaje de vallado con hormigón.	Metros cúbicos	0,8	1.615.600	1.292.480	0	1.292.480				0,50%
7	Colocacion de hormigon armado - Piso de hormigón armado (hormigon elaborado fck 200 kg/cm2). Espesor 12 cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con pavidul y helicoptero.	Metros cuadrados	720	205.000	147.600.000	0	36.900.000	73.800.000	36.900.000		56,97%
8	Mamposteria - De 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	33,6	176.610	5.934.096			5.934.096			2,29%
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	165	58.240	9.609.600			9.609.600			3,71%
10	Revoques - De paredes exteriores - exterior a una capa de muros de nivelación.	Metros cuadrados	32,85	36.302	1.192.520			1.192.520			0,46%
11	Preparacion de obra - Vallado - Colocación de tubo de acero galvanizado 2"	Metro lineal	96	90.790	8.715.840			8.715.840			3,36%
12	Preparacion de obra -Tejido romboidal alambre recocido Galvanizado nro 12, malla metálica 1 1/2" colocado con varilla lisa 10mm	Metros cuadrados	120	115.570	13.868.400				6.934.200	6.934.200	5,35%
13	Colocacion de pisos - contrapisos - Junta de dilatación (detalles en planos)	Metro lineal	208	43.932	9.137.856				9.137.856		3,53%
14	Servicio de pintura - Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base EPOXI P/PISO (detalles en planos)	Metros cuadrados	720	59.570	42.890.400				42.890.400		16,55%
15	Colocacion de estructuras deportivas - Arcos metálicos para futbol. Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño - incluye red de arco y tablero) - 2 unidades	Unidad	2	4.432.120	8.864.240				8.864.240		3,42%
16	Colocacion de estructuras deportivas - Poste para red de vóley (caño galvanizado de 3" - según diseño), incluye red de Nylon y accesorios.	Unidad	2	913.500	1.827.000					1.827.000	0,71%
17	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	720	2.121	1.527.120					1.527.120	0,59%
	Total				259.084.512						100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						6.624.960	38.192.480	99.252.056	104.726.696	10.288.320	259.084.512
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						2,56%	14,74%	38,31%	40,42%	3,97%	100%

Felix Bernal Caceres
Contratista-Representante Legal

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.

Fiscalización de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: Diciembre - Enero

Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju´i - Edelira km 65 - Plurianual con ID: 435.623

Contrato N°: 70/2023			
Monto del Contrato:	259.084.513	**Fecha de terminación prevista:**	11-abr-24
Plazo Contractual:	120 Dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	13-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	6.624.960	6.624.960	6.624.960	6.624.960	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%
Enero	38.192.480	44.817.440	38.192.480	44.817.440	14,74%	17,30%	14,74%	17,30%
Febrero	99.252.056	144.069.496	0	44.817.440	38,31%	55,61%	0,00%	17,30%
Marzo	104.726.696	248.796.192	0	44.817.440	40,42%	96,03%	0,00%	17,30%
Abril	10.288.320	259.084.512	0	44.817.440	3,97%	100,00%	0,00%	17,30%

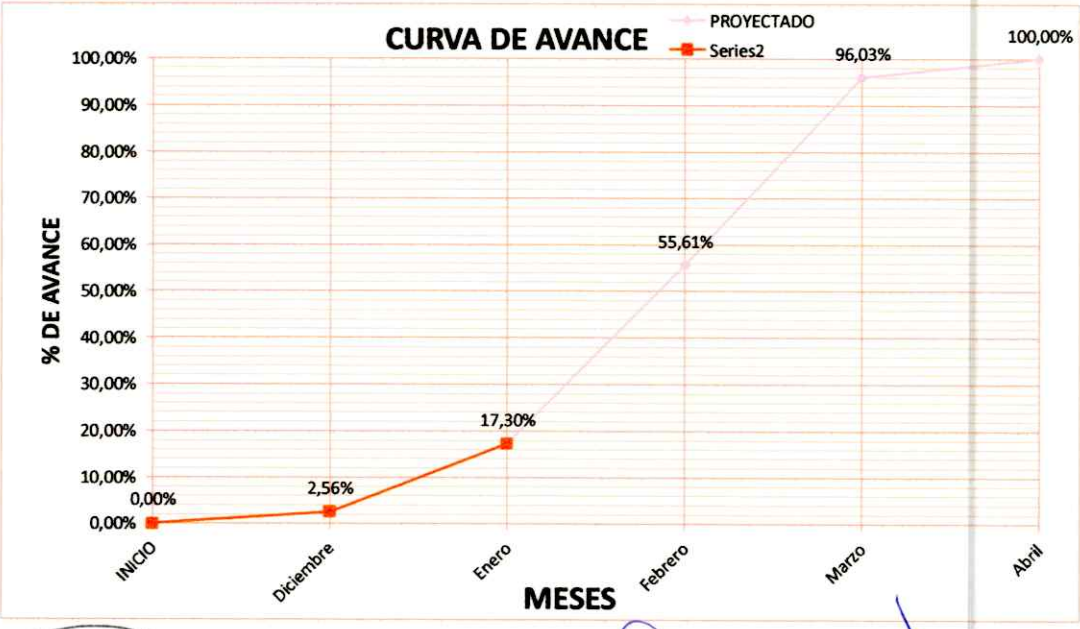

Felix Bernal Caceres
Contratista-Representante Legal

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

Fiscalización de Obra
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

6/(ocho)

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 01 – CERTIFICADO N° 01 DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 22/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE PIRAJU´I – EDELIRA KM 65" – Contrato N° 70/2023 - I. D. N° 435.623

OBRA: Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional de Piraju´i – Edelira Km 65
BENEFICIARIO: Colegio Nacional de Piraju´i – Distrito de Edelira
FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni
FECHA DE VISITA: 31/Enero/2024
AVANCE DE OBRA: 17,30%
FISCAL A CARGO: Ing. Fernando Oreggioni

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Piraju´i – Km 65	Edelira	259.084.513 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Félix Bernal Cáceres	0983-107-284	70/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
120 días	13/12/2023	11/04/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 31/01/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos: muro de nivelación, relleno y compactación, preparado de la malla para posterior cargado de hormigón.

El avance hasta la fecha es de 17,30%, según su cronograma físico financiero correspondiente al mes de diciembre y enero.

La ejecución se está dando de forma continua y rápida, cumpliendo los plazos establecidos y las exigencias de calidad de la obra.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

11/one)
