GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 04

Mes: junio

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 44/2023 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 44/2023 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017**	100,00%	164.408.033	66,14%	108.734.099	17,01%	27.961.094	83,14%	136.695.193
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**164.408.033**	**66,14%**	**108.734.099**	17,01%	**27.961.094**	**83,14%**	**136.695.193**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	32.881.607	21.746.820	11.134.787	32.881.607
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**32.881.607**	21.746.820	**11.134.787**	**32.881.607**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				16.826.307	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**16.826.307**	

Certificado Básico Nº	**04**
Mes: junio	
Contrato N°:	34/23
Monto Básico:	₲ 164.408.033
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 días
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Prórroga:	**60 días + 32 días +8 días**
Fecha de terminación con prórroga:	**25-jun-24**

SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE.-

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Ing. Claudio Gaona Valenzuela
Fiscal de Obra
Gobernacion de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOP 2.3.2.3

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

0985171856
impactoconstructora@gmail.com

IMPACTO CONSTRUCTORA

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 04

CONTRATO Nº 34/2023

REFERENCIA: Contratación Directa N° 44/2023

Descripción del llamado: "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual"

ID N° 437.017

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos
En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 25 días del mes de junio del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Claudio Gaona Valenzuela, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y la Lic. Noelia Ledesma Ocampos, Representante legal de la Empresa Impacto Constructora, para la;

- "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual"

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes junio del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

---
Representante Legal

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 39171

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 44/2023 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 164.408.033	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	34/23	**PRÓRROGA:**	60 días + 32 días +8 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:**	25-jun-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 04						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 04					
Ítems del llamado Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo ? Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 437017				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.394	34.116	81.673.704	0,497	70	19	89	0,348	0,094	0,442	1675,8	454,86	2130,66	57.171.593	15.518.004	72.689.597
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	684	74.404	50.892.336	0,310	100	-3	96,7	0,310	-0,010	0,299	684	-22,57	661,43	50.892.336	-1.679.447	49.212.889
3	Colocacion de hormigon armado -PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	19,9	1.279.705	25.466.130	0,155	0	40,0	40	0,000	0,062	0,062	0	7,96	7,96	-	10.186.452	10.186.452
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	35	47.287	1.655.045	0,010	0	20	20	0,000	0,002	0,002	0	7	7	-	331.009	331.009
5	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	223.390	670.170	0,004	100	0	100	0,004	0,000	0,004	3	0	3	670.170	-	670.170
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.394	1.692	4.050.648	0,025	0	89,0	89	0,000	0,022	0,022	0	2130,66	2130,66	-	3.605.077	3.605.077
					164.408.033	100%				66,14%	17,01%	83,14%				108.734.099	27.961.094	136.695.193

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Claudio Barra Valenzuela
Ing. Civil
Reg. [illegible]

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Mes: junio

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 44/2023 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	15-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 164.408.033	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	34/23	**PRÓRROGA:**	? días +8 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:**	25-jun-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo ? Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 437017				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.394	34.116	81.673.704	-	81.673.704		100%
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	684	74.404	50.892.336	30.535.402	20.356.934		100%
3	Colocacion de hormigon armado -PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	19,9	1.279.705	25.466.130	-	25.466.130		100%
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	35	47.287	1.655.045			1.655.045	100%
5	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	223.390	670.170	670.170			100%
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.394	1.692	4.050.648			4.050.648	100%
					164.408.033				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	31.205.572	127.496.768	5.705.693	164.408.033
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	18,98%	77,55%	3,47%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Claudio Garcia Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 35423

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

Mes: junio

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 44/2023 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

Contrato N°:	34/23		
Monto del Contrato:	₲ 164.408.033	**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	60 días + 32 días +8 días
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	25-jun-24

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 34/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	31.205.572	31.205.572	31.205.572	31.205.572	18,98%	18,98%	18,98%	18,98%
febrero	127.496.768	158.702.340	53.026.416	84.231.988	77,55%	96,53%	32,25%	51,23%
marzo	5.705.693	164.408.033	0	84.231.988	3,47%	100,00%	0,00%	51,23%
abril			0	84.231.988			0,00%	51,23%
mayo			24.502.111	108.734.099			14,90%	66,14%
junio			27.961.094	112.193.082			17,01%	83,14%

CURVA DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

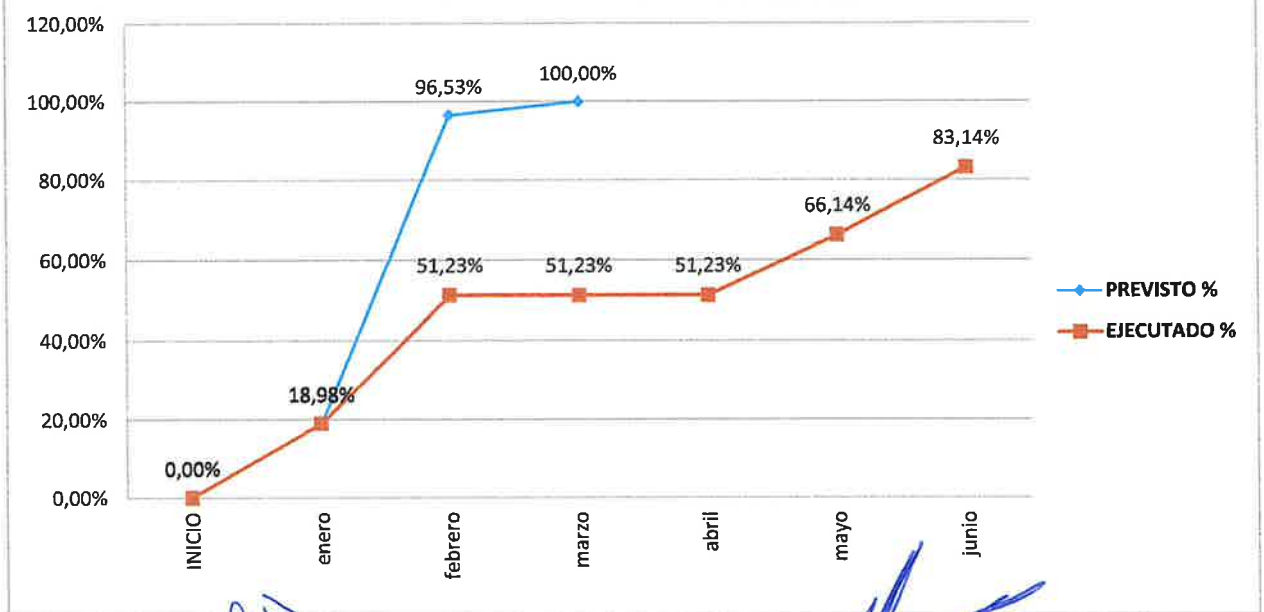

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Claudio Sosa Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3[illegible]

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 08 – Informe certificado final

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA: "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo Distrito de Encarnación" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 34/2023 - I. D. N° 437.017

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Barrio Santo Domingo – Encarnación

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 07/06/2024

AVANCE DE OBRA: 83,14%

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Continuación Colegio Domingo Robledo en el Barrio Santo Domingo	Encarnación	164.408.033 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Noelia Ledesma – IMPACTO CONSTRUCTORA	0985-171-856	34/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PRORROGA DE PLAZO	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
100 días	18/12/2023	25/06/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 25/06/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos:

– Construcción de pavimento tipo empedrado.

– Construcción de badenes

– Cordón escondido 15x30cm de hormigón

El avance total es de 83,14%, no se ha ejecutado el 100% del contrato debido a que los rubros existentes en planilla superan a las cantidades necesarias en obra según los planos correspondientes al llamado. Razón por la cual queda un monto sobrante de la obra.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3962

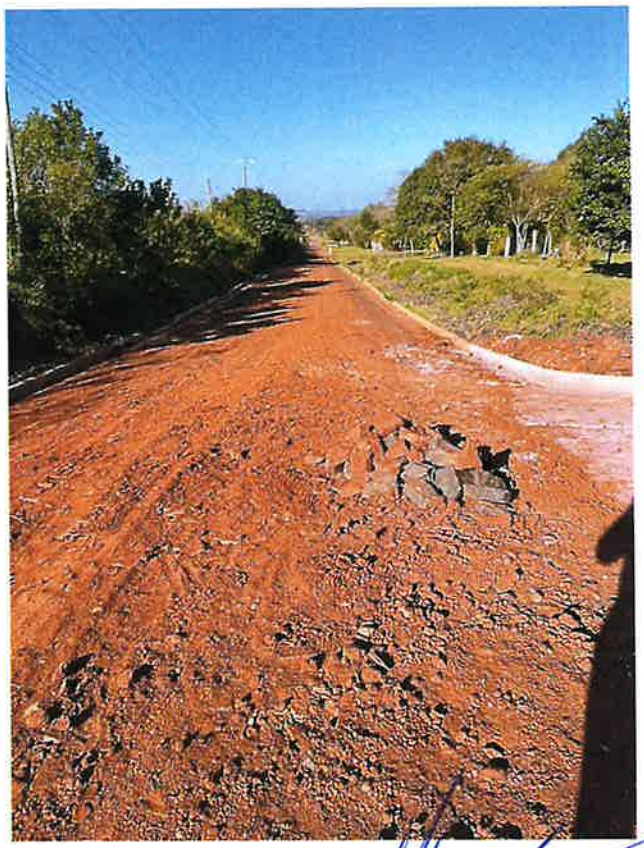

.....

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3[illegible]

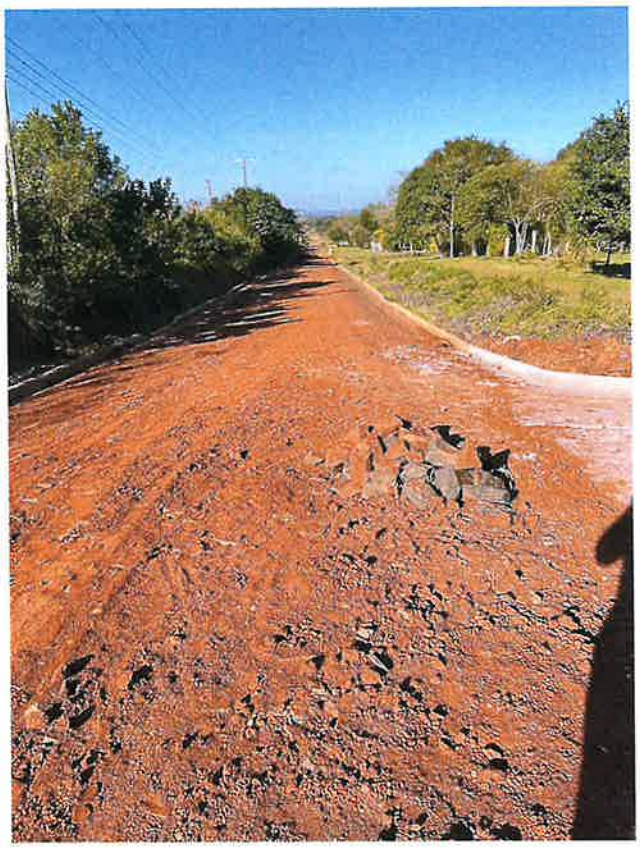

Claudio Garcia Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3943

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
