DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

Asunción, 31 de enero del 2025

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Nro. 14060
Fecha: 31/01/25 Hora: 10:54
Recibido por:

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - UNA

Decano: Prof. Arq. Jose Insfrán.

Dirección Administrativa y Financieras: C.P. Lucio Medina

Por la presente realizamos la solicitud de pago correspondiente a la Certificación N. 6 del contrato principal PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA.

Descripción	Monto
Certificado 6	₲ 735.501.662
Descuento de Anticipo:	₲ 147.100.332
Importe a Pagar	₲ 588.401.330

Importe a Pagar: GS 588.401.330 – (guaraníes quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos un mil trescientos treinta).

Cordialmente

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0983) 402 599

Ing. Ricardo Diaz Martínez

Director Ejecutivo y Representante Legal

Factura electrónica
001-001-0000091

DM CONSTRUCTORA

Dirección: JHON F KENNEDY 1083 1083

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Telefono: 021229869, 0986168553, 0984796861

Email: administracion@diazconstrucciones.com.py

RUC: 310695-0

Timbrado N°: 17287939

Fecha de inicio de vigencia: 13-06-2024

Actividad económica: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS,PREPARACIÓN DEL TERRENO,COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P,CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha y hora de emision: 18-12-2024 14:52:53

Condición de venta: Crédito

Cuotas:

Moneda: PYG

Tipo de cambio global:

Documento asociado CDC o preimpreso:

Tipo de documento asociado:

RUC/Documento de identidad: 80001736-6

Nombre o razón social: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE (U.N.A.)

Dirección: CAMPUS UNIVERSITARIO 1234

Teléfono: 021585558

Correo Electrónico: dylanjesus1412@gmail.com

Tipo de transacción: Prestación de servicios

Fecha de vencimiento: 18-01-2025

Compras públicas

Descripción: CONTRATO Nº 042/2023 PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA- SEDE SAN LORENZO

Modalidad: E9

Entidad: 12345

Año: 23

Secuencia: 1234567

Fecha de emisión del código de contratación: 18-12-2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Exento	IVA 5%	IVA 10%
011	CONTRATO Nº 042/2023- PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA- SEDE SAN LORENZO	1	735.501.662	147.100.332,4	0	0	588.401.330

Subtotal: 588.401.330

Total de la operación: PYG 588.401.330

Liquidación IVA 5%: 0 | Liquidación IVA 10%: 53.491.030 | Total IVA: 53.491.030

Observación: CERTIFICADO DE OBRAS Nº 06- CONTRACTUAL

Consulte la validez de esta Factura electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas
CDC: 01003106950001001000009122024121815068784923
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

C

RESUMEN CERTIFICADO 6

OBRA: PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA - SEDE SAN LORENZO ID 435.469
PROPIETARIO: FACULTAD DE ARQUITECTURA - UNA
CIUDAD: CAMPUS UNIVERSITARIO, SAN LORENZO
CONTRATO N°: ID 435.469
FECHA: 17/12/2024

TOTAL CONTRATO (GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
5.226.000.879	3.136.506.993	735.501.662	3.872.008.655	1.353.992.224	74,1%

TOTAL ANTICIPO(GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
1.045.200.176	627.301.376	147.100.332	774.401.708	270.798.468	74,1%

IMPORTE A PAGAR	**588.401.330**

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel. (0981) 492 599

ING. MIGUEL PALOMINO
REPRESENTANTE EN OBRA DE
CONTRATISTA : DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

ING. RICARDO DIAZ
ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

ARQ. ESTEFANIA NUÑEZ
FISCAL DE OBRA

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA - SEDE SAN LORENZO ID 435.469

Contratista: RICARDO DIAZ MARTINEZ | **Certificado: 006** | **Fecha: 17-12-2024**

DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

							CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE EN %
		TRABAJOS PRELIMINARES											
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	6.147	9.220.500	1500,00	0,00	1.500,00	9.220.500	0	9.220.500	100%
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	4.964.746	4.964.746	1,00	0,00	1,00	4.964.746	0	4.964.746	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	922	1.383.000	1500,00	0,00	1.500,00	1.383.000	0	1.383.000	100%
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	744.712	744.712	1,00	0,00	1,00	744.712	0	744.712	100%
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h min=1,80m	M2	700	49.174	34.421.800	700,00	0,00	700,00	34.421.800	0	34.421.800	100%
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	18.535.051	18.535.051	1,00	0,00	1,00	18.535.051	0	18.535.051	100%
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	2.245.957	2.245.957	1,00	0,00	1,00	2.245.957	0	2.245.957	100%
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1.063.874	1.063.874	1,00	0,00	1,00	1.063.874	0	1.063.874	100%
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1	614.683	614.683	1,00	0,00	1,00	614.683	0	614.683	100%
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	330.983	330.983	1,00	0,00	1,00	330.983	0	330.983	100%
		NIVEL FUNDACIÓN					0,00	0,00		0	0		
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	Unidad	112	2.634.355	295.047.760	112,00	0,00	112,00	295.047.760	0	295.047.760	100%
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	158.871.865	158.871.865	1,00	0,00	1,00	158.871.865	0	158.871.865	100%
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	Unidad	112	122.937	13.768.944	112,00	0,00	112,00	13.768.944	0	13.768.944	100%
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	7.414.020	7.414.020	1,00	0,00	1,00	7.414.020	0	7.414.020	100%
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	39.955	19.977.500	500,00	0,00	500,00	19.977.500	0	19.977.500	100%
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	10.756.949	10.756.949	1,00	0,00	1,00	10.756.949	0	10.756.949	100%
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	15.367	1.536.700	100,00	0,00	100,00	1.536.700	0	1.536.700	100%
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	827.458	827.458	1,00	0,00	1,00	827.458	0	827.458	100%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	1.966.985	786.794.000	400,00	0,00	400,00	786.794.000	0	786.794.000	100%
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	423.658.305	423.658.305	1,00	0,00	1,00	423.658.305	0	423.658.305	100%
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	ML	100	245.873	24.587.300	100,00	0,00	100,00	24.587.300	0	24.587.300	100%
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	13.239.322	13.239.322	1,00	0,00	1,00	13.239.322	0	13.239.322	100%
		TECHO PLANTA BAJO NIVEL +3,60alto				0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
23	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,5	307.342	44.103.577	143,50	0,00	143,50	44.103.577	0	44.103.577	100%
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	23.748.034	23.748.034	1,00	0,00	1,00	23.748.034	0	23.748.034	100%
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0,00	6,00	6,00	0	18.440.484	18.440.484	100%
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0,00	1,00	1,00	0	9.929.491	9.929.491	100%
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	m3	284,3	2.151.390	611.640.177	284,30	0,00	284,30	611.640.177	0	611.640.177	100%
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	1,00	0,00	1,00	331.202.072	0	331.202.072	100%
		NIVEL +1 +7,20				0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
29	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ml	127,1	307.342	39.063.168	127,10	0,00	127,10	39.063.168	0	39.063.168	100%
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	1,00	0,00	1,00	21.033.973	0	21.033.973	100%
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	2.151.390	611.640.177	71,07	213,23	284,30	152.910.044	458.730.133	611.640.177	100%
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	0,25	0,75	1,00	82.800.518	248.401.554	331.202.072	100%
		NIVEL +2 +10,80				0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
35	72131601-015	Pilar. Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ML	127,1	307.342	39.063.168	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
39	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	2.151.390	611.640.177	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0983) 462 599

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

							CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA Incluído)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE EN %
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	331.202.072	331.202.072	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
		NIVEL TECHO											
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas- 3,2 ml)	ML	127,1	307.342	39.063.168	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	21.033.973	21.033.973	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	3.073.414	18.440.484	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	9.929.491	9.929.491	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
45	30101717-001	Viga	ML	435,5	307.342	133.847.441	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	71.998.327	71.998.327	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO G$						5.226.000.879			TOTAL G$	3.136.506.992	735.501.662	3.872.008.654	74,1%

ING. MIGUEL PALOMINO

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0981) 452 599

REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA:
DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ

FISCAL DE OBRA

Arq. Estefanía Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

PROYECTO DE AMPLIACION DE AULAS, COMPONENTE 1 DE LA FADA/UNA - SEDE SAN LORENZO

ID 435.469

Contratista: RICARDO DIAZ MARTINEZ | **ACTA: 006** | **Fecha: 17-12-2024**

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE EN %
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131601-002	Preparacion de obra.Limpieza y preparación de terreno	M2	1.500	1.500,0		1.500,0	100%
2	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1.500	1.500,0		1.500,0	100%
4	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
5	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral. Armado del vallado perimetral - h mín=1,80m	M2	700	700,0		700,0	100%
6	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
7	72131601-002	Preparacion de obra. Preparacion de Obras, armado de obrador y depósito de materiales	GL	1	1,0		1,0	100%
8	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
9	82101502-004	Cartel metalico con soporte. Confección y colocación de Carteles de obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1	1,0		1,0	100%
10	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
		NIVEL FUNDACIÓN			-			
11	72131601-015	Pilar.Pilotes (112 unidades de 6,5 mts de profundidad promedio)	Unidad	112	112,0		112,0	100%
12	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
13	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Desmochado de pilotes	Unidad	112	112,0		112,0	100%
14	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
15	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon.Excavación cabezales y vigas de Fundación (geometricos)	M3	500	500,0		500,0	100%
16	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,00	100%
17	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	M3	100	100,0		100,0	100%
18	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
19	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Cabezales	M3	400	400,0		400,0	100%
20	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,00	100%
21	72131601-004	Colocacion de hormigon armado.Viga de Fundación y Eq.	ML	100	100,0		100,0	100%
22	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
		TECHO PLANTA BAJO NIVEL +3,60alto			-			
23	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,5 ml)	ml	143,5	143,5		143,5	100%
24	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,0	100%
25	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	-	6,00	6,0	100%
26	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-	1,00	1,0	100%

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel. (0983) 452 599

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Arq. Estefanía Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE EN %	
27	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	m3	284,3	284,3		284,30	100%	0,00
28	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,00	100%	
		NIVEL +1 +7,20			-		0,00		
29	72131601-015	Pilar.Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ml	127,1	127,1		127,10	100%	
30	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	1,0		1,00	100%	
31	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	-		0,00	0%	
32	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	
33	72101704-001	Construccion de losa.Losas y Vigas	M3	284,3	71,1	213,23	284,30	100%	
34	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	0,25	0,75	1,00	100%	
		NIVEL +2 +10,80			-		0,00		
35	72131601-015	Pilar. Pilares de H° A° (41 columnas 3,2 ml)	ML	127,1	-		0,00	0%	
36	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	
37	72131601-015	Pilar. Pilares Metalicos	Unidad	6	-		0,00	0%	
38	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	
39	72101704-001	Construccion de losa. Losas y Vigas	M3	284,3	-		0,00	0%	
40	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	
		NIVEL TECHO			-		0,00		
41	72131601-015	Pilar. Pilares Techo (41 Columnas- 3,2 ml)	ML	127,1	-		0,00	0%	
42	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	
43	72131601-015	Pilar.Pilares Metalicos	Unidad	6	-		0,00	0%	
44	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	
45	30101717-001	Viga	ML	435,5	-		0,00	0%	
46	76122405-001	Mano de Obra	GL	1	-		0,00	0%	

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5104
Tel.: (0983) 482 599

ING. MIGUEL PALOMINO

REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA: DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTURA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

ARQ. ESTEFANÍA NUÑEZ

FISCAL DE OBRA

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

G. RADURIA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Lorenzo,31 de enero del 2025

Ref. Entrega de informe avance de obras. 1139
AVANCE DE OBRA

MESA DE ENTRADA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE
Exp.: 14061
Fecha: 31/01/25 Hora: 10:56
Recibido por:

Señor
Prof. Ar. José Insfrán, Decano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – UNA
Presente

Estimado Sr. Decano,

En mi calidad de fiscal de obras del ID Nro. 435.469, me complace dirigirme a usted para entregar el informe analizado del avance de obras en el campo del trabajo, realizado por la empresa Ricardo Diaz Martínez adjudicado en el Marco de Licitación Pública Nacional 01/2023 correspondiente al Proyecto Ampliación de Aulas, componente 1 de la FADA.UNA.

A Continuación, detallo los rubros proyectados a realizar, considerado hasta la fecha jueves 30 de enero del 2025

Avance de encofrado y cargado Bloque 2 y 3 del segundo nivel

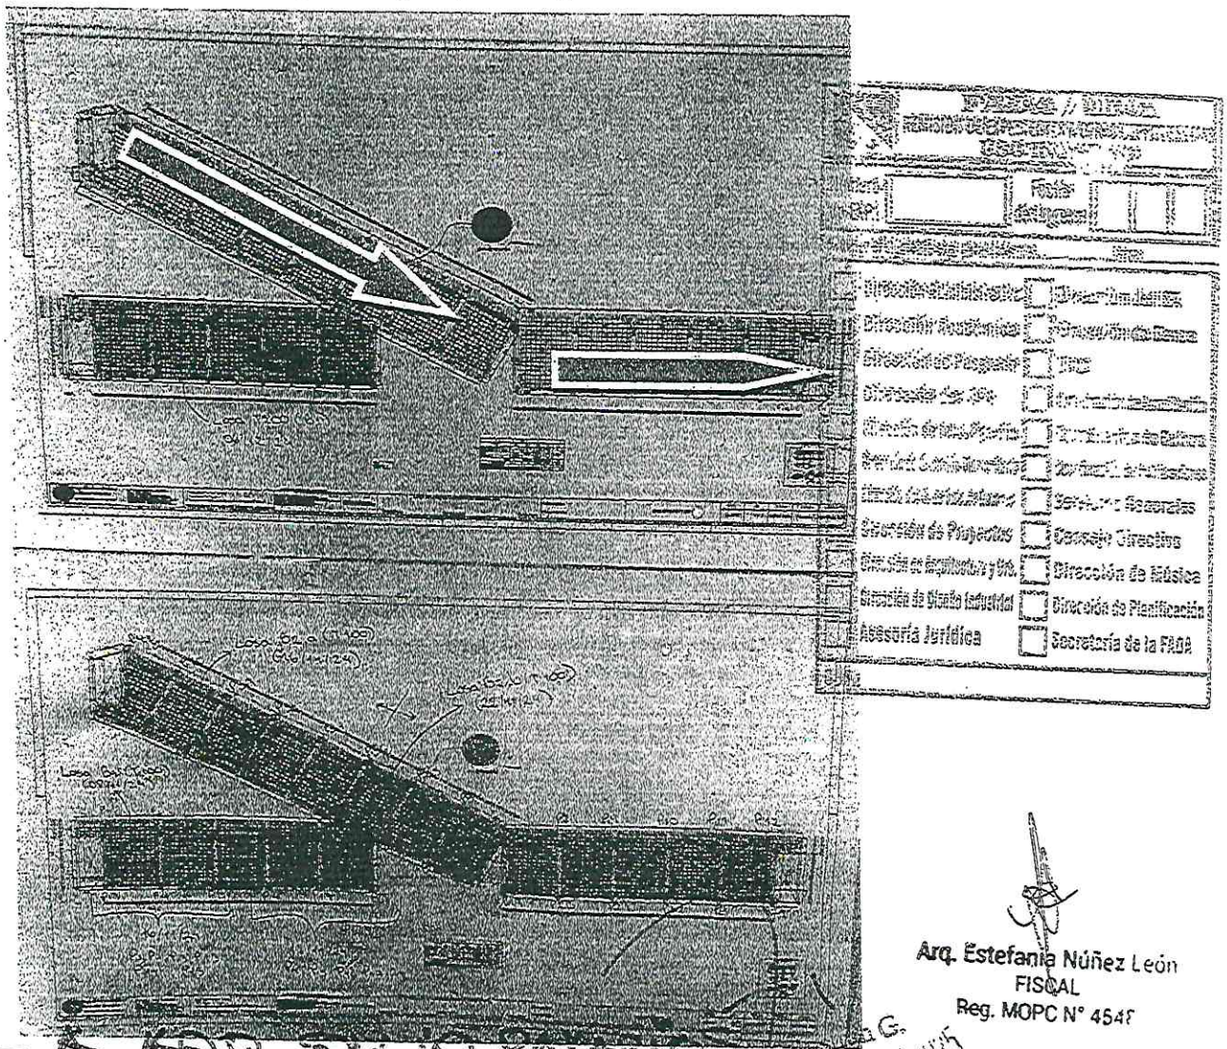

Arq. Estefanía Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

Prof. Arq. José G. Insfrán
Decano

04 FEB 2025

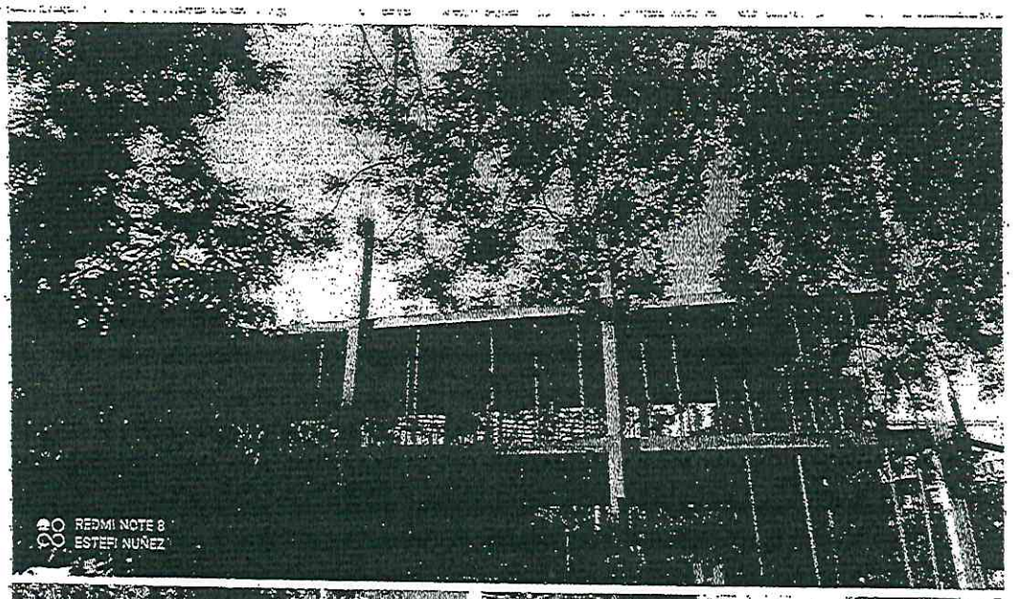

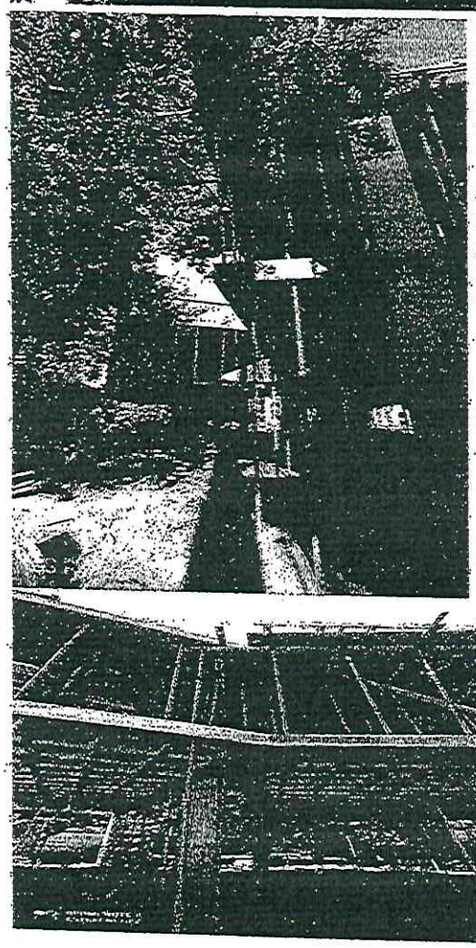

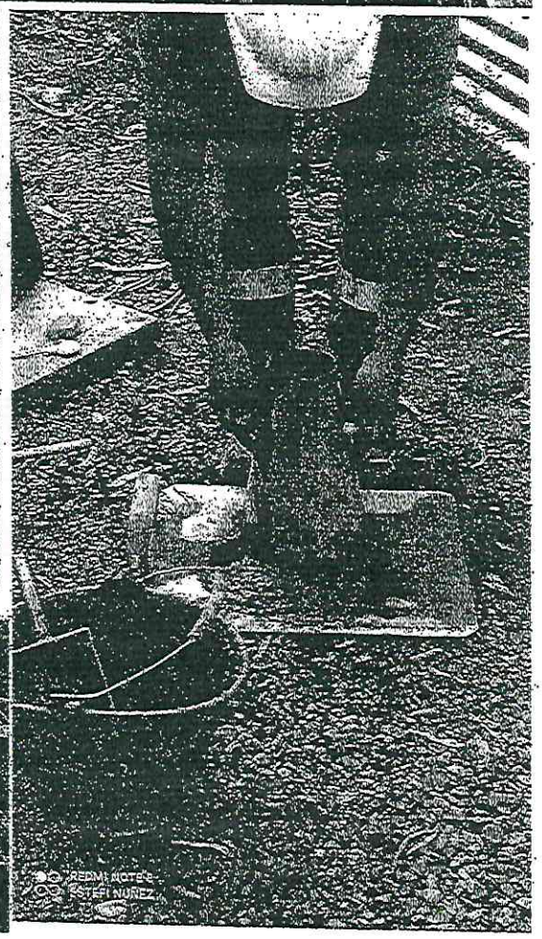

Arq. Estefania Núñez León
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

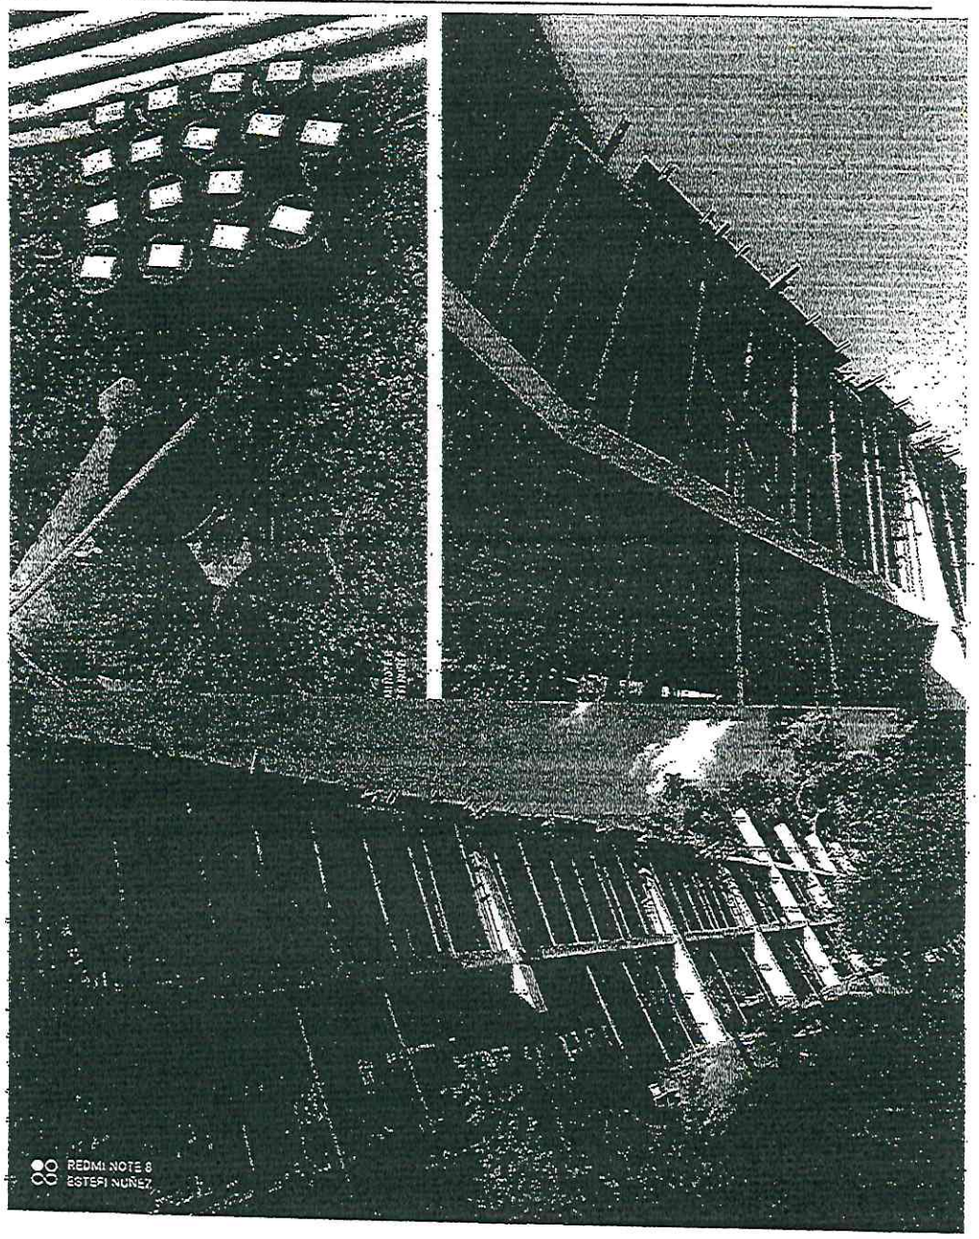

En cuanto al contrato inicial de la ampliación de las aulas, contamos con:

1. Bloque 1: Se culmina cargamento del tercer nivel de pilares.
2. Bloque 2: Se carga la losa del segundo nivel y 6 pilares del tercer nivel.
3. Bloque 3: Se carga la losa del segundo nivel y la colocación de los perfiles IPN en planta baja.

Esperando haber cumplido con la solicitud de este parecer técnico, me despido quedando a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que considere necesaria.

Atentamente.

.....

Prof.Arq.Estefania Nùñez Leòn
Fiscalizaciòn FADA/UNA
ID Nro.435.469

Arq. Estefania Núñez Leó
FISCAL
Reg. MOPC N° 4548

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

San Lorenzo, 03 de febrero del 2025.

Prof. Arq. **JOSE GREGORIO INSFRÁN GUERRERO** – Decano. -

FADA – UNA .-

Presente

Por la presente informo que se ha procedido a la verificación del Certificado de Obra N° 6 presentado por la empresa RDM Construcciones encargada de la obra "Ampliación del Bloque de Aulas-Etapa 1" LPN 01/2023, ante las verificaciones le informo que corresponde el pago a la empresa en virtud a los ítems de avances informados.

Le saludo cordialmente.

Arq. JULIO PALACIOS BARRIOCANAL.
Supervisor de Obra

Prof. Arq. José G. Insfrán

C.P. Lucio Medina
Director Administrativo Interino
