Informe Técnico de Fiscalización N°23/2023

A: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Fiscal de obras-

Ref.: **OBRAS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, ETAPA 2.", adjudicado según contrato N°22/2.023",**

Fecha: 27/06/2023.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras correspondiente al **CONTRATO DE OBRA N° 22/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN A CONTRATACION DIRECTA N°18/2023 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, ETAPA 2" CON ID N° 428659,** adjudicada a la firma **CONSTRUFER S.A.**, a fin de informar los avances de los trabajos realizados hasta la fecha en el marco del contrato detallado anteriormente, y el estado de los mismos en relación al cronograma de ejecución presentado por la empresa contratista. Se aprovecha la ocasión para informar un total del 100% de avance ejecución Conforme acta de medición de realizada.

Dicho esto, se cumple en informar que los trabajos ya ejecutados por parte de la empresa contratista son parte de los rubros contractuales.

En cuanto a los cordones de hormigón que son para acceso a los domicilios ha sido deducido para los pagos visto que el proyecto no contempla en costos un monto plasmado.

También se menciona que la medición realizada a dado menor cantidad de empedrado no habiendo más a donde continuar con los mismos de modo a que se deberá abonar por lo ejecutado.

El avance ha sido en tiempo y forma y con normalidad.

Para el efecto se presenta los siguientes documentos respaldatorios.

- **Acta de Medición.**
- **Tomas Fotográficas.**
- **Planos de medición.**

PROCESADO

Es mi informe

Ing. Benigno D. Ramirez L.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Veintisiete días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Lic. Juan Acosta en representación de la firma CONSTRUFER S.A, a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **"Obras: "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, ETAPA 2."** Adjudicataria según **Contrato N° 22/2023**.Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 26 de Junio del 2023 correspondiente al Certificado de Obra N° 1 en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

Empedrado

Tramo 1

Longitud	=	97,00m
Ancho	=	8,00m
Superficie	**=**	**776,00m2**

Tramo 2

Longitud	=	26,50m
Ancho	=	8,00m
Superficie	**=**	**212,00m2**

Area 3

Bocacalle = $\left(\frac{16,00+8,00}{2}\right)$x3,50 = **42,00m2**

SUP. Total = **1030,00m2**

PROCESADO

Cordones Bajos

Tramo 1

8x4	=	32,00ml
BCC	=	8,00ml
Borde	=	8,00ml
Sub Total	**=**	**48,00ml**
Sub 8+4+4+5	=	21,00ml
Total	**=**	**69,00ml**

Tramo 2

4x3	=	12,00ml
4	=	4,00ml
Total	=	16,00ml
Total	=	85,00ml/2
Neto	=	42,50m

Cordones Neto

157+81 = 238 - 42,50 = 195,50ml

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Contratista: CONSTRUFER S.A.

Ing. Benigno D. Ramirez L
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Fiscalización de Obras.

PLANO DE MEDICION

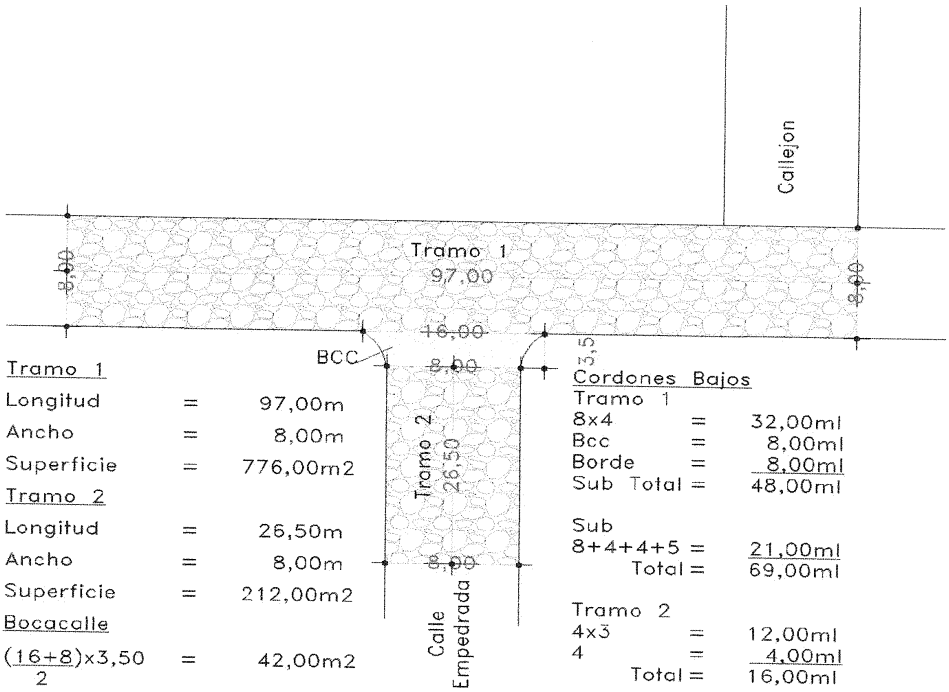

Tramo 1

Longitud	=	97,00m
Ancho	=	8,00m
Superficie	=	776,00m2

Tramo 2

Longitud	=	26,50m
Ancho	=	8,00m
Superficie	=	212,00m2

Bocacalle

$\frac{(16+8)}{2}$x3,50	=	42,00m2
Total	=	1030,00m2

Cordones Bajos

Tramo 1

8x4	=	32,00ml
Bcc	=	8,00ml
Borde	=	8,00ml
Sub Total	=	48,00ml
Sub 8+4+4+5	=	21,00ml
Total	=	69,00ml

Tramo 2

4x3	=	12,00ml
4	=	4,00ml
Total	=	16,00ml
Total	=	85,00ml/2
Neto	=	42,50ml

Cordones Neto

157 + 81 = 238 − 42,50

= 195,50ml

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez E
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO

TOMAS FOTOGRAFICAS

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Benigno D. Ramírez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

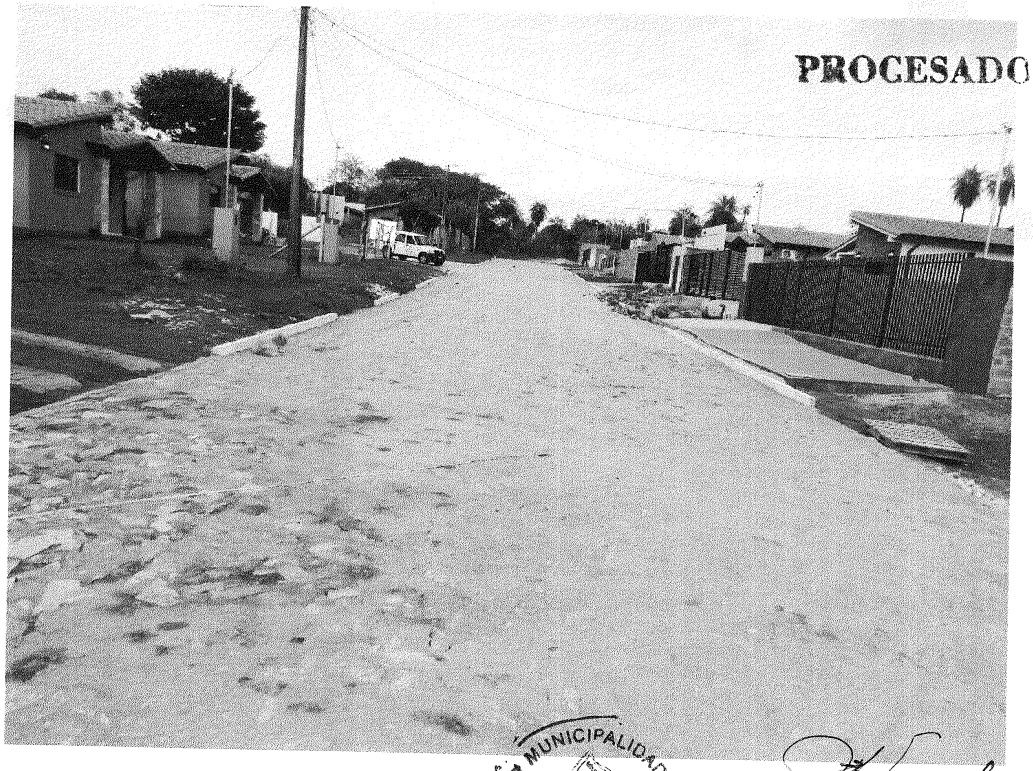

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez E
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO
