GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 04

Mes: Mayo

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LOTE N° 3** - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Mendez Fleitas - Tramo 3	100,00%	247.209.881	83,15%	205.543.409	12,10%	29.912.931	95,25%	235.456.340
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**247.209.881**	83,15%	**205.543.409**	12,10%	**29.912.931**	95,25%	**235.456.340**

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	49.441.976	41.108.682	5.982.586	47.091.268
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**49.441.976**	**41.108.682**	**5.982.586**	**47.091.268**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				23.930.345	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**23.930.345**	

SON GUARANIES: Veintitres millones novecientos treinta mil trescientos cuarenta y cinco.

Certificado Básico Nº 04

Mes: Mayo

Contrato N°: 29/2023

Monto Básico: 247.209.881 gs

Contratista: Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta

Fecha de Inicio: 20/Diciembre/2023

Plazo de Ejecución: 105 dias

Prorrogas: 30 dias - Resolución N° 328/2024
40 días - Resolución N° 612/2024

Fecha de Terminación: 12/Junio/2024

Poliza Anticipo - Vigencia hasta: 10/Julio/2024

Poliza Ejec. Contrato - Vigencia hasta: 10/Julio/2024

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista

ITINERA S.A
RUC:80072876-6

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

20

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO N° 04

CONTRATO N° 29/2023

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863 - LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.

CONTRATISTA: Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz - Itinera S.A.

En la Ciudad de San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 04 días del mes de junio del año 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Arq. Hernán Morínigo, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz, representante legal de la empresa Itinera S.A, para la;

- **Lote N° 3** - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de mayo del corriente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. –

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Itinera S.A.
Contratista
ITINERA S.A.
RUC: 80072876-9

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

03

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 29/2023
MONTO DE LA OFERTA: 247.209.881 gs	**PLAZO:** 105 dias + 30 dias + 40 dias
LOTE N°: 3	**FECHA DE MEDICIÓN:** 04/06/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 04						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 04					
LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Mendez Fleitas - Tramo 3				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	0,005	100%	0%	100%	0,005	0,000	0,005	1,00	0	1,00	1.183.175	0	1.183.175
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794	0,015	100%	0%	100%	0,015	0,000	0,015	1,00	0	1,00	3.782.794	0	3.782.794
3	Preparacion de obra - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	320	7.175	2.296.000	0,009	100%	0%	100%	0,009	0,000	0,009	320,00	0	320	2.296.000	0	2.296.000
4	Preparacion de obra - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	1.344	19.174	25.769.856	0,104	100%	0%	100%	0,104	0,000	0,104	1.344,00	0	1.344	25.769.856	0	25.769.856
5	Preparacion de obra - Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	960	33.756	32.405.760	0,131	100%	0,00%	100%	0,131	0,000	0,131	960,00	0	960	32.405.760	0	32.405.760
6	Preparacion de obra - Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	96	28.703	2.755.488	0,011	0%	46,88%	47%	0,000	0,005	0,005	0,00	45	45,00	0	1.291.635	1.291.635
7	Construcción de empedrado Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	2.816	32.374	91.165.184	0,369	68,75%	25,00%	93,75%	0,254	0,092	0,346	1.936,00	704	2.640	62.676.064	22.791.296	85.467.360
8	Construcción de empedrado -Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	2.816	7.095	19.979.520	0,081	100%	0%	100%	0,081	0,000	0,081	2.816,00	0	2.816	19.979.520	0	19.979.520
9	Construcción de empedrado -Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Milímetros cuadrados	2.816	2.650	7.462.400	0,030	0%	78,13%	78%	0,000	0,024	0,024	0,00	2.200	2.200,00	0	5.830.000	5.830.000
10	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,78	1.024.954	799.464	0,003	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Construcción de empedrado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor	Metro lineal	640	86.391	55.290.240	0,224	100%	0,00%	100%	0,224	0,000	0,224	640,00	0	640	55.290.240	0	55.290.240
12	Limpieza Inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.200	1.350	4.320.000	0,017	50%	0%	50%	0,009	0,000	0,009	1.600,00	0	1.600	2.160.000	0	2.160.000
Total					**247.209.881**	**100%**				**83,15%**	**12,10%**	**95,25%**				**205.543.409**	**29.912.931**	**235.456.340**

Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz
Contratista
ITINERA S.A
RUC:80072976-6

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863 - LOTE N° 3

Contrato N°: 29/2023	
Monto del Contrato: 247.209.881 gs	**Term. Prevista:** 12/Junio/2024
Plazo Contractual: 105 dias	**Prorrogas:** 30 dias - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024
Inicio de Obra: 20/Diciembre/2023	**Mes:** Mayo

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 29/2023

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DICIEMBRE	4.965.969	4.965.969	4.965.969	4.965.969	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%
ENERO	44.268.736	49.234.705	44.268.736	49.234.705	17,91%	19,92%	17,91%	19,92%
FEBRERO	36.202.880	85.437.585	17.953.320	67.188.025	14,64%	34,56%	7,26%	27,18%
MARZO	82.619.315	168.056.900	107.017.352	174.205.377	33,42%	67,98%	43,29%	70,47%
ABRIL	34.635.707	202.692.608	31.338.032	205.543.409	14,01%	81,99%	12,68%	83,15%
MAYO	31.080.755	233.773.363	29.912.931	235.456.340	12,57%	94,56%	12,10%	95,25%
JUNIO	13.436.518	247.209.881			5,44%	100,00%		

CURVA DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

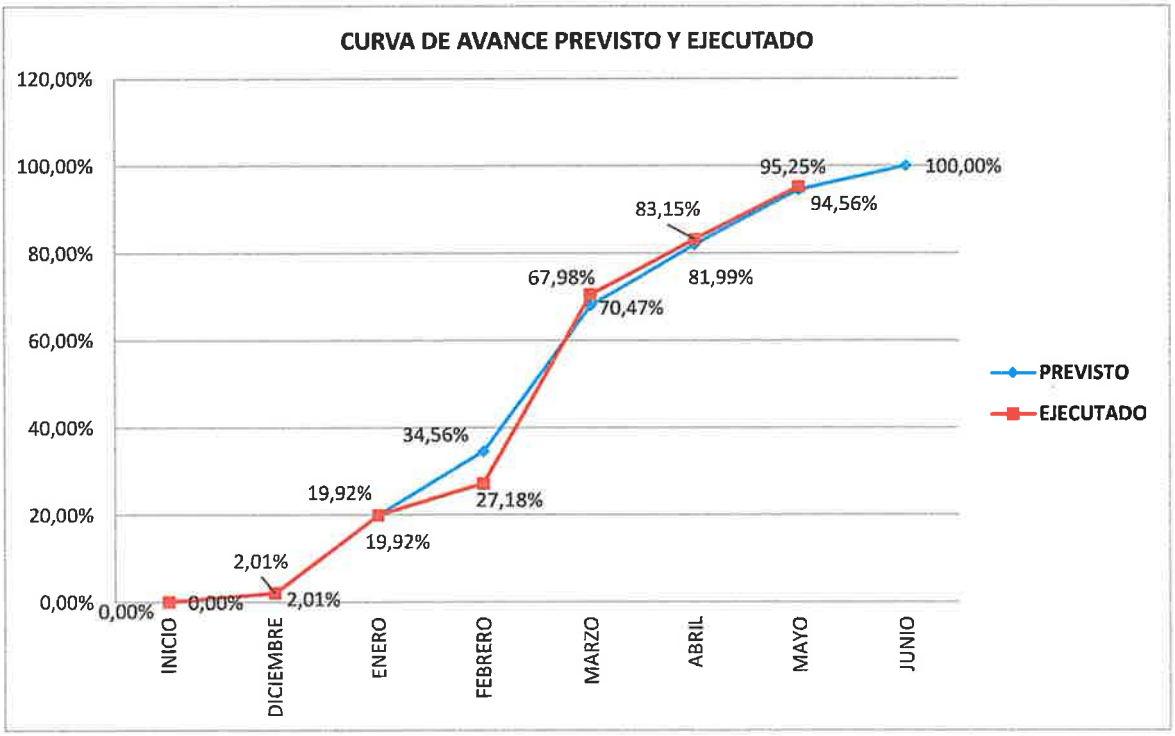

Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz
CONTRATISTA
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

05

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 29/2023
MONTO DE LA OFERTA: 247.209.881 gs	**PLAZO:** 105 dias + 30 dias + 40 dias
LOTE N°: 3	**FECHA DE MEDICIÓN:** 04/06/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 105 dias + 30 dias + 40 dias							**TOTAL**
LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Mendez Fleitas - Tramo 3				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta		**DICIEMBRE 20/12/2023**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO 12/06/2024**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**								
1	Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	1.183.175							100%
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794	3.782.794							100%
3	Preparacion de obra - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	320	7.175	2.296.000		2.296.000						100%
4	Preparacion de obra - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	1.344	19.174	25.769.856		25.769.856						100%
5	Preparacion de obra - Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	960	33.756	32.405.760		16.202.880	16.202.880					100%
6	Preparacion de obra - Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	96	28.703	2.755.488					2.755.488			100%
7	Construcción de empedrado Empedrado de piedra basalto-	Metros cuadrados	2.816	32.374	91.165.184				27.349.555	27.349.555	27.349.555	9.116.518	100%
8	Construcción de empedrado -Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	2.816	7.095	19.979.520				19.979.520				100%
9	Construcción de empedrado -Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Milímetros cuadrados	2.816	2.650	7.462.400					3.731.200	3.731.200		100%
10	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,78	1.024.954	799.464					799.464			100%
11	Construcción de empedrado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	640	86.391	55.290.240			20.000.000	35.290.240				100%
12	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.200	1.350	4.320.000							4.320.000	100%
Total					**247.209.881**								

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	4.965.969	44.268.736	36.202.880	82.619.315	34.635.707	31.080.755	13.436.518	**247.209.881**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	2,01%	17,91%	14,64%	33,42%	14,01%	12,57%	5,44%	**100%**

Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz
Contratista
ITINERA S.A.
RUC:80072876-0

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Villa Adela - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 04/junio/2024
AVANCE DE OBRA: 95.25 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 579922 - 7031633	247.209.881 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	L 3
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
105 días	20/Diciembre/2023	12/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de ejecución.
Se ha realizado la provisión de tierra para colchón de empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica negra. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones por la cual la obra cuenta con poco avance.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras
Arq. FÉLIX H. MORINIGO Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 3.265

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES www.itapua.gov.py
Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Gral. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Fiscalización de Obras

Itapúa
lugar de
OPORTUNIDADES
www.itapua.gov.py

Teléf: +595717204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. [illegible] Herrazabal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
