Integración Global

INFORME TECNICO - ORDENAMIENTO DE PATCH CORD DE COBRE Y ÓPTICO ADENTRO DE LOS RACKS

Cliente: Corte Suprema de Justicia
Dirección: Mariano Roque Alonso e/ Testanova y De la Conquista
Ciudad: Asunción
Fecha de Trabajo Realizado: 08/03/2024
Fecha de Informe: 11/03/2024

Detalle de trabajos preventivos

1.4.1 Realizar las verificaciones y ordenamientos de todos los puntos de interconexión por medio de patch cord RJ45 par de cobre para dejar de forma prolija e identificada.
1.4.2 Realizar las verificaciones y ordenamientos de todos los puntos de interconexión por medio de patch cord óptico para dejar de forma prolija e identificada.
1.4.3 Limpieza para retirar partículas del Data Center.
1.4.4 Informe técnico del estado general del Rack y Cableado.

Estado actual de los racks

Los se realizaron las verificaciones de los puntos de interconexión de cableado de los racks, las mismas se encuentran ordenados correctamente, se realizó limpieza general del data center para retirar partículas del data center.

Técnicos Intervinientes por TEISA
Elias Lopez – Electromecanica
Ricardo Ruiz – Electromecanica
Visita presencial el viernes 08/03/2024 de 09:00 a 13:00 horas.

Encargado del Cliente
Ing. Manuel Torres Rivas.

Fin del informe

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica
TEISA

Manuel Torres R

Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC

Integración Global

INFORME – PISO TÉCNICO

Cliente: Corte Suprema de Justicia
Dirección: Mariano Roque Alonso e/ Testanova y De la Conquista
Ciudad: Asunción
Fecha de Trabajo Realizado: 08/03/2024
Fecha de Informe: 11/03/2024

Detalle de trabajos preventivos

1.3.1 Ajustes de las baldosas.
1.3.2 Ajuste de las terminaciones perimetrales.
1.3.3 Informe técnico del estado del Piso Técnico.

Estado actual de las baldosas

Las baldosas de los pasillos calientes y pasillo frío se encuentran en buenas condiciones sin fallas.
Observaciones: Se realizó una limpieza general de las baldosas del Data Center y ante sala - Data Center, se realizó ajustes de baldosas del ante sala (NOC).

Baldosas en ante sala – Data Center

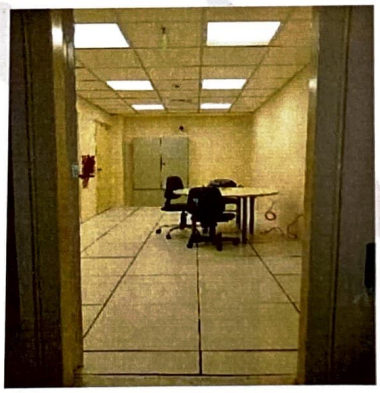

Técnicos Intervinientes por TEISA
Elías López – Electromecánica.
Ricardo Ruiz – Electromecánica.
Visita presencial viernes 08/03/2024 de 09:00 hs a 13:00 hs.

Manuel Torres R.
Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC

Encargado del Cliente
Ing. Manuel Torres Rivas.
Fin del informe.

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica
TEISA

Integración Global

INFORME TECNICO – SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS

Cliente: Corte Suprema de Justicia
Equipo: Extinción automática de Incendios NAFS - 125
Dirección: Mariano Roque Alonso e/ Testanova y De la Conquista
Ciudad: Asunción
Fecha de Trabajo Realizado: 08/03/2024
Fecha de Informe: 11/03/2024

DETALLE DE TRABAJOS PREVENTIVOS

1.2.1 Revisión, mantenimiento y prueba de funcionamiento de la central de comando y disparo del sistema de extinción automática de incendio.
1.2.2 Verificación del cableado.
1.2.3 Verificación de detectores de detección cruzada.
1.2.4 Verificación de accionadores manuales.
1.2.5 Verificación de sirenas avisadores acústicos visuales.
1.2.6 Ajustes de tiempos del sistema.
1.2.7 Revisión de presión.
1.2.8 Revisión de electroválvula.
1.2.9 Revisión de ductos y toberas de descarga.
1.2.10 Prueba general del sistema de alarma de extinción automática de incendios.
1.2.11 Informe técnico del estado de los equipos.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

El Sistema de Detección y Supresión de Incendios se encuentra operando sin inconvenientes, se verificaron los cableados, los detectores de detección cruzada, se verificaron los accionadores manuales, se verificaron las sirenas de avisadores acústicos visuales, se revisó la presión, la electroválvula. Se han realizado pruebas de funcionamiento, accionamiento de detectores, verificación de tiempo de descarga y el sistema respondió correctamente a cada prueba realizada.

Manuel Torres R
Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica
TEISA

Limpieza de detectores

Conteo del panel para descarga

Técnicos Intervinientes por TEISA

Elías López – Electromecánica.

Ricardo Ruiz – Electromecánica

Visita presencial viernes 08/03/2024 de 09:00 hs a 13:00 hs.

Encargado del Cliente

Ing. Manuel Torres Rivas

Fin del informe.

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica
TEISA

Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC

Integración Global

INFORME TECNICO – AIRES DE PRECISION

Cliente: Corte Suprema de Justicia
Equipos: Aire Acondicionado STULZ ASD 281 A (tres unidades)
Dirección: Mariano Roque Alonso e/ Testanova y De la Conquista
Ciudad: Asunción
Fecha de Trabajo Realizado: 08/03/2024
Fecha de Informe: 11/03/2024

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

1.1.1 Limpieza de filtros.
1.1.2 Limpieza del Sistema Humidificador.
1.1.3 Limpieza de Filtros de Agua/Humidificador.
1.1.4 Control de rendimiento.
1.1.5 Control de consumo del compresor/es.
1.1.6 Control de consumo del ventilador/es.
1.1.7 Control de gas refrigerante.
1.1.8 Verificación de drenaje (equipos).
1.1.9 Verificación de serpentines.
1.1.10 Inspección de correas.
1.1.11 Inspección de aislación/es.
1.1.12 Inspección de contactores.
1.1.13 Informe técnico del estado de los equipos.

ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS

Los Aires Acondicionados de Precisión N°1, N°2 y N°3 se encuentran en servicio y operando correctamente en modo rotación. Se realizaron pruebas de funcionamiento con resultados favorables.
Observaciones: Se realizo limpieza del sistema humidificador, de los filtros de aire de los tres equipos de Aires Acondicionados de Precisión agua/humidificador, se controlo el consumo de los comprensores, el consumo del ventilador, del gas refrigerante, se verificaron los drenajes, los serpentines, se inspección las correas, la aislación y contactores

Manuel Torres R
Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica

Limpieza de humidificador

Limpieza de condensadores

Limpieza de Filtros

Técnicos Intervinientes por TEISA

Elías López – Electromecanica.

Ricardo Ruiz – Electromecanica.

Visita presencial viernes 08/03/2024 de 09:00 hs a 13:00 hs.

Encargado del Cliente

Ing. Manuel Torres Rivas

Fin del informe.

Manuel Torres R

Ricardo Ruiz
Técnico de Electromecánica

Manuel Torres
Técnico
Dirección de TIC
