**GOBERNACION DE ITAPÚA**
**RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 4**

**MES: MARZO**

| Posición | Conceptos | Importes Autorizados | | Importes Certificados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hasta Certificado Anterior | | Presente Certificado | | Total Certificado a la Fecha | |
| | | % | (1) | % Avance de Obra | (2) | % Avance de Obra | (3) | % Avance de Obra | (2+3) |
| **A** | Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario | | | | | | | | |
| A.I | CONTRATO N° 84/2024 - MENOR CUANTIA NACIONAL N° 32/2024 "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANÁ-PLURIANUAL" ID: 456.004 | 100% | 190.999.999 | 65,67% | 125.422.720 | 21,42% | 40.907.279 | 87,08% | 166.329.999 |
| | | | | | | | | | |
| **A** | **Total por Contrato** | **100%** | **190.999.999** | **65,67%** | **125.422.720** | **21,42%** | **40.907.279** | **87,08%** | **166.329.999** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | **Deducciones a la fecha** | | | **Hasta Certificado Anterior** | **Presente Certificado** | **Total Certificado a la Fecha** |
| B.I | Devolución de Anticipo | *20,00%* | 38.200.000 | 25.084.544 | 8.181.456 | 33.266.000 |
| B.II | Para Fondo de Reparo | *0,00%* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B** | **Total Deducciones** | | **38.200.000** | **25.084.544** | **8.181.456** | **33.266.000** |
| **C.I** | **Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)** | | | | 32.725.823 | |
| **C.II** | Multas | | | | 0 | |
| **C** | **Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)** | | | | **32.725.823** | |

| | |
|---|---|
| Certificado Básico Nº | 4 |
| Mes: | MARZO |
| Contrato N°: | 84/2024 |
| Monto Básico: | 190.999.999 |
| Contratista: | JESUS MANUEL ESQUIVEL |
| Fecha de Inicio: | 02-dic-24 |
| Plazo de Ejecución: | 210 DIAS |
| Fecha de terminación: | 29-jun-25 |
| Prórroga / Suspensión de plazo: | ---------- |
| Fecha de terminación prevista: | ---------- |
| Vigencia Póliza Contrato: | 03-ene-26 |
| Vigencia Póliza Anticipo: | 03-ene-26 |

**SON GUARANIES: Treinta y dos millones setecientos veinticinco mil ochocientos veintitrés.-**

Jesus Manuel Esquivel
**Contratista-Representante Legal**
JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
CEL 0983 224 314

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
**Gobernación de Itapúa**

Ing. Justi Eckert
Reg. Prof. N° 4.067
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
**Gobernación de Itapúa**

JAVIER PEREIRA — ITAPÚA

**CERTIFICADO BÁSICO N° 4**
**PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO**
**MES: MARZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N° 84/2024 - MENOR CUANTIA NACIONAL N° 32/2024 "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANÁ-PLURIANUAL" ID: 456.004** | | | |
| **EMPRESA CONTRATISTA:** | **JESUS MANUEL ESQUIVEL** | **FECHA DE PRESENTANCION:** | **09-may-25** |
| **MONTO DE LA OFERTA:** | **190.999.999 GS.** | **FECHA DE INICIO:** | **02-dic-24** |
| **CONTRATO N°:** | **84/2024** | **FECHA DE TERMINACION:** | **29-jun-24** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **210 DIAS** | **DIAS TRANSCURRIDOS:** | **159 DIAS** |

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS | | | | | | PLANILLA DE MEDICIÓN | | | | | | PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANÁ-PLURIANUAL" ID: 456.004 | | | | | | EN PORCENTAJE | | | EN INCIDENCIA | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | CANTIDAD EJECUTADA EN GS. | | |
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) | Precio total | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno. | Metros cuadrados | 53,35 | 6.000 | 320.100 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | - | 0,002 | 53,35 | 0,00 | 53,35 | 320.100 | - | 320.100 |
| 2 | Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva. | Unidad | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,006 | - | 0,006 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 3 | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 53,35 | 6.000 | 320.100 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | - | 0,002 | 53,35 | 0,00 | 53,35 | 320.100 | - | 320.100 |
| 4 | Vallado de obra 2,00 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros. | Metro lineal | 32,28 | 70.000 | 2.259.600 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,012 | - | 0,012 | 32,28 | 0,00 | 32,28 | 2.259.600 | - | 2.259.600 |
| 5 | Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata). | Metros cúbicos | 10,74 | 55.000 | 590.700 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,003 | - | 0,003 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | 590.700 | - | 590.700 |
| 6 | Relleno de tierra y compactación | Metros cúbicos | 28,67 | 70.000 | 2.006.900 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,011 | - | 0,011 | 28,67 | 0,00 | 28,67 | 2.006.900 | - | 2.006.900 |
| 7 | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8 | Obrador | Unidad | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,013 | - | 0,013 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| 9 | Desmonte de aberturas | Unidad | 1,00 | 30.000 | 30.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,000 | - | 0,000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 30.000 | - | 30.000 |
| 10 | Demolicón de mamposterías de 0,15cm | Metros cuadrados | 3,84 | 20.000 | 76.850 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,000 | - | 0,000 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 76.850 | - | 76.850 |
| 11 | Zapata de HºAº, fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 1,42 | 2.000.000 | 2.840.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,015 | - | 0,015 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 2.840.000 | - | 2.840.000 |
| 12 | Encadenado inferior de HºAº, 20x30cm fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 2,34 | 2.000.000 | 4.680.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,025 | - | 0,025 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 4.680.000 | - | 4.680.000 |
| 13 | Columnas de HºAº 20x20cm fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 0,78 | 2.200.000 | 1.716.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,009 | - | 0,009 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 1.716.000 | - | 1.716.000 |
| 14 | Encadenado superior de HºAº 0,15x0,30 cm, fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 1,65 | 2.200.000 | 3.630.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,019 | - | 0,019 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 3.630.000 | - | 3.630.000 |
| 15 | Mampostería de nivelación de 0,30 cm ladrillos comunes | Metros cuadrados | 11,72 | 150.000 | 1.758.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,009 | - | 0,009 | 11,72 | 0,00 | 11,72 | 1.758.000 | - | 1.758.000 |
| 16 | Aislación asfáltica de paredes de 0,15m en U con pintura asfáltica a tres manos | Metro lineal | 39,06 | 22.000 | 859.320 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,004 | - | 0,004 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 859.320 | - | 859.320 |
| 17 | Mampostería de ladrillos prensados de 21 agujeros de 1ra visto | Metros cuadrados | 66,36 | 150.000 | 9.954.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,052 | - | 0,052 | 66,36 | 0,00 | 66,36 | 9.954.000 | - | 9.954.000 |
| 18 | Mampostería de ladrillos prensado comunes de 0,15m para revocar. | Metros cuadrados | 70,17 | 140.000 | 9.823.800 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,051 | - | 0,051 | 70,17 | 0,00 | 70,17 | 9.823.800 | - | 9.823.800 |
| 19 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). | Metro lineal | 14,90 | 25.500 | 379.950 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | - | 0,002 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 379.950 | - | 379.950 |
| 20 | Construcción/Colocación - Techo en chapa termoacústica de 40mm N°27, color a definir en la parte superior, color blanco en la parte inferior. Sobre estructura de metal. Con pintura antióxido 3x1, acabado color blanco. | Metros cuadrados | 61,05 | 300.000 | 18.315.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,096 | - | 0,096 | 61,05 | 0,00 | 61,05 | 18.315.000 | - | 18.315.000 |
| 21 | Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética, con sujeción de planchuelas de 1/2, espesor 1,2mm | Metro lineal | 11,00 | 95.000 | 1.045.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | - | 1.045.000 | 1.045.000 |
| 22 | Babeta chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 21,00 | 80.000 | 1.680.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,009 | - | 0,009 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1.680.000 | - | 1.680.000 |
| 23 | Cumbrera de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 5,50 | 80.000 | 440.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | - | 0,002 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 440.000 | - | 440.000 |
| 24 | Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética. | Metro lineal | 14,00 | 95.000 | 1.330.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,007 | 0,007 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | - | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 25 | Revoques de pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo | Metros cuadrados | 28,42 | 40.000 | 1.136.800 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,006 | - | 0,006 | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 1.136.800 | - | 1.136.800 |
| 26 | Revoques de pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo | Metros cuadrados | 224,34 | 40.000 | 8.973.600 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,047 | - | 0,047 | 224,34 | 0,00 | 224,34 | 8.973.600 | - | 8.973.600 |
| 27 | Alfeizar de aberturas - (Recuadro de vanos). | Metro lineal | 21,10 | 25.000 | 527.500 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,003 | - | 0,003 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 527.500 | - | 527.500 |
| 28 | Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm de espesor | Metros cuadrados | 45,80 | 40.000 | 1.832.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,010 | - | 0,010 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 1.832.000 | - | 1.832.000 |
| 29 | Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3) | Metros cuadrados | 45,80 | 35.000 | 1.603.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,008 | - | 0,008 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 1.603.000 | - | 1.603.000 |
| 30 | Piso cerámica antideslizante PEI 5 45x45cm | Metros cuadrados | 48,62 | 95.000 | 4.618.900 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,024 | 0,024 | 0,00 | 48,62 | 48,62 | - | 4.618.900 | 4.618.900 |
| 31 | Zócalo de cerámica h: 8cm. | Metro lineal | 62,60 | 30.000 | 1.878.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,010 | 0,010 | 0,00 | 62,60 | 62,60 | - | 1.878.000 | 1.878.000 |
| 32 | Revestido de cerámica, color blanco | Metros cuadrados | 11,40 | 100.000 | 1.140.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,006 | 0,006 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | - | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 33 | Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210. | Unidad | 7,00 | 850.000 | 5.950.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,031 | - | 0,031 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5.950.000 | - | 5.950.000 |
| 34 | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x1,20m. | Unidad | 3,00 | 1.000.000 | 3.000.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,016 | - | 0,016 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| 35 | Provisión y colocación de ventanas de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,45x0,40m | Unidad | 2,00 | 850.000 | 1.700.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,009 | 0,009 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | - | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 36 | Pintura Pared exterior al látex acrílico con enduido, color a elegir (mínimo 2 manos) | Metros cuadrados | 28,42 | 35.000 | 994.700 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 28,42 | 28,42 | - | 994.700 | 994.700 |
| 37 | Pintura Pared interior al látex acrílico con enduido, color a elegir (mínimo 2 manos). | Metros cuadrados | 285,29 | 35.000 | 9.985.150 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,052 | 0,052 | 0,00 | 285,29 | 285,29 | - | 9.985.150 | 9.985.150 |
| 38 | Pintura De ladrillos visto, con patinal D y (siliconado). | Metros cuadrados | 61,96 | 25.000 | 1.549.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,008 | 0,008 | 0,00 | 61,96 | 61,96 | - | 1.549.000 | 1.549.000 |
| 39 | Pintura De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas). | Metros cuadrados | 11,76 | 27.000 | 317.520 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,002 | 0,002 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | - | 317.520 | 317.520 |
| 40 | Instalación de tablero seccional - metalico con capacidad para 12 llaves. | Unidad | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,012 | - | 0,012 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.200.000 | - | 2.200.000 |
| 41 | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40x40x40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1,00 | 400.000 | 400.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | - | 0,002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 400.000 | - | 400.000 |
| 42 | Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad | 1,00 | 310.000 | 310.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,002 | - | 0,002 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 310.000 | - | 310.000 |
| 43 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico | Unidad | 1,00 | 150.000 | 150.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 150.000 | 150.000 |
| 44 | Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico | Unidad | 1,00 | 350.000 | 350.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,002 | 0,002 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 350.000 | 350.000 |
| 45 | Suministro e instalación de disyuntor termomagnético monofásico | Unidad | 1,00 | 110.000 | 110.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 110.000 | 110.000 |
| 46 | Alimentación de circuitos de luces. | Unidad | 12,00 | 90.000 | 1.080.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,006 | - | 0,006 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1.080.000 | - | 1.080.000 |
| 47 | Alimentación de circuitos de tomas. | Unidad | 20,00 | 90.000 | 1.800.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,009 | - | 0,009 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 48 | Provisión e instalación de cable multifilar NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero seccional (Incluye ducto PVC externo gris, excavación, grampa plástico PVC, y otros). | Metro lineal | 60,00 | 35.000 | 2.100.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,011 | - | 0,011 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2.100.000 | - | 2.100.000 |
| 49 | Alimentación de circuitos de aire acondicionado, incluye llave bipolar | Unidad | 3,00 | 280.000 | 840.000 | 0,00% | 33,33% | 33,33% | - | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 280.000 | 280.000 |
| 50 | Luces LED tipo adosado a la pared 40w exterior | Unidad | 8,00 | 230.000 | 1.840.000 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | - | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | 920.000 | 920.000 |
| 51 | Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm diametro e27, con lampara led 24W luz fria (incluye circuito con cableado multifilar, ducto de PVC rigido y caño circular para soporte). | Unidad | 18,00 | 330.000 | 5.940.000 | 0,00% | 61,11% | 61,11% | - | 0,019 | 0,019 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | - | 3.630.000 | 3.630.000 |
| 52 | Luces LED tipo A.P. de 70w con encendido automatico | Unidad | 4,00 | 350.000 | 1.400.000 | 0,00% | 25,00% | 25,00% | - | 0,002 | 0,002 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 350.000 | 350.000 |
| 53 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de Aire Acondicionado de 24.000BTU ( Incluye sistema de desague) | Unidad | 3,00 | 3.500.000 | 10.500.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 54 | Suministro e instalación de fotocélula | Unidad | 1,00 | 150.000 | 150.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 150.000 | 150.000 |

JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
CEL 0985 224 314

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA — Fiscalización de Obras

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Inst de agua corriente; incl conexión a la red de sumin, llave de paso de 3/4" - y llaves de paso de 1/2", griferias de agua fria p/lavatorios, griferia pico alto fv para cocina, canilla de patio. Tuberias roscable s/EETT | Unidad | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,026 | - | 0,026 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5.000.000 | - | 5.000.000 |
| 56 | Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta camara septica para 1 inodoro, 2 lavatorios, RPS de 15 cm, desengrasador) caños de ventilación | Unidad | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,029 | - | 0,029 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5.500.000 | - | 5.500.000 |
| 57 | Mesada de granito de 1,10x0,55m con 1 (una) bacha de acero inoxidable 50x40 Prof.: 32 cm, incluye griferias pico alto fv | Unidad | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,009 | 0,009 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 58 | Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon | Unidad | 4,00 | 500.000 | 2.000.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,010 | - | 0,010 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 59 | Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos. | Unidad | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,012 | - | 0,012 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.200.000 | - | 2.200.000 |
| 60 | Pozo absorbente de 2,00x2,50m según detalles en planos. | Unidad | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,021 | - | 0,021 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 61 | Piso de baldosones 40x40cm en guarda obra y accesos, incluye contrapiso y nivelación de ladrillos comunes. | Metros cuadrados | 21,45 | 130.000 | 2.788.500 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,015 | - | 0,015 | 21,45 | 0,00 | 21,45 | 2.788.500 | - | 2.788.500 |
| 62 | Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm. | Unidad | 1,00 | 250.000 | 250.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,001 | - | 0,001 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 250.000 | - | 250.000 |
| 63 | Mesada de Hormigon armado con 2 bachas de acero inoxidable, con revestimientos ceramicos y mueble inferior de madera bajo mesada | Metro lineal | 4,25 | 1.500.000 | 6.375.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,033 | - | 0,033 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 6.375.000 | - | 6.375.000 |
| 64 | Instalacion y adquisición de Extintor PQS ABC | Unidad | 2,00 | 350.000 | 700.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 65 | Señalización; carteles indicadores | Unidad | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 66 | Rejas horizontales para puerta exterior de 0,80x2,10, incluye antioxido y pintura sintetica color negro. | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 67 | Registro de desagüe 30x30x30cm | Unidad | 4,00 | 200.000 | 800.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,004 | - | 0,004 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 800.000 | - | 800.000 |
| 68 | Caño PVC para desague de 100mm | Metro lineal | 4,80 | 45.000 | 216.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,001 | - | 0,001 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 216.000 | - | 216.000 |
| 69 | Artefactos sanitario, inodoro blanco con cisterna de acople y tapa | Unidad | 1,00 | 750.000 | 750.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 750.000 | 750.000 |
| 70 | Accesorios (3 jaboneras de adosar,2 portarollos de adosar, 4 porta toallas) | Unidad | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 71 | Pasamanos de caño redondo 2". incluye pintura antioxido y esmalte sintetico, sector escalera. | Metros cuadrados | 4,80 | 350.000 | 1.680.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 72 | Letras corpóreas de acero inoxidable con iluminación LED en Fachada. | Unidad | 1,00 | 7.959.009 | 7.959.009 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | - | 0,042 | 0,042 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 7.959.009 | 7.959.009 |
| 73 | Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.- | Unidad | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| **Total:** | | | | | **190.999.999** | | | | **65,67%** | **21,42%** | **87,08%** | | | | **125.422.720** | **40.907.229** | **166.329.999** |

JESUS MANUEL ESQUIVEL
**Contratista-Representante Legal**
J.M.O. CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
CEL 0985 204 314

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
**Gobernación de Itapúa**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

CERTIFICADO BÁSICO N° 4
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
MES: MARZO

| CONTRATO N° 84/2024 - MENOR CUANTIA NACIONAL N° 32/2024 "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANÁ-PLURIANUAL" ID: 456.004 | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA CONTRATISTA: | JESUS MANUEL ESQUIVEL | FECHA DE PRESENTANCION: | 09-may-25 |
| MONTO DE LA OFERTA: | 190.999.999 GS. | FECHA DE INICIO: | 02-dic-24 |
| CONTRATO N°: | 84/2024 | FECHA DE TERMINACION: | 29-jun-24 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 210 DIAS | DIAS TRANSCURRIDOS: | 159 DIAS |

| CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANÁ-PLURIANUAL" ID: 456.004 | | | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno. | Metros cuadrados | 53,35 | 6.000 | 320.100 | 320.100 | | | | | | | 0,17% |
| 2 | Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva. | Unidad | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | | | 0,63% |
| 3 | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 53,35 | 6.000 | 320.100 | 320.100 | | | | | | | 0,17% |
| 4 | Vallado de obra 2,00 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros. | Metro lineal | 32,28 | 70.000 | 2.259.600 | 2.259.600 | | | | | | | 1,18% |
| 5 | Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata). | Metros cúbicos | 10,74 | 55.000 | 590.700 | 590.700 | | | | | | | 0,31% |
| 6 | Relleno de tierra y compactación | Metros cúbicos | 28,67 | 70.000 | 2.006.900 | 2.006.900 | | | | | | | 1,05% |
| 7 | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | | | - | | 1.000.000 | 0,52% |
| 8 | Obrador | Unidad | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | 1,31% |
| 9 | Desmonte de aberturas | Unidad | 1,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | 0,02% |
| 10 | Demolicón de mamposterías de 0,15cm | Metros cuadrados | 3,84 | 20.000 | 76.850 | 76.850 | | | | | | | 0,04% |
| 11 | Zapata de Hº Aº, fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 1,42 | 2.000.000 | 2.840.000 | 2.840.000 | | | | | | | 1,49% |
| 12 | Encadenado inferior de HºAº, 20x30cm fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 2,34 | 2.000.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | | | | | | | 2,45% |
| 13 | Columnas de HºAº 20x20cm fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 0,78 | 2.200.000 | 1.716.000 | 1.716.000 | | | | | | | 0,90% |
| 14 | Encadenado superior de HºAº 0,15x0,30 cm, fck 210kg/cm3 | Metros cúbicos | 1,65 | 2.200.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | | | | | | | 1,90% |
| 15 | Mampostería de nivelación de 0,30 cm ladrillos comunes | Metros cuadrados | 11,72 | 150.000 | 1.758.000 | 1.758.000 | | | | | | | 0,92% |
| 16 | Aislación asfáltica de paredes de 0,15m en U con pintura asfáltica a tres manos | Metro lineal | 39,06 | 22.000 | 859.320 | 859.320 | | | | | | | 0,45% |
| 17 | Mampostería de ladrillos prensados de 21 agujeros de 1ra visto | Metros cuadrados | 66,36 | 150.000 | 9.954.000 | 2.000.000 | 7.954.000 | | | | | | 5,21% |
| 18 | Mampostería de ladrillos prensado comunes de 0,15m para revocar. | Metros cuadrados | 70,17 | 140.000 | 9.823.800 | 3.000.000 | 6.823.800 | | | | | | 5,14% |
| 19 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). | Metro lineal | 14,90 | 25.500 | 379.950 | - | 379.950 | | | | | | 0,20% |
| 20 | Construcción/Colocación - Techo en chapa termoacústica de 40mm N°27, color a definir en la parte superior, color blanco en la parte inferior. Sobre estructura de metal. Con pintura antióxido 3x1, acabado color blanco. | Metros cuadrados | 61,05 | 300.000 | 18.315.000 | - | 12.000.000 | 6.315.000 | | | | | 9,59% |
| 21 | Canaleta horizontal de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética, con sujeción de planchuelas de 1/2, espesor 1,2mm | Metro lineal | 11,00 | 95.000 | 1.045.000 | - | | 1.045.000 | | | | | 0,55% |
| 22 | Babeta chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 21,00 | 80.000 | 1.680.000 | - | | 1.680.000 | | | | | 0,88% |
| 23 | Cumbrera de chapa Nº 26 con desarrollo 55 cms, incluye base antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 5,50 | 80.000 | 440.000 | - | | 440.000 | | | | | 0,23% |
| 24 | Bajada de chapa Nº 26 incluye base antioxido y pintura sintética. | Metro lineal | 14,00 | 95.000 | 1.330.000 | - | | 1.330.000 | | | | | 0,70% |
| 25 | Revoques de pared exterior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo | Metros cuadrados | 28,42 | 40.000 | 1.136.800 | - | - | 1.136.800 | | | | | 0,60% |
| 26 | Revoques de pared interior a una capa espesor 1,5 cm incluye azotada con hidrófugo | Metros cuadrados | 224,34 | 40.000 | 8.973.600 | - | - | 8.973.600 | | | | | 4,70% |
| 27 | Alfeizar de aberturas - (Recuadro de vanos). | Metro lineal | 21,10 | 25.000 | 527.500 | - | - | 527.500 | | | | | 0,28% |
| 28 | Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm de espesor | Metros cuadrados | 45,80 | 40.000 | 1.832.000 | - | - | 1.832.000 | | | | | 0,96% |
| 29 | Carpeta hidrofuga de cemento de 2 cm (1:3) | Metros cuadrados | 45,80 | 35.000 | 1.603.000 | - | - | 1.603.000 | | | | | 0,84% |
| 30 | Piso cerámica antideslizante PI5 45x45cm | Metros cuadrados | 48,62 | 95.000 | 4.618.900 | - | | 4.618.900 | | | | | 2,42% |
| 31 | Zócalo de cerámica h: 8cm. | Metro lineal | 62,60 | 30.000 | 1.878.000 | - | | 1.878.000 | | | | | 0,98% |
| 32 | Revestido de cerámica, color blanco | Metros cuadrados | 11,40 | 100.000 | 1.140.000 | - | | 1.140.000 | | | | | 0,60% |
| 33 | Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210. | Unidad | 7,00 | 850.000 | 5.950.000 | - | | - | 5.950.000 | | | | 3,12% |
| 34 | Provisión y colocación de ventanas corredizas de vidrios blindex templado de 8 mm de 1,20x1,20m. | Unidad | 3,00 | 1.000.000 | 3.000.000 | - | | - | 3.000.000 | | | | 1,57% |
| 35 | Provisión y colocación de ventanas de vidrios blindex templado de 8 mm de 0,45x0,40m | Unidad | 2,00 | 850.000 | 1.700.000 | - | | - | 1.700.000 | | | | 0,89% |
| 36 | Pintura Pared exterior al látex acrílico con enduido, color a elegir (mínimo 2 manos) | Metros cuadrados | 28,42 | 35.000 | 994.700 | - | | | | 994.700 | | | 0,52% |
| 37 | Pintura Pared interior al látex acrílico con enduido, color a elegir (mínimo 2 manos). | Metros cuadrados | 285,29 | 35.000 | 9.985.150 | - | | | | 9.985.150 | | | 5,23% |
| 38 | Pintura De ladrillos visto, con patinal D y (siliconado). | Metros cuadrados | 61,96 | 25.000 | 1.549.000 | - | | | | 1.549.000 | | | 0,81% |
| 39 | Pintura De aberturas de madera con barniz, base sellador (puertas). | Metros cuadrados | 11,76 | 27.000 | 317.520 | - | | | | 317.520 | | | 0,17% |
| 40 | Instalación de tablero seccional - metalico con capacidad para 12 llaves. | Unidad | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | - | | 500.000 | 1.700.000 | | | | 1,15% |
| 41 | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40x40x40cm. Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1,00 | 400.000 | 400.000 | - | | 400.000 | | | | | 0,21% |
| 42 | Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad | 1,00 | 310.000 | 310.000 | - | | | 310.000 | | | | 0,16% |
| 43 | Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico | Unidad | 1,00 | 150.000 | 150.000 | - | | | 150.000 | | | | 0,08% |
| 44 | Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico | Unidad | 1,00 | 350.000 | 350.000 | - | | | 350.000 | | | | 0,18% |
| 45 | Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico | Unidad | 1,00 | 110.000 | 110.000 | - | | | 110.000 | | | | 0,06% |
| 46 | Alimentación de circuitos de luces. | Unidad | 12,00 | 90.000 | 1.080.000 | - | | | 1.080.000 | | | | 0,57% |
| 47 | Alimentación de circuitos de tomas. | Unidad | 20,00 | 90.000 | 1.800.000 | - | | | 1.800.000 | | | | 0,94% |

JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
CEL 0985 224 314

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Provisión e instalación de cable multifilar NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero seccional (incluye ducto PVC externo gris, excavación, grampa plástico PVC, y otros). | Metro lineal | 60,00 | 35.000 | 2.100.000 | - | | | - | - | 2.100.000 | | 1,10% |
| 49 | Alimentación de circuitos de aire acondicionado, incluye llave bipolar | Unidad | 3,00 | 280.000 | 840.000 | - | | | 840.000 | | | | 0,44% |
| 50 | Luces LED tipo adosado a la pared 40w exterior | Unidad | 8,00 | 230.000 | 1.840.000 | - | | | - | | 1.840.000 | | 0,96% |
| 51 | Provisión e instalación de colgante de policarbonato 30cm diametro e27, con lampara led 24W luz fría (incluye circuito con cableado multifiliar, ducto de PVC rígido y caño circular para soporte). | Unidad | 18,00 | 330.000 | 5.940.000 | - | | | - | - | 5.940.000 | | 3,11% |
| 52 | Luces LED tipo A.P. de 70w con encendido automatico | Unidad | 4,00 | 350.000 | 1.400.000 | - | | | - | - | 1.400.000 | | 0,73% |
| 53 | Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de Aire Acondicionado de 24.000BTU ( Incluye sistema de desague) | Unidad | 3,00 | 3.500.000 | 10.500.000 | - | - | - | - | 1.500.000 | - | 9.000.000 | 5,50% |
| 54 | Suministro e instalación de fotocélula | Unidad | 1,00 | 150.000 | 150.000 | | | | - | 150.000 | | | 0,08% |
| 55 | Inst de agua corriente; incl conexión a la red de sumin, llave de paso de 3/4" - y llaves de paso de 1/2", griferias de agua fria p/lavatorios, griferia pico alto fv para cocina, canilla de patio. Tuberías roscable s/EETT | Unidad | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | | | | | | 2,62% |
| 56 | Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta camara septica para 1 Inodoro, 2 lavatorios, RPS de 15 cm, desengrasador) caños de ventilación | Unidad | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 | - | 5.500.000 | | | | | | 2,88% |
| 57 | Mesada de granito de 1,10x0,55m con 1 (una) bacha de acero inoxidable 50x40 Prof.: 32 cm, incluye griferias pico alto fv | Unidad | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | - | | - | | 1.700.000 | | | 0,89% |
| 58 | Registros cloacales de 60x60cm, con tapa de hormigon | Unidad | 4,00 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | 1,05% |
| 59 | Cámara séptica de 1,40x2,20m según detalles en planos. | Unidad | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | | | | | | | 1,15% |
| 60 | Pozo absorbente de 2,00x2,50m según detalles en planos. | Unidad | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | | | 2,09% |
| 61 | Piso de baldosones 40x40cm en guarda obra y accesos, incluye contrapiso y nivelación de ladrillos comunes. | Metros cuadrados | 21,45 | 130.000 | 2.788.500 | - | - | 2.030.000 | 758.500 | | | | 1,46% |
| 62 | Escalera de acceso de ladrillos comunes, incluye carpeta hidrofuga de 2cm. | Unidad | 1,00 | 250.000 | 250.000 | - | 250.000 | | | | | | 0,13% |
| 63 | Mesada de Hormigon armado con 2 bachas de acero inoxidable, con revestimientos ceramicos y mueble inferior de madera bajo mesada | Metro lineal | 4,25 | 1.500.000 | 6.375.000 | - | - | - | 1.350.000 | 2.895.000 | 2.130.000 | - | 3,34% |
| 64 | Instalacion y adquisición de Extintor PQS ABC | Unidad | 2,00 | 350.000 | 700.000 | - | | | - | | 700.000 | - | 0,37% |
| 65 | Señalización; carteles indicadores | Unidad | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | | | - | | 2.000.000 | - | 1,05% |
| 66 | Rejas horizontales para puerta exterior de 0,80x2,10, incluye antioxido y pintura sintetica color negro. | Unidad | 1,00 | 450.000 | 450.000 | - | | | - | | 450.000 | - | 0,24% |
| 67 | Registro de desagüe 30x30x30cm | Unidad | 4,00 | 200.000 | 800.000 | - | 300.000 | 500.000 | - | - | - | - | 0,42% |
| 68 | Caño PVC para desague de 100mm | Metro lineal | 4,80 | 45.000 | 216.000 | 216.000 | - | - | - | - | - | - | 0,11% |
| 69 | Artefactos sanitario, inodoro blanco con cisterna de acople y tapa | Unidad | 1,00 | 750.000 | 750.000 | - | - | 750.000 | - | - | - | - | 0,39% |
| 70 | Accesorios (3 jaboneras de adosar,2 portarollos de adosar, 4 porta toallas) | Unidad | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | 0,79% |
| 71 | Pasamanos de caño redondo 2". Incluye pintura antioxido y esmalte sintetico, sector escalera. | Metros cuadrados | 4,80 | 350.000 | 1.680.000 | - | - | - | - | - | 1.680.000 | - | 0,88% |
| 72 | Letras corpóreas de acero inoxidable con iluminación LED en Fachada. | Unidad | 1,00 | 7.959.009 | 7.959.009 | - | - | - | - | - | 855.000 | 7.104.009 | 4,17% |
| 73 | Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.- | Unidad | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | 1,05% |
| | **Total:** | | | | **190.999.999** | | | | | | | | 100,00% |
| **PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES:** | | | | | | **38.203.570** | **38.207.750** | **38.199.800** | **19.098.500** | **19.091.370** | **19.095.000** | **19.104.009** | **190.999.999** |
| **PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE:** | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% |

JESUS MANUEL ESQUIVEL
**Contratista-Representante Legal**
JMO. CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
CEL 0985 204 314

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
**Gobernación de Itapúa**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

**CERTIFICADO BÁSICO N° 4**
**CUADRO Y CURVA DE AVANCE**
**MES: MARZO**

| CONTRATO N° 84/2024 - MENOR CUANTIA NACIONAL N° 32/2024 "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BLOQUE EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANÁ-PLURIANUAL" ID: 456.004 | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA CONTRATISTA: | JESUS MANUEL ESQUIVEL | FECHA DE PRESENTANCION: | 09-may-25 |
| MONTO DE LA OFERTA: | 190.999.999 GS. | FECHA DE INICIO: | 02-dic-24 |
| CONTRATO N°: | 84/2024 | FECHA DE TERMINACION: | 29-jun-24 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 210 DIAS | DIAS TRANSCURRIDOS: | 159 DIAS |

**CUADRO DE AVANCE**

| MES | PREVISTO GS. | | EJECUTADO GS. | | PREVISTO % | | EJECUTADO % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO |
| INICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| DICIEMBRE | 38.203.570 | 38.203.570 | 47.750.000 | 47.750.000 | 20,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% |
| ENERO | 38.207.750 | 76.411.320 | 40.956.720 | 88.706.720 | 20,00% | 40,01% | 21,44% | 46,44% |
| FEBRERO | 38.199.800 | 114.611.120 | 36.716.000 | 125.422.720 | 20,00% | 60,01% | 19,22% | 65,67% |
| MARZO | 19.098.500 | 133.709.620 | 40.907.279 | 166.329.999 | 10,00% | 70,01% | 21,42% | 87,08% |
| ABRIL | 19.091.370 | 152.800.990 | | | 10,00% | 80,00% | | |
| MAYO | 19.095.000 | 171.895.990 | | | 10,00% | 90,00% | | |
| JUNIO | 19.104.009 | 190.999.999 | | | 10,00% | 100,00% | | |

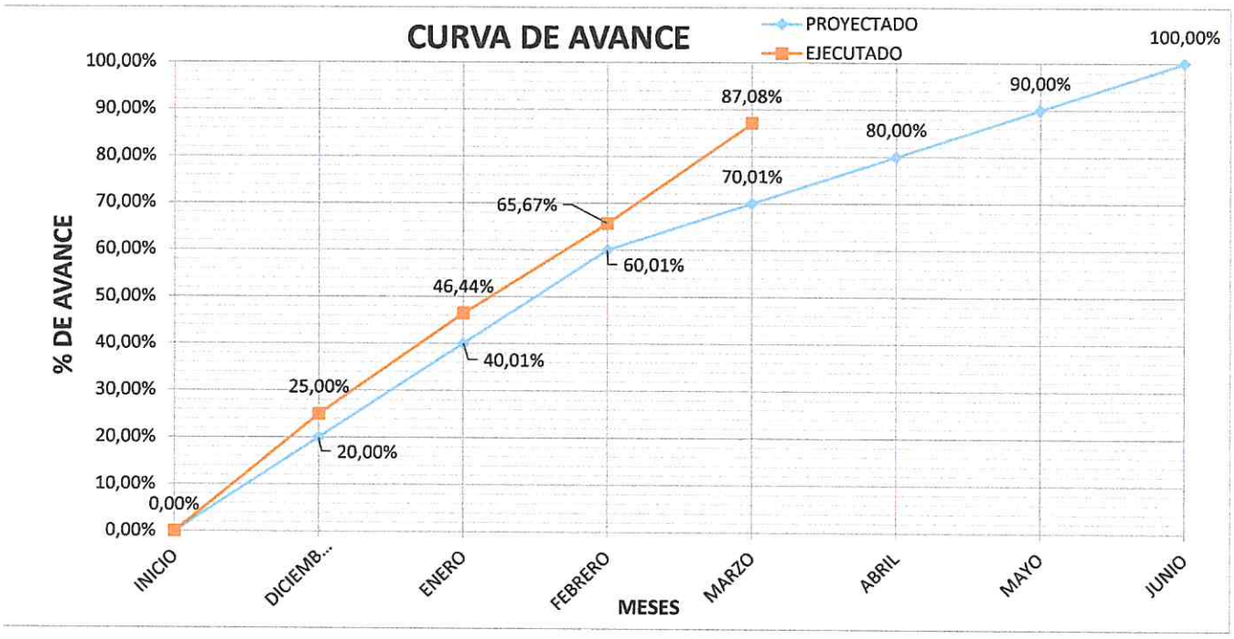


JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642

JESUS MANUEL ESQUIVEL
**Contratista-Representante Legal**

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
**Gobernacion de Itapúa**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
