MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: 26 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	7/11/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	66
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"	346.194.732	83,12%	11,38%	94,50%	287.758.530	39.391.500	327.150.030
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	173.097				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	17.309.737	83,12%	11,38%	94,50%	14.387.927	1.969.575	16.357.502
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**17.309.737**	83,12%	11,38%	94,50%	**14.387.927**	**1.969.575**	**16.357.502**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**273.370.604**	**37.421.925**	**310.792.529**

SON GUARANÍES: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80065737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

CERTIFICADO 3 CONSTRRUCCION DE CAMINERO

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: 26 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	7/11/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	66
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador)	Metros cuadrados	9	248.400	2.235.600	9,00		9,00	2.235.600		2.235.600	100,00%		100,00%
2	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	420	4.100	1.722.000	420,00		420,00	1.722.000		1.722.000	100,00%		100,00%
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	170	82.800	14.076.000	120,00	50,00	170,00	9.936.000	4.140.000	14.076.000	70,59%	29,41%	100,00%
3.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	420	8.240	3.460.800	420,00		420,00	3.460.800		3.460.800	100,00%		100,00%
3.2	Cartel con impresion	Unidad	1	2.898.000	2.898.000									
4	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	160	58.600	9.376.000	140,00	20,00	160,00	8.204.000	1.172.000	9.376.000	87,50%	12,50%	100,00%
5	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	165	131.100	21.631.500	165,00		165,00	21.631.500		21.631.500	100,00%		100,00%
6	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	270	34.500	9.315.000	240,00	30,00	270,00	8.280.000	1.035.000	9.315.000	88,89%	11,11%	100,00%
6.1	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	106	52.400	5.554.400	50,00	56,00	106,00	2.620.000	2.934.400	5.554.400	47,17%	52,83%	100,00%
6.2	Colocación de pisos - Contrapisos - De Hº de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	420	48.300	20.286.000	400,00	20,00	420,00	19.320.000	966.000	20.286.000	95,24%	4,76%	100,00%
6.3	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	420	117.300	49.266.000	350,00	70,00	420,00	41.055.000	8.211.000	49.266.000	83,33%	16,67%	100,00%
6.4	Construccion de rampa peatonal	Unidad	2	621.000	1.242.000	2,00		2,00	1.242.000		1.242.000	100,00%		100,00%
7	Limpieza de obra	Metros cuadrados	420	8.270	3.473.400		420,00	420,00		3.473.400	3.473.400		100,00%	100,00%
8	Preparación de obra (Parque Los Cocos - Obrador)	Metros cuadrados	9	248.400	2.235.600	9,00		9,00	2.235.600		2.235.600	100,00%		100,00%
9	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	626	4.140	2.591.640	626,00		626,00	2.591.640		2.591.640	100,00%		100,00%
9.1	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	250	82.000	20.500.000	200,00	50,00	250,00	16.400.000	4.100.000	20.500.000	80,00%	20,00%	100,00%
9.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	626	8.250	5.164.500	626,00		626,00	5.164.500		5.164.500	100,00%		100,00%

GRUPO RIO CORRAGO S.A. RUC: 80085737-7

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

CERTIFICADO 3 CONSTRRUCCION DE CAMINERO

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: 26 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	7/11/2024
FECHA DE INICIO	2/9/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	66
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	30/12/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
10	Cartel con impresion	Unidad	1	2.897.000	2.897.000									
10.1	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	296	58.627	17.353.592	70,00		70,00	4.103.890		4.103.890	23,65%		23,65%
10.2	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	166	131.100	21.762.600	160,00	6,00	166,00	20.976.000	786.600	21.762.600	96,39%	3,61%	100,00%
10.3	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	278	34.500	9.591.000	240,00	38,00	278,00	8.280.000	1.311.000	9.591.000	86,33%	13,67%	100,00%
11	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	110	52.400	5.764.000	60,00	50,00	110,00	3.144.000	2.620.000	5.764.000	54,55%	45,45%	100,00%
12	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626	48.300	30.235.800	620,00	6,00	626,00	29.946.000	289.800	30.235.800	99,04%	0,96%	100,00%
12.1	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626	117.300	73.429.800	620,00	6,00	626,00	72.726.000	703.800	73.429.800	99,04%	0,96%	100,00%
12.2	Construccion de rampa peatonal	Unidad	8	621.000	4.968.000	4,00	4,00	8,00	2.484.000	2.484.000	4.968.000	50,00%	50,00%	100,00%
12.3	Limpieza de obra	Metros cuadrados	626	8.250	5.164.500		626,00	626,00		5.164.500	5.164.500		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**346.194.732**				**287.758.530**	**39.391.500**	**327.150.030**	**83,12%**	**11,38%**	**94,50%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80005737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: 26 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 07 días del mes de noviembr del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GRUPO RIO PARANA", REPRESENTADA POR el SR. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador)**	Metros cuadrados	9	9,00		9,00
2	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	420	420,00		420,00
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	170	120,00	50,00	170,00
3.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	420	420,00		420,00
3.2	Cartel con impresion	Unidad	1			0,00
4	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	160	140,00	20,00	160,00
5	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	165	165,00		165,00
6	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	270	240,00	30,00	270,00
6.1	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	106	50,00	56,00	106,00
6.2	Colocación de pisos - Contrapisos - De H° de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	420	400,00	20,00	420,00
6.3	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	420	350,00	70,00	420,00
6.4	Construccion de rampa peatonal	Unidad	2	2,00	0,00	2,00
7	Limpieza de obra	Metros cuadrados	420		420,00	420,00
8	Preparación de obra (Parque Los Cocos - Obrador)	Metros cuadrados	9	9,00		9,00
9	Preparación de Terreno	Metros cuadrados	626	626,00		626,00
9.1	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	250	200,00	50,00	250,00
9.2	**Replanteo y marcación**	Metros cuadrados	626	626,00		626,00
10	Cartel con impresion	Unidad	1			0,00
10.1	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón	Metro lineal	296	70,00	0,00	70,00
10.2	Mampostería - Nivelación de 0,15	Metro lineal	166	160,00	6,00	166,00
10.3	Mampostería - Envarillado	Metro lineal	278	240,00	38,00	278,00
11	Revoques - de Mocheta	Metro lineal	110	60,00	50,00	110,00
12	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626	620,00	6,00	626,00

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID N°: 450.496 CONTRATO N° 14/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GRUPO RIO PARANA S.A.
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: 26 DE OCTUBRE 2024- 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 07 días del mes de noviembr del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GRUPO RIO PARANA", REPRESENTADA POR el SR. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
12.1	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms	Metros cuadrados	626	620,00	6,00	626,00
12.2	Construccion de rampa peatonal	Unidad	8	4,00	4,00	8,00
12.3	Limpieza de obra	Metros cuadrados	626		626,00	626,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"

LMCN No.14/2024 ID Nº: 450.496 CONTRATO Nº 14/2024

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE CAMINERO"
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	346.194.732
TIEMPO DE EJECUCION	30 dias

ITEM	DESCRIPCIÓN	oct-24				nov-24				dic-24				ene-25				Monto	%
	0	30 dias				60 dias				90 dias				120dias					
1	Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador)																	2.235.600	0,65
2	Preparación de Terreno																	1.722.000	0,50
3	Relleno y compactacion de terreno																	14.076.000	4,07
3.1	Replanteo y marcación																	3.460.800	1,00
3.2	Cartel con impresion																	2.898.000	0,84
4	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón																	9.376.000	2,71
5	Mampostería - Nivelación de 0,15																	21.631.500	6,25
6	Mampostería - Envarillado																	9.315.000	2,69
6.1	Revoques - de Mocheta																	5.554.400	1,60
6.2	Colocación de pisos - Contrapisos - De H° de cascotes 10 cms																	20.286.000	5,86
6.3	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms																	49.266.000	14,23
6.4	Construccion de rampa peatonal																	1.242.000	0,36
7	Limpieza de obra																	3.473.400	1,00
8	Preparación de obra (Parque Los Cocos - Obrador)																	2.235.600	0,65
9	Preparación de Terreno																	2.591.640	0,75
9.1	Relleno y compactacion de terreno																	20.500.000	5,92
9.2	Replanteo y marcación																	5.164.500	1,49
10	Cartel con impresion																	2.897.000	0,84
10.1	Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón																	17.353.592	5,01
10.2	Mampostería - Nivelación de 0,15																	21.762.600	6,29
10.3	Mampostería - Envarillado																	9.591.000	2,77
11	Revoques - de Mocheta																	5.764.000	1,66
12	Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms																	30.235.800	8,73
12.1	Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms																	73.429.800	21,21
12.2	Construccion de rampa peatonal																	4.968.000	1,44
12.3	Limpieza de obra																	5.164.500	1,49
	TOTAL																	##########	#####

Contractual				
Monto Bruto Mensual Contractual	103.858.420	103.858.420	69.238.946	51.929.210
Porcentaje Avance Mensual Contractual	30,00%	30,00%	20,00%	15,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	35,00%	65,00%	85,00%	100,00%

Certificado				
Monto Bruto Mensual Certificado	155.705.640	132.052.890	39.391.500	
Porcentaje Avance Mensual Certificado	44,98%	38,14%	11,38%	
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	44,98%	83,12%	94,50%	

	Mes1	Mes2	Mes 3	Mes 4
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	35,00%	65,00%	85,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	44,98%	83,12%	94,50%	

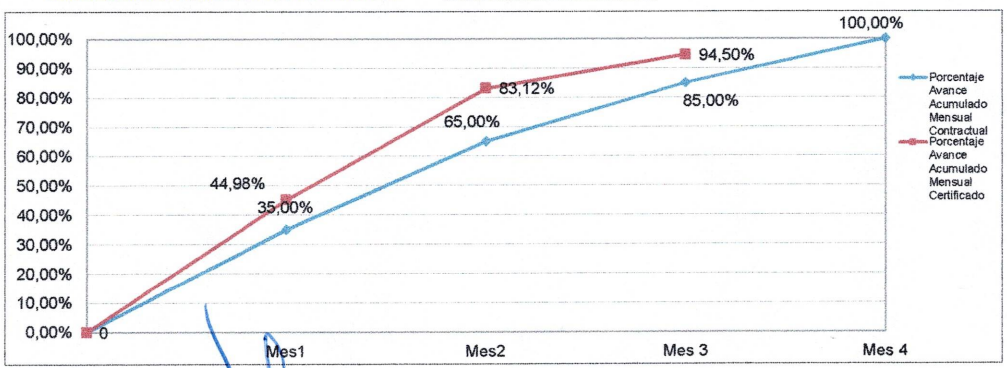

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra
