GOBERNACION DE ITAPÚA
Resúmen del Certificado Básico Nº 02
Mes: diciembre/enero

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1**	100,00%	350.135.856	13,05%	45.682.076	9,63%	33.717.514	22,68%	79.399.590
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**350.135.856**	**13,05%**	**45.682.076**	9,63%	**33.717.514**	**22,68%**	**79.399.590**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	70.027.171	9.136.415	6.743.503	15.879.918
B.II	Para Fondo de Reparo	*5,00%*		-		
B	**Total Deducciones**		**70.027.171**	**9.136.415**	**6.743.503**	**15.879.918**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**26.974.011**	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**26.974.011**	

Certificado Básico Nº 2
Mes: diciembre/enero
Contrato: 24/2022
Monto básico: 350.135.856 gs
Contratista: Sr. Sergio Alexis Núñez Kubo
Fecha de inicio: 14/noviembre/2022
Plazo de ejecución: 120 días
Fecha de Terminación: 14/marzo/2023
Ampliacion:

SON GUARANIES: Veintiseis millones novecientos setenta y cuatro mil once.----------

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Darío Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - P

Sr. Sergio Alexis Núñez Kubo
Contratista

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

2(dos)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022

Monto del Contrato: 350.135.856 gs.

Plazo Contractual: 120 dias

Inicio de Obra: 14/noviembre/2022

Term. Prevista: 14/marzo/2023

Ampliaciones:

Mes: diciembre / enero

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 02						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 02					
								EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			IMPORTE EJECUTADO EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	**72153507-003**	**Servicio de Retiro de Vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.**	Unidad de Medida Global	1	2.932.500	2.932.500	0,0083753	50,00%	0,00%	50,00%	0,00419	0,00000	0,00419	0,50	-	0,50	1.466.250	-	1.466.250
2	**72131601-002**	**Preparación de obra - Limpieza de obra**	Unidad	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
2,1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	230	3.797	873.310	0,0024942	100,00%	0,00%	100,00%	0,00249	0,00000	0,00249	230,00	-	230,00	873.310	-	873.310
2,2		Replanteo	Metros cuadrados	221,64	5.355	1.186.882	0,0033898	100,00%	0,00%	100,00%	0,00339	0,00000	0,00339	221,64	-	221,64	1.186.882	-	1.186.882
2,3		Nivelación de suelo para implantación de obra	Metros cúbicos	55,41	36.550	2.025.236	0,0057841	100,00%	0,00%	100,00%	0,00578	0,00000	0,00578	55,41	-	55,41	2.025.236	-	2.025.236
3	**72131604-004**	**Estructuras de H°A°**	Unidad de Medida Global	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
3,1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	11,48	1.853.850	21.282.198	0,0607827	100,00%	0,00%	100,00%	0,06078	0,00000	0,06078	11,48	-	11,48	21.282.198	-	21.282.198
3,2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,38	1.867.167	4.443.857	0,0126918	65,00%	35,00%	100,00%	0,00825	0,00444	0,01269	1,55	0,83	2,38	2.888.507	1.555.350	4.443.857
3,3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	4,88	1.833.167	8.945.855	0,0255497	60,00%	40,00%	100,00%	0,01533	0,01022	0,02555	2,93	1,95	4,88	5.367.513	3.578.342	8.945.855
3,4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1,21	1.753.833	2.122.138	0,0060609	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,00606	0,00606	0,00	1,21	1,21	-	2.122.138	2.122.138
4	**72131601-009**	**Colocación de Pisos - Contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluye MDO cornisa**	Metros cuadrados	202,85	206.833	41.956.074	0,119828	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
5	**72131601-005**	**Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml**	Metros cuadrados	42,68	136.567	5.828.680	0,0166469	80,01%	19,99%	100,00%	0,01332	0,00333	0,01665	34,15	8,53	42,68	4.663.763	1.164.917	5.828.680
6	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores**	Metros cuadrados	84,7	67.717	5.735.630	0,0163812	80,00%	20,00%	100,00%	0,01310	0,00328	0,01638	67,76	16,94	84,70	4.588.504	1.147.126	5.735.630
7	**72131601-006**	**Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes**	Metros cuadrados	60,98	21.973	1.339.914	0,0038268	100,00%	0,00%	100,00%	0,00383	0,00000	0,00383	60,98	-	60,98	1.339.914	-	1.339.914
8	**72131601-005**	**Mampostería - Construcción de muro de elevación**	Unidad	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
8,1		De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros	Metros cuadrados	249,12	68.538	17.074.187	0,0487645	0,00%	50,00%	50,00%	0,00000	0,02438	0,02438	0,00	124,56	124,56	-	8.537.093	8.537.093
8,2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	11,8	28.447	335.675	0,0009587	0,00%	50,00%	50,00%	0,00000	0,00048	0,00048	0,00	5,90	5,90	-	167.837	167.837
9	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16**	Metros cuadrados	314,65	259.533	81.662.058	0,2332296	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
10	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta**	Metros cuadrados	303,54	82.875	25.155.878	0,071846	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
11	**72131601-008**	**Revoque**	Unidad	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
11,1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154,13	45.050	6.943.557	0,019831	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
11,2		De pilares 0.20 x 0.20 ml	Metros cuadrados	40,8	47.883	1.953.626	0,0055796	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
11,3		De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	73,17	51.567	3.773.157	0,0107763	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
12	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Unidad	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-

Metalúrgica "Nuñez"
de: Rubén Darío Nuñez
R.U.C.: 2[illegible]5 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
María Lidia Pinto de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

12,1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	233,76	38.335	8.961.190	0,0255935	0,00%	90,00%	90,00%	0,00000	0,02303	0,02303	0,00	210,38	210,38	-	8.065.071	8.065.071
12,2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	233,76	35.077	8.199.600	0,0234183	0,00%	90,00%	90,00%	0,00000	0,02108	0,02108	0,00	210,38	210,38	-	7.379.640	7.379.640
13	**72131601-009**	**Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito**	Metros cuadrados	233,76	83.272	19.465.663	0,0555946	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
14	**72131601-009**	**Zócalo tipo Cerámico**	Metro lineal	32	24.083	770.656	0,002201	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
15	**72131601-010**	**Aberturas**	Unidad	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
15,1		Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.385.500	1.385.500	0,003957	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
15,2		Puerta metálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3	923.667	2.771.001	0,0079141	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
15,3		Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos	Metros cuadrados	6,75	442.000	2.983.500	0,008521	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
16	**72131601-012**	**Servicio de Pinturas**	Unidad	1	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
16,1		De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	194,93	39.525	7.704.608	0,0220046	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
16,2		De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	73,17	33.150	2.425.586	0,0069276	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
16,3		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	34.085	34.085	9,735E-05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
16,3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	344,11	24.877	8.560.424	0,0244489	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
16,4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	66	32.583	2.150.478	0,0061418	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
17	**72101510-005**	**Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**	Metro lineal	66	97.693	6.447.738	0,018415	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad de Medida Global	1	15.410.500	15.410.500	0,0440129	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
19	**72131601-011**	**Instalación sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho**	Unidad de Medida Global	2	12.721.667	25.443.334	0,072667	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
20	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	Unidad de Medida Global	1	1.851.583	1.851.583	0,0052882	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	-	0,00	-	-	-
						350.135.856					13,05%	9,63%	22,68%				45.682.076	33.717.514	79.399.590

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Darío Núñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenme...@hotmail.com
Cel. (0985) 702575 - Encarnación Itapúa - P...

Metalúrgica Núñez
Contratista

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

4/cua

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022

Monto del Contrato: 350.135.856 gs. | **Term. Prevista:** 14/marzo/2023

Plazo Contractual: 120 dias | **Ampliaciones:**

Inicio de Obra: 14/noviembre/2022 | **Mes:** diciembre/enero

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	0	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1	72153507-003	Servicio de Retiro de Vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.	Unidad de Medida Global	1	2.932.500	2.932.500		1.466.250			0	1.466.250	2.932.500
2	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza de obra	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
2,1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	230	3.797	873.310		873.310			0	0	873.310
2,2		Replanteo	Metros cuadrados	221,64	5.355	1.186.882		1.186.882			0	0	1.186.882
2,3		Nivelación de suelo para implantación de obra	Metros cúbicos	55,41	36.550	2.025.236		2.025.236			0	0	2.025.236
3	72131604-004	Estructuras de H°A°	Unidad de Medida Global	1	-	-		0			0	0	-
3,1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	11,48	1.853.850	21.282.198		21.282.198			0	0	21.282.198
3,2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,38	1.867.167	4.443.857		0	2.666.314	1.777.543		0	4.443.857
3,3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	4,88	1.833.167	8.945.855		0	4.472.927	4.472.927	0	0	8.945.855
3,4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1,21	1.753.833	2.122.138		0			2.122.138	0	2.122.138
4	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluve MDO cornisa	Metros cuadrados	202,85	206.833	41.956.074		0			41.956.074	0	41.956.074
5	72131601-005	Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml	Metros cuadrados	42,68	136.567	5.828.680		0	5.828.680	0	0	0	5.828.680
6	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	84,7	67.717	5.735.630		0	4.588.504	1.147.126	0	0	5.735.630
7	72131601-006	Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	60,98	21.973	1.339.914		0	1.339.914		0	0	1.339.914
8	72131601-005	Mampostería - Construcción de muro de elevación	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
8,1		De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros	Metros cuadrados	249,12	68.538	17.074.187				10.244.512	6.829.675	0	17.074.187
8,2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	11,8	28.447	335.675		0			335.675	0	335.675
9	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16	Metros cuadrados	314,65	259.533	81.662.058		0	0		81.662.058	0	81.662.058
10	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta	Metros cuadrados	303,54	82.875	25.155.878		0			0	25.155.878	25.155.878
11	72131601-008	Revoque	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
11,1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154,13	45.050	6.943.557		0			3.471.778	3.471.778	6.943.557
11,2		De pilares 0.20 x 0.20 ml	Metros cuadrados	40,8	47.883	1.953.626		0			976.813	976.813	1.953.626
11,3		De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	73,17	51.567	3.773.157		0			1.886.579	1.886.579	3.773.157
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
12,1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	233,76	38.335	8.961.190		0	8.961.190			0	8.961.190
12,2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	233,76	35.077	8.199.600		0	8.199.600			0	8.199.600
13	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito	Metros cuadrados	233,76	83.272	19.465.663		0			9.732.831	9.732.831	19.465.663
14	72131601-009	Zócalo tipo Cerámico	Metro lineal	32	24.083	770.656		0			770.656		770.656

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Darío Nuñez
R.U.C.: 2172[illegible] - 3
E-mail: rubenmetalurgia@hotmail.com

Fiscalización de Obras

Arq. Ruth Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

5(cinco)

15	**72131601-010**	**Aberturas**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
15,1		Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.385.500	1.385.500		0			0	1.385.500	1.385.500
15,2		Puerta mettálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3	923.667	2.771.001		0			0	2.771.001	2.771.001
15,3		Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos	Metros cuadrados	6,75	442.000	2.983.500		0			0	2.983.500	2.983.500
16	**72131601-012**	**Servicio de Pinturas**	Unidad	1	-	-		0			0	0	-
16,1		De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	194,93	39.525	7.704.608		0			0	7.704.608	7.704.608
16,2		De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	73,17	33.150	2.425.586		0			0	2.425.586	2.425.586
16,3		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	34.085	34.085		0			0	34.085	34.085
16,3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	344,11	24.877	8.560.424		0			0	8.560.424	8.560.424
16,4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	66	32.583	2.150.478		0			0	2.150.478	2.150.478
17	**72101510-005**	**Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**	Metro lineal	66	97.693	6.447.738		0			0	6.447.738	6.447.738
18	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad de Medida Global	1	15.410.500	15.410.500		0			7.705.250	7.705.250	15.410.500
19	**72131601-011**	**Instalación sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho**	Unidad de Medida Global	2	12.721.667	25.443.334		0		25.443.334		0	25.443.334
20	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	Unidad de Medida Global	1	1.851.583	1.851.583		0			0	1.851.583	1.851.583
						350.135.856		0	0		0	0	0
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO							0	**26.833.876**	**36.057.128**	**43.085.442**	**157.449.528**	**86.709.882**	**350.135.856**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO							0%	7,66%	10,30%	12,31%	44,97%	24,76%	**100,00%**
EJECUTADO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO							0	45.682.076	15.756.114	17.961.400	0	0	**79.399.590**
EJECUTADO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO							0%	13,05%	4,50%	5,13%	0,00%	0,00%	**22,68%**

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Darío Nuñez
R.U.C. [illegible]
E-mail: [illegible]@hotmail.com
Cel. (0985) [illegible] - Itapúa - Py

Metalúrgica Núñez
Contratista

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

María Lidia Plana de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

6/10/19

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022	
Monto del Contrato: 350.135.856 gs.	**Term. Prevista:** 14/marzo/2023
Plazo Contractual: 120 dias	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 14/noviembre/2022	**Mes:** diciembre/enero

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 38/2021

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NOVIEMBRE	26.833.876	26.833.876	45.682.076	45.682.076	7,66%	7,66%	13,05%	13,05%
DICIEMBRE	36.057.128	62.891.004	15.756.114	61.438.190	10,30%	17,96%	4,50%	17,55%
ENERO	43.085.442	105.976.446	17.961.400	79.399.590	12,31%	30,27%	5,13%	22,68%
FEBRERO	157.449.528	263.425.974	0	79.399.590	44,97%	75,24%	0,00%	22,68%
MARZO	86.709.882	350.135.856	0	79.399.590	24,76%	100,00%	0,00%	22,68%

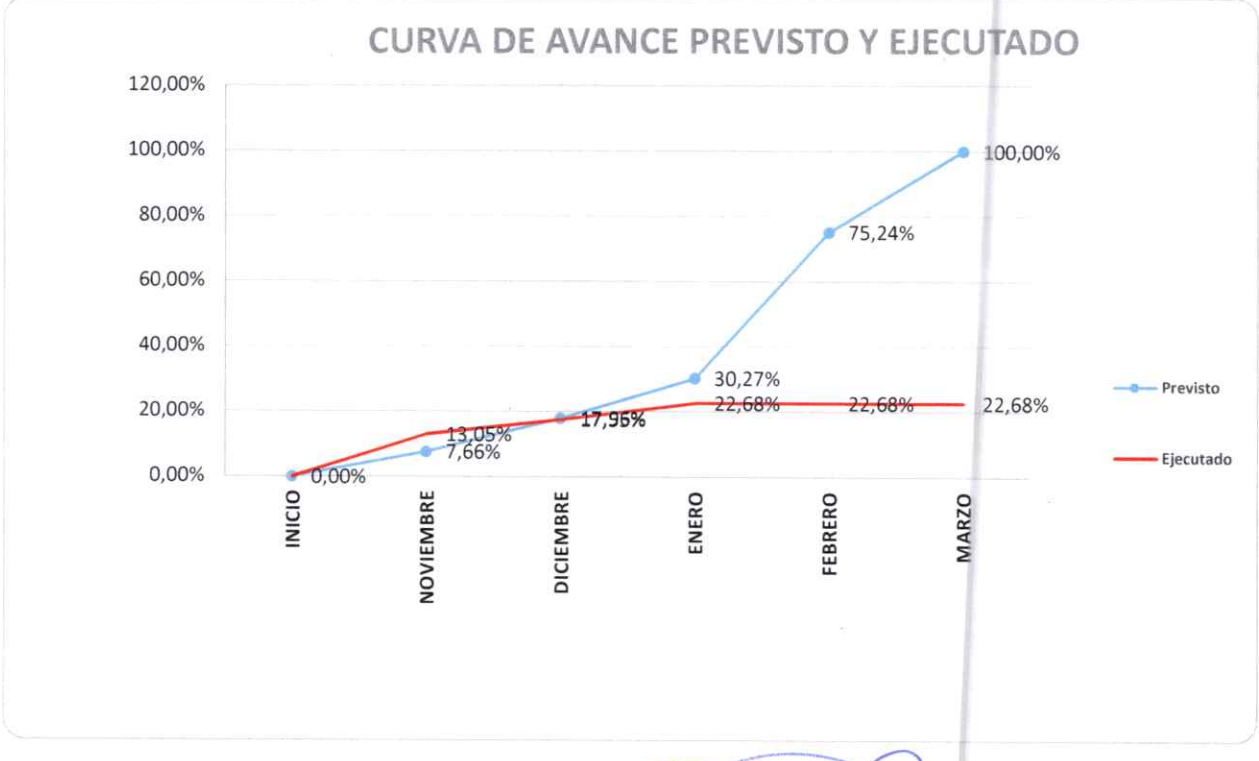

Metalúrgica Núñez
CONTRATISTA
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

María Lidia Plano de Exgeu
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa
