Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 19 de Enero del 2023

Señor
Director General de Administración y Finanzas
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Lic. Carlos Morel

Presente

Ref: Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 – Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas", ID N° 415.978 – Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en Territorios con Mayor Índice de Pobreza a Nivel Nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas".-

Me dirijo a usted con el objeto solicitar el Pago del Certificado de Obra N° 02 correspondiente al Lote Nro 2 - Iturbe del Contrato de Referencia, cuyo monto asciende a Gs. 34.268.837 Guaraníes Treinta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y siete.-

Además presentamos los siguientes documentos:

- Factura Crédito N° 001-001-0001262.
- Certificados de Obra y Acta de Medición en 3 Originales.-
- Certificado de Cumpliendo Tributario
- Reportes FIP y FIS
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social

Ing. Mario R. Ibarrola A.
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Entrada N° 133 Fecha: 19/01/23 Hora: 13:33
Asunto:
Recibido por: Lucia Rig

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 10
Proceso: — Fecha: 19-01-2023
Entregado por: Lidia Boreiro
Hora: 13:40 Recibido por: Delia Qefor

Mario Raúl Ibarrola Adorno

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

Adela Speratti c/ República Francesa N° 1689
Depto. Planta Baja - Tel.: (021) 222 552
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16016326
RUC: 430285 - 0
Inicio de Vigencia: 11 de Noviembre de 2022
Válido Hasta el 30 de Noviembre de 2023

FACTURA

No. 001-001 0001262

Fecha de Emisión: 19/01/2023 Cond. de Venta. CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Secretaria Nacional de Cultura

Dirección: Teléfono:

R.U.C. Ó Cedula Identidad N°.: 80050610-3 Nota de Remisión N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	PAGO Certificado Nº 02 Contrato				
	Nº 01/2022 - Licitación por				
	Concurso de Ofertas Nº 01/2022				
	Lote Nº 2 Iturbe				34.268.837
SUB TOTAL					34.268.837
TOTAL A PAGAR:	Treinta y Cuatro Millones dos cientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y siete				34.268.837

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5 %) — (10 %) 3.115.349 TOTAL DE IVA: 3.115.349

AUTOMÁTICA IMPRESIONES de Andrés G. Ayala A. - RUC: 794391 - 1 (Actividades de Imprenta) - Cred. Hab. Nº 1.366
Independencia Nacional Nº 1316 casi Lugano (Ex 1era.) - Tel.: (021) 373 987 - Cel.: (0981) 176 811
Email: imprentaautomatic@hotmail.com - 001-001 - 1.251 al 1.350 - Nov. / 22.

ORIGINAL: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Válido Como Crédito Fiscal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 Periodo: DICIEMBRE 2022/ENERO 2023

FECHA: 17 DE ENERO DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01				EJECUTADO						Porcentaje %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72102508-001	PISO	Unidad	1		**20.856.625**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.1		Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	17.768	3.284.415	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	21.615	1.080.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	52.837	422.696	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	43.507	2.175.350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	73.294	3.664.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas.	Metros cuadrados	185	16.185	2.994.225	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.7		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	30,8	45.601	1.404.511	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.8		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.	Metros cuadrados	30,8	189.285	5.829.978	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1		**17.909.527**				**7.512.964**	**0**	**7.512.964**	**41,95%**
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	85.181	12.521.607	88,20	0,00	88,20	7.512.964	0	7.512.964	60,00%
2.2		Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad	Metros lineales	0	40.816	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	86.021	1.720.420	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
2.4		Arreglo de fisuras en muros	Metros lineales	45	81.500	3.667.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1		**204.283.366**				**94.495.037**	**37.786.986**	**132.282.023**	**64,75%**
3.1		Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	240	11.329	2.718.960	240,00	0,00	240,00	2.718.960	0	2.718.960	100,00%
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	240	39.041	9.369.840	120,00	120,00	240,00	4.684.920	4.684.920	9.369.840	100,00%
3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	148	15.483	2.291.484	148,00	0,00	148,00	2.291.484	0	2.291.484	100,00%
3.4		Provisión y Colocacion de chapas en los aleros	Metros cuadrados	148	179.589	26.579.172	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	1.703.611	3.407.222	1,00	0,00	1,00	1.703.611	0	1.703.611	50,00%
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	1.169.484	2.338.968	1,00	0,00	1,00	1.169.484	0	1.169.484	50,00%
3.7		Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	0	715.490	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
3.8		Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	116	162.876	18.893.616	17,60	50,00	67,60	2.866.618	8.143.800	11.010.418	58,28%
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	16.743	8.371.500	100,00	190,00	290,00	1.674.300	3.181.170	4.855.470	58,00%
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion	Metros cuadrados	180	39.426	7.096.680	90,00	36,00	126,00	3.548.340	1.419.336	4.967.676	70,00%
3.11		Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	60	148.845	8.930.700	40,00	0,00	40,00	5.953.800	0	5.953.800	66,67%
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	192	32.015	6.146.880	96,00	38,40	134,40	3.073.440	1.229.376	4.302.816	70,00%
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	48	31.233	1.499.184	0,00	48,00	48,00	0	1.499.184	1.499.184	100,00%
3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	240	129.486	31.076.640	120,00	50,00	170,00	15.538.320	6.474.300	22.012.620	70,83%
3.15		Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	240	101.298	24.311.520	120,00	50,00	170,00	12.155.760	5.064.900	17.220.660	70,83%
3.16		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m	Unidad	2	7.113.000	14.226.000	2,00	0,00	2,00	14.226.000	0	14.226.000	100,00%
3.17		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m	Unidad	1	4.620.000	4.620.000	1,00	0,00	1,00	4.620.000	0	4.620.000	100,00%
3.18		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m	Unidad	10	3.045.000	30.450.000	6,00	2,00	8,00	18.270.000	6.090.000	24.360.000	80,00%
3.19		Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m	Unidad	1	1.955.000	1.955.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1		**26.052.225**				0	0	0	**0,00%**

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Item	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	30	123.487	3.704.610	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	159.183	9.550.980	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	159.183	4.775.490	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	25	159.183	3.979.575	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
4.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED	Unidad	15	269.438	4.041.570	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1		**17.886.486**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	156.899	17.886.486	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1		**48.423.785**				**0**	**0**	**0**	**0,00%**
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	38.279	13.589.045	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	38.279	8.038.590	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	240	43.846	10.523.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir	Metros cuadrados	140	30.066	4.209.240	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	44.681	10.187.268	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	44.681	1.876.602	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	40.378.702	**40.378.702**	0,60	0,10	0,70	**24.227.221**	**4.037.870**	**28.265.091**	**70,00%**
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	2.527.975	**2.527.975**	0,50	0,40	0,90	**1.263.988**	**1.011.190**	**2.275.178**	**90,00%**
				Precio Total		378.318.691			Total Certificado	127.499.210	42.836.046	170.335.256	45,02%
				Anticipo		68.583.540			Descuento Anticipo 20%	25.499.842	8.567.209	34.067.051	49,67%
									Saldo a Cobrar	101.999.368	34.268.837	136.268.205	

Son Guaranies: Treinta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y siete.-

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

ACTA DE MEDICION Nº 02 **Periodo: DICIEMBRE 2022/ENERO 2023**

LOTE NRO: 2 - ITURBE

FECHA: 13 DE ENERO DE 2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01		CANTIDAD EJECUTADA			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
1	72102508-001	PISO	Unidad	1				
1.1		Restauracion de juntas del piso de piedras con argamasa similar y de misma equivalencia técnica de la encontrada en la obra.	Metros cuadrados	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Desmonte de piso en sector hundido, con recuperación de material.	Metros cuadrados	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Relleno y compactación de área afectada.	Metros cúbicos	8	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso de piedras recuperadas con disposición idem a la existente.	Metros cuadrados	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Limpieza de pisos de piedras con agua clorada y cepillo de cerdas plasticas.	Metros cuadrados	185	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Contrapiso de H° de cascotillo ceramico e=10 cm.	Metros cuadrados	30,8	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8		Recuperación de sector piso del Museo con asentamiento: Colocación de piso en piedra tipo laja (arenisca) en sector demolido.	Metros cuadrados	30,8	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	72101607-001	REVOQUE	Unidad	1				
2.1		Recolocación de revoques caídos o en mal estado, en los diferentes espacios del inmueble, con argamasa similar a la existente y de misma equivalencia técnica.	Metros cuadrados	147	88,20	0,00	88,20	60,00%
2.2		Buñas e=4 cm en revoque de muro a nivel de zocalos, para evitar humedad por capilaridad	Metros lineales	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3		Arreglo de revoques en sector de paredes demolidas	Metros cuadrados	20	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4		Arreglo de fisuras en muros	Metros lineales	45	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	72101601-001	TECHO	Unidad	1				
3.1		Revision in situ del estado del maderamen existente (tirantes y vigas) a reemplazar.	Metros cuadrados	240	240,00	0,00	240,00	100,00%
3.2		Desmonte de techo de tejas: Se desmontará el total de tejas y tejuelas con recuperación, y las alfajías, vigas y tirantes en mal estado.	Metros cuadrados	240	120,00	120,00	240,00	100,00%
3.3		Desmonte de chapas de techo de los corredores (aleros)	Metros cuadrados	148	148,00	0,00	148,00	100,00%
3.4		Provisión y Colocacion de chapas en los aleros	Metros cuadrados	148	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5		Sustitución de viga de madera en corredor (alero) 6" X 8"X 4,00 m de curupay o ybyrapytã.	Unidad	2	1,00	0,00	1,00	50,00%
3.6		Sustitución de tirantes de ménsula (media tijera) en los corredores deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos. Con las mismas secciones de las originales.	Unidad	2	1,00	0,00	1,00	50,00%
3.7		Sustitución de viga cumbrera deberá ser con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.8		Sustitucion de tirantes en mal estado con la misma especie de maderamen o madera lapacho, debiendo presentarse perfectamente secas, sin deformaciones o nudos y con la misma sección de los originales.	Metros	116	17,60	50,00	67,60	58,28%

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Carlos C. González Zelada
Arquitecto

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

			Unidad de Medida	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado	
3.9		Sustitución de alfajías de madera en mal estado, de 1" X 4", incluye de los corredores.	Metros	500	100,00	190,00	290,00	58,00%
3.10		Limpieza de tejas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y água corriente y tratamiento con hidrófugo por inmersion	Metros cuadrados	180	90,00	36,00	126,00	70,00%
3.11		Provisión de tejas ceramicas similares a las existentes con mismas dimensiones y curvatura.	Metros cuadrados	60	40,00	0,00	40,00	66,67%
3.12		Limpieza de tejuelitas recuperadas con cepillo de cerdas blandas y agua corriente.	Unidad	192	96,00	38,40	134,40	70,00%
3.13		Provisión de tejuelitas similares a las existentes	Unidad	48	0,00	48,00	48,00	100,00%
3.14		Mano de obra de retechado de tejas y tejuelas con montaje de alfajías, tirantes y vigas,	Metros cuadrados	240	120,00	50,00	170,00	70,83%
3.15		Provisión y colocacion de aislación de techo con membrana asfaltica de 3 mm con aluminio	Metros cuadrados	240	120,00	50,00	170,00	70,83%
3.16		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 5,00 m	Unidad	2	2,00	0,00	2,00	100,00%
3.17		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 2,50 m	Unidad	1	1,00	0,00	1,00	100,00%
3.18		Cambio de pilares (horcones) de madera lapacho 10,5" x 9,5" x 1,00 m	Unidad	10	6,00	2,00	8,00	80,00%
3.19		Cambio de viga horizontal en ménsula de madera lapacho 8" x 6" x 2,50 m	Unidad	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1				
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) (por boca)	Unidad	30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris con accesorios (curvas y abrazaderas)	Unidad	60	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3		Tablero externo con llaves TM (por boca)	Unidad	30	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	25	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo farol colonial color negro de pared con 1 lampara LED	Unidad	15	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	72102602-001	PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1				
5.1		Mantenimiento de puertas y ventanas (madera y herrajes)	Metros cuadrados	114	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	72131601-012	PINTURA	Unidad	1				
6.1		De paredes de interiores y exteriores con pintura PVA Látex, colores claros a definir	Metros cuadrados	355	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2		De parte inferior de paredes interiores y exteriores (zocalos) con pintura para piso, color a definir	Metros cuadrados	210	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.3		De techo de tejas con esmalte sintético (tejuelas en color blanco y maderamen a definir)	Metros cuadrados	240	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.4		De estructura de madera del techo de los corredores (aleros) con esmalte sintetico mate color a definir	Metros cuadrados	140	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.5		De puertas y ventanas con esmalte sintético semi-mate color a definir	Metros cuadrados	228	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.6		De rejas metálicas con esmalte sintetico semi-mate color grafito claro.	Metros cuadrados	42	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	72153605-001	SANITARIO NUEVO	Unidad	1	0,60	0,10	0,70	70,00%
8	72103003-001	DEMOLICIONES	Unidad	1	0,50	0,40	0,90	90,00%

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

RESIDENTE DE OBRAS
Carlos C. Gonzalez Zelada
Arquitecto

FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
Cálculo Estructural - Obras Civiles y Viales
Obras Industriales - Obras de Saneamiento

Adela Speratti 1689 c/Rca. Francesa
Telefax: (021) 222 552
(021) 211 900
e-mail: ibaconst@click.com.py
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2022 - Contrato N° 01/2022 "Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas" - PROYECTO "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" con ID: 415978

CURVA DE INVERSION - Periodo: DICIEMBRE 2022/ENERO 2023

MONTO CONTRATO + CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 Gs:	378.318.691

		Inicio	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias
PROYECTADO	Porcentaje %	0,00	19,93%	39,47%	73,91%	90,40%	100,00%
	Valores Gs.	0	75.398.915	149.322.387	378.318.692	342.000.097	378.318.691
EJECUTADO	Porcentaje %	0,00	33,70%	45,02%			
	Valores Gs.	0	127.499.210	170.335.256			

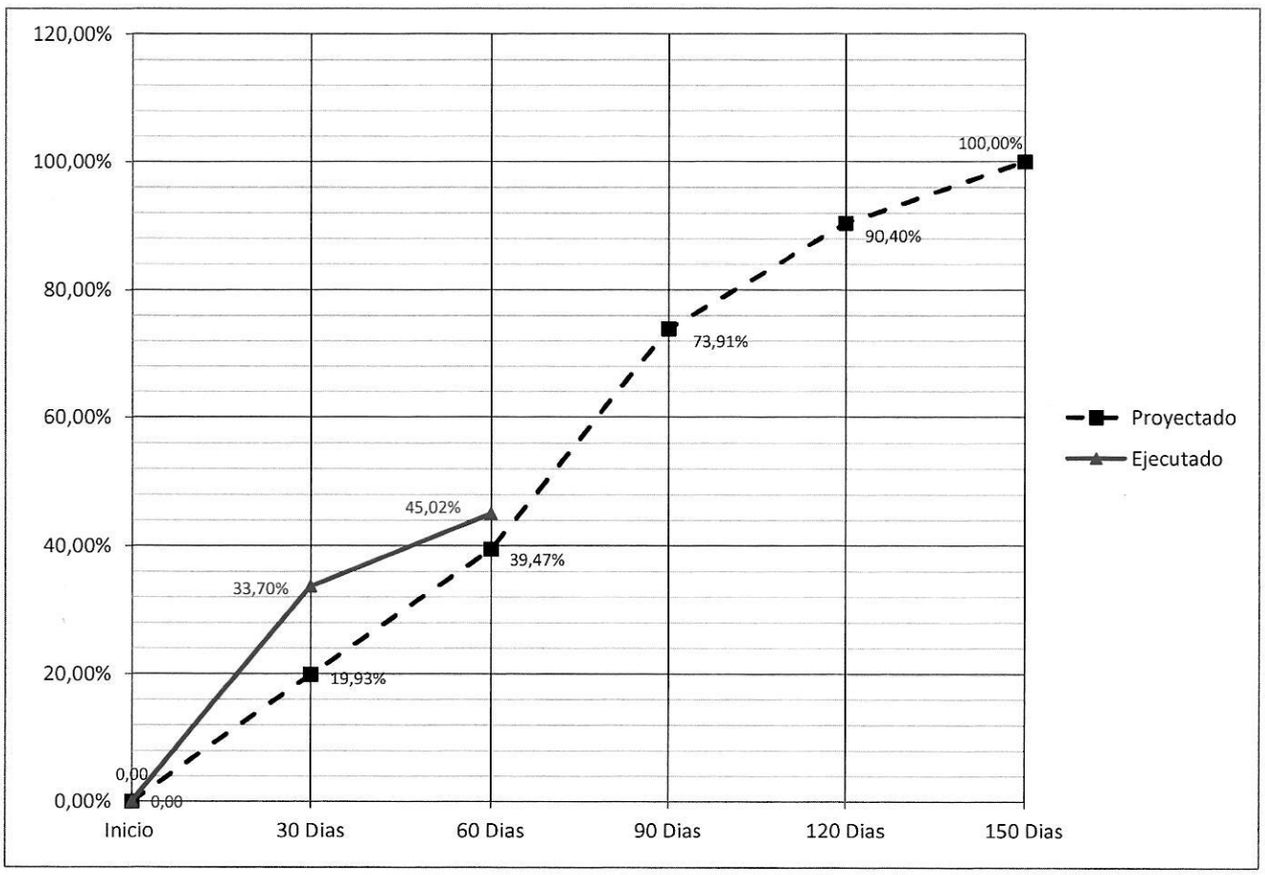

CONTRATISTA
Ing. Mario Raul Ibarrola Adorno
Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRA
Secretaria Nacional de Cultura
Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/

ID Llamado: 415978

Llamado: Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	2300073	Activo	
NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	937306	Activo	
Ruben Antonio	Duarte Martinez	1436444	Activo	
Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	4492994	Activo	
SIMONA	LOPEZ SILVA	1857999	Activo	

Nuevo Formulario de Identificación del Personal

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

RUC

430285-0

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 415978 / Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Monto del contrato

52[illegible]71.154

Año: 2022 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Gustavo Bernardo	Lopez Gonzalez	Cumplio	3200000	Contratista	Activo
2	NICOLAS	GONZALEZ GALEANO	Cumplio	1765602	Contratista	Activo
3	Lidia Elizabeth	Bareiro Duarte	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
4	SIMONA	LOPEZ SILVA	Cumplio	1765602	Contratista	Activo
5	Ruben Antonio	Duarte Martinez	Cumplio	4500000	Contratista	Activo

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA

Usuario Impresión: 2300073-430285

Fecha Impresión: 17/01/2023

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 430285

NRO. CERTIFICADO: 368727

FECHA EMISION: 10-01-2023

VENCIMIENTO: 20-02-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 430285

Nro. Certificado: 368727

Razon Social: IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-1997

Cantidad de Asegurados: 6

Nro. Patronal(es): 0004-40-0356 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ing. Mario R. Ibarrola
EMPRESA CONSTRUCTORA
