GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509	100%	196.228.895	0,00%	0	35,60%	69.855.501	35,60%	69.855.501
A	**Total por Contrato**	**100%**	**196.228.895**	**0,00%**	**0**	**35,60%**	**69.855.501**	**35,60%**	**69.855.501**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	39.245.779	0	13.971.100	13.971.100
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**39.245.779**	**0**	**13.971.100**	**13.971.100**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				55.884.401	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**55.884.401**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**91/23**
Monto Básico:	**196.228.895**
Contratista:	**ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 dias**
Fecha de terminación prevista:	**16-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Cincuenta y cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos uno.

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Obras Públicas y Transporte

2000000

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509

CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	196.228.895	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	91/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)	Unidad	1,00	992.501	992.501	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	1,00	1,00	0	992.501	992.501
2	Construcción de empedrado - Construcción de Cordón cuneta de H°.	Metros cúbicos	56,60	864.488	48.930.020	0,249	0,00%	70,86%	70,86%	-	0,177	0,177	0,00	40,10	40,10	0	34.670.000	34.670.000
3	Construcción de empedrado - Empedrado de Piedra Basáltica	Metros cuadrados	3665,50	34.193	125.334.442	0,639	0,00%	27,28%	27,28%	-	0,174	0,174	0,00	1.000,00	1.000,00	0	34.193.000	34.193.000
4	Construcción de empedrado - Relleno superior de empedrado con Cernidura de polvo de piedra.	Metros cuadrados	3665,50	3.651	13.382.741	0,068	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Construcción de empedrado - Badén de H°A° e=20cm con malla metálica simple de varillas de 8mm cada 15cm	Metros cúbicos	3,90	1.742.989	6.797.657	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	Limpieza de obra - Limpieza general de la zona de obra	Unidad	1,00	791.534	791.534	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Total				**196.228.895**	**100%**				**0,00%**	**35,60%**	**35,60%**				**0**	**69.855.501**	**69.855.501**

INGENIERIA
RUC: 3030

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Dreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

(4)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509

Contrato N°: 91/23			
Monto del Contrato:	196.228.895	**Fecha de terminación prevista:**	16-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	992.501	992.501	10.000.000	10.000.000	0,51%	0,51%	5,10%	5,10%
Enero	47.891.900	48.884.401	59.855.501	69.855.501	24,41%	24,91%	30,50%	35,60%
Febrero	100.009.117	148.893.518			50,97%	75,88%		
Marzo	47.335.377	196.228.895			24,12%	100,00%		

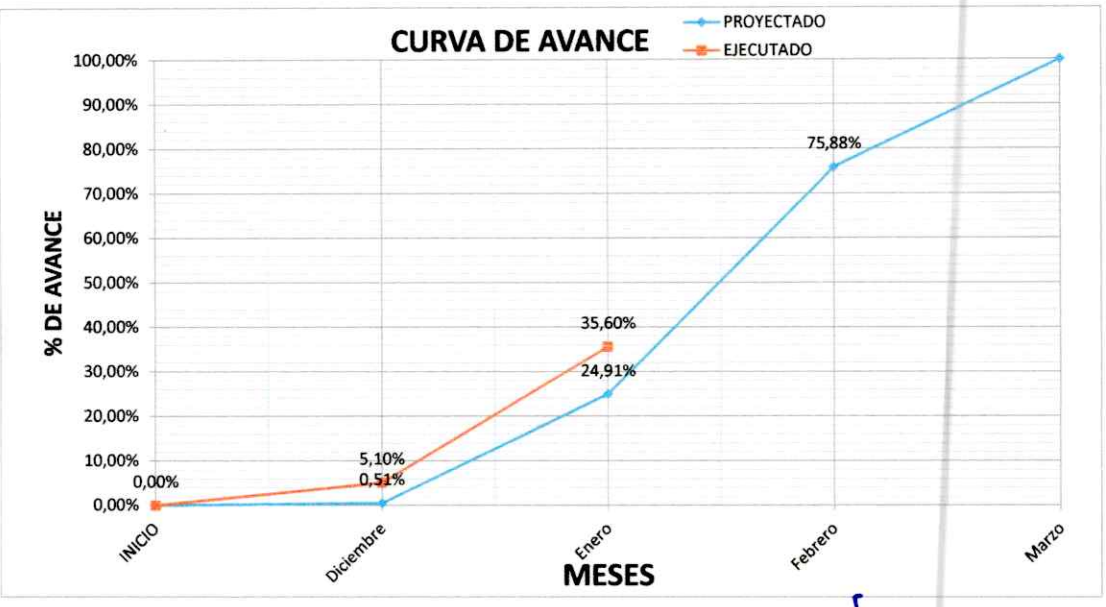

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Cieggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	196.228.895	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	91/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509							PLAZO DE EJECUCIÓN			TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)	Unidad	1,00	992.501	992.501	992.501				0,51%
2	Construcción de empedrado - Construcción de Cordón cuneta de H°.	Metros cúbicos	56,60	864.488	48.930.020		24.121.568	24.808.452		24,94%
3	Construcción de empedrado - Empedrado de Piedra Basáltica	Metros cuadrados	3665,50	34.193	125.334.442		23.770.332	75.200.665	26.363.445	63,87%
4	Construcción de empedrado - Relleno superior de empedrado con Cernidura de polvo de piedra.	Metros cuadrados	3665,50	3.651	13.382.741				13.382.741	6,82%
5	Construcción de empedrado - Badén de H°A° e=20cm con malla metálica simple de varillas de 8mm cada 15cm	Metros cúbicos	3,90	1.742.989	6.797.657				6.797.657	3,46%
6	Limpieza de obra - Limpieza general de la zona de obra	Unidad	1,00	791.534	791.534				791.534	0,40%
	Total				**196.228.895**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						992.501	47.891.900	100.009.117	47.335.377	**196.228.895**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						0,51%	24,41%	50,97%	24,12%	**100%**

INGENIERIA
RUC: 3030...

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

000000.6

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN **BELLA VISTA**"

UBICACIÓN: BARRIO PARQUE	**DISTRITO:** BELLA VISTA	**COORDENADAS UTM:** ---	**MONTO DE LA OBRA:** **196.228.895 gs**
EMPRESA CONTRATISTA: D.J. INGENIERIA	**Nº DE TELÉFONO:** **0983-578.600**	**Nº CONTRATO:** **91/2023**	**FECHA DE INICIO:** **18/12/2023**
MODALIDAD / LOTE: Contratación Directa	**PLAZO CONTRACTUAL:** 90 DÍAS CALENDARIO	**AMPLIACIONES (ADENDA):**	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 18/03/2024

FISCALES A CARGO: Secretaría de Obras

FECHA DE VISITA: Diciembre/ Enero del 2024

AVANCE DE OBRA: 35.60 %

OBSERVACIONES GENERALES: Trabajos de cargamento de H° en cordón cuneta – se iniciaron la colocación de piedras y verificación de los tamaños - control de medidas y procedimientos.

EMPEDRADO DEL DISTRITO DE BELLA VISTA.

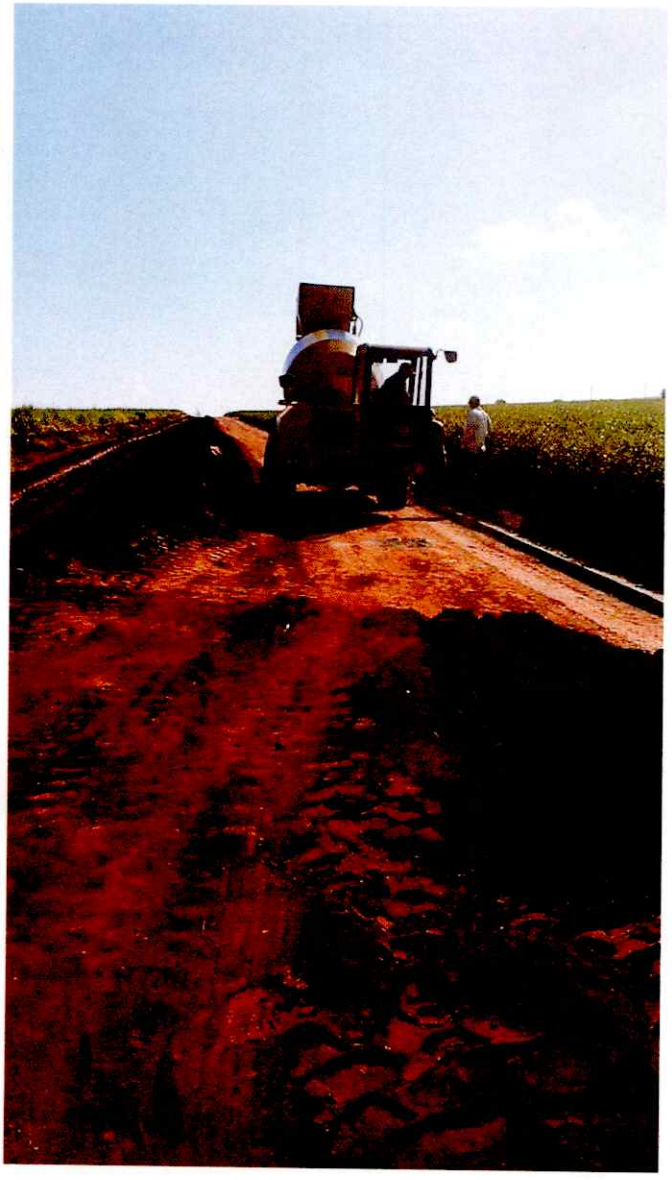

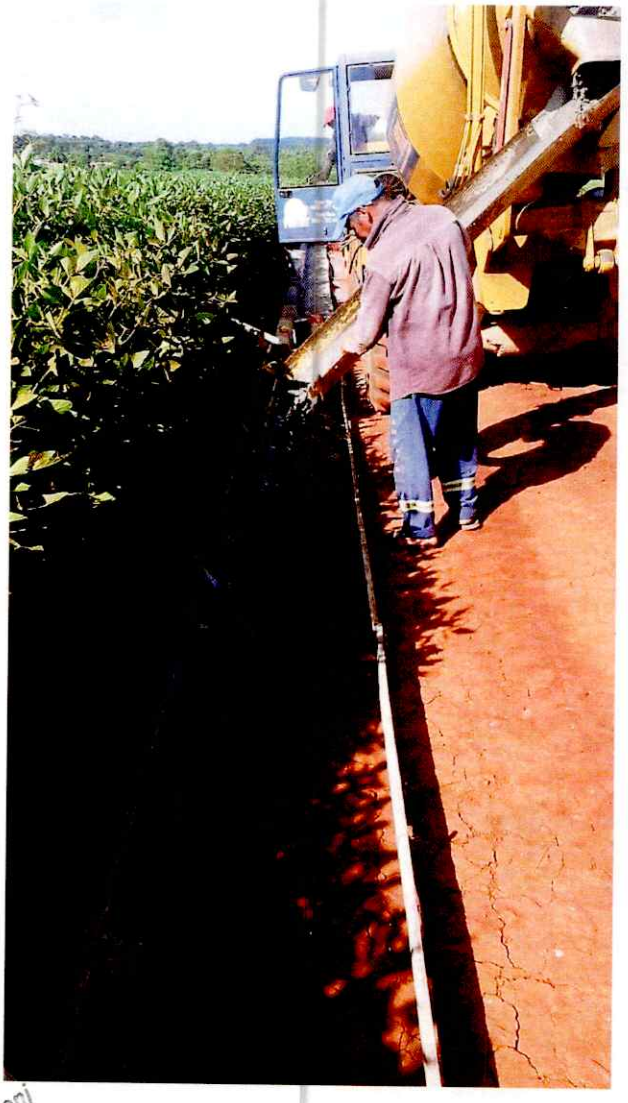

Teléf: +595720456
Correos: generalitapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

EMPEDRADO DEL DISTRITO DE BELLA VISTA.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Cregcioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
