GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°9

Mes: Agosto -2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2024 - ID: 453313 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANÁ Y ALTO VERA - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA	100%	1.059.421.020	87,29%	924.781.820	2,32%	24.564.800	89,61%	949.346.620
A	**Total por Contrato**	**100%**	**1.059.421.020**	**87,29%**	**924.781.820**	**2,32%**	**24.564.800**	**89,61%**	**949.346.620**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	211.884.204	184.956.364	4.912.960	189.869.324
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**211.884.204**	**184.956.364**	**4.912.960**	**189.869.324**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				19.651.840	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**19.651.840**	

Certificado Básico Nº	**9**
Mes:	**Agosto -2025**
Contrato N°:	**45/2024**
Monto Básico:	**1.059.421.020**
Contratista:	**Construmaq Sur S.R.L.**
Fecha de Inicio:	**28-nov-24**
Plazo de Ejecución:	**240**
Fecha de terminación prevista:	**26-jul-25**
Prórroga(días):	**101**
Fecha de terminación con prórroga:	**4-nov-25**

SON EN GUARANIES: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

Construmaq Sur S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Ing. Freydber Fernando Chavez González
Representante Legal
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Secretario de Obras Pública
Gobernación de Itapúa

Ing. Carsti Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 4.057
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 9

CONTRATO N° 45/2024.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2024 - ID: 453313 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANÁ Y ALTO VERA - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA

CONTRATISTA: CONSTRUMAQ SUR S.R.L

En el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los 29 días del mes de agosto de dos mil veinticinco, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa el Ing. Carlos Amarilla, encargado de la verificación y fiscalización de la obra y el Ing. Freydber Fernando Chávez González, Representante Legal de la empresa CONSTRUMAQ SUR S.R.L, para la ONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANÁ Y ALTO VERA - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA. Que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados en el mes de agosto 2025

En la verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscriben la presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado más arriba.

CONTRATISTA
CONSTRUMAQ SUR S.R.L
Representante Técnico

Ing. Freydber Fernando Chavez González
Representante Legal
CONSTRUMAQ
SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCAL DE OBRA
GOBERNACION DE ITAPUA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Amarilla
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 9

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Agosto -2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2024 - ID: 453313 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANÁ Y ALTO VERA - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA

CONTRATISTA:	Construmaq Sur S.R.L.	FECHA DE INICIO:	28-nov-24
MONTO DE LA OFERTA:	1.059.421.020	FECHA DE TERMINACION PREVISTA:	26-jul-25
CONTRATO N°:	45/2024	PRÓRROGA:	101
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240	FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:	4-nov-25

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Contractual		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Movilización (Despeje e instalaci de campament, señalizac, segur y salud, transp de equi en z de obr)	GL	1,00	35.000.000	35.000.000	0,033	100,00%		100,00%	0,033	-	0,033	1,00		1,00	35.000.000	-	35.000.000
2	Servicio de Estudio de Suelo	GL	1,00	17.250.000	17.250.000	0,016	100,00%		100,00%	0,016	-	0,016	1,00		1,00	17.250.000	-	17.250.000
3	Servicio de Verificación estructural (cálculo)	GL	1,00	17.250.000	17.250.000	0,016	100,00%		100,00%	0,016	-	0,016	1,00		1,00	17.250.000	-	17.250.000
4	Excavación de Suelo. No clasificada	M3	445,73	60.000	26.743.500	0,025	100,00%		100,00%	0,025	-	0,025	445,73		445,73	26.743.500	-	26.743.500
5	Excavación de suelo con encamisado para pilotes y cabezales	M3	53,74	85.000	4.567.900	0,004	59,10%	12,54%	71,64%	0,003	0,001	0,003	31,76	6,740	38,50	2.699.600	572.900	3.272.500
6	Pilotes perforados de Ø0,60m y Cabezal de H°A° fck: 250 kg/cm2	UNI	53,74	3.550.000	190.777.000	0,180	59,10%	12,54%	71,64%	0,106	0,023	0,129	31,76	6,740	38,50	112.748.000	23.927.000	136.675.000
7	Estribos cerrados de H°A (fck: 250 kg/cm2)	M3	125	3.700.000	462.130.000	0,436	96,60%	0,00%	96,61%	0,421	0,000	0,421	120,66	0,002	120,66	446.434.600	7.400	446.442.000
8	Ménsulas de Hormigon Armado fck: 250 kg/cm2	UNI	8,00	550.000	4.400.000	0,004	100,00%		100,00%	0,004	-	0,004	8,00		8,00	4.400.000	-	4.400.000
9	Drenaje detrás de muros	M3	31,00	320.000	9.920.000	0,009	100,00%		100,00%	0,009	-	0,009	31,00		31,00	9.920.000	-	9.920.000
10	Apoyos Neoprenos según planos. Incluye altar de Hormigón Armado	UNI	8,00	2.400.000	19.200.000	0,018	100,00%		100,00%	0,018	-	0,018	8,00		8,00	19.200.000	-	19.200.000
11	Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)	M3	18,13	5.200.000	94.276.000	0,089	100,00%		100,00%	0,089	-	0,089	18,13		18,13	94.276.000	-	94.276.000
12	Izaje de vigas longitudinales prefabricadas	UNI	4,00	4.000.000	16.000.000	0,015				-	-	-	-		-	-	-	-
13	Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 250 kg/cm2)	M3	5,99	4.000.000	23.964.000	0,023	56,51%	0,24%	56,75%	0,013	0,000	0,013	3,39	0,014	3,40	13.542.500	57.500	13.600.000
14	Losetas de H°A° prefabricadas 2,05x0,36 (espesor 8cm)	UNI	81,00	215.000	17.415.000	0,016	100,00%		100,00%	0,016	-	0,016	81,00		81,00	17.415.000	-	17.415.000
15	Losetas de HºAº Prefabricadas 0,54x0,36 (espesor 8 cm)	UNI	54,00	93.000	5.022.000	0,005	100,00%		100,00%	0,005	-	0,005	54,00		54,00	5.022.000	-	5.022.000
16	Losa de H°A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)	M3	15,12	3.392.000	51.287.040	0,048	100,00%		100,00%	0,048	-	0,048	15,12		15,12	51.287.040	-	51.287.040
17	Juntas de dilatación	ml	18,00	1.300.000	23.400.000	0,022	100,00%		100,00%	0,022	-	0,022	18,00		18,00	23.400.000	-	23.400.000
18	Capa de desgaste según planbo (fck:250 kg/cm2)	M3	5,79	1.802.000	10.433.580	0,010	100,00%		100,00%	0,010	-	0,010	5,79		5,79	10.433.580	-	10.433.580
19	Baranda de H° A° - prefabricada	ml	24,00	740.000	17.760.000	0,017	100,00%		100,00%	0,017	-	0,017	24,00		24,00	17.760.000	-	17.760.000
20	Empastado de Taludes	M2	175,00	19.000	3.325.000	0,003				-	-	-	-		-	-	-	-
21	Señalización Vertical	M2	4,00	1.450.000	5.800.000	0,005				-	-	-	-		-	-	-	-
22	Limpieza final de obra	M2	175,00	20.000	3.500.000	0,003				-	-	-	-		-	-	-	-
	Total				1.059.421.020	1,000				87,29%	2,32%	89,61%				924.781.820	24.564.800	949.346.620

Construmaq Sur S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Ing. Freydber Fernando Chavez González
Representante Legal
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 9

CUADRO Y CURVA DE AVANCE	MES: Agosto -2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2024 - ID: 453313 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANÁ Y ALTO VERA - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA

Contrato N°: 45/2024

Monto del Contrato:	1.059.421.020	Fecha de terminación prevista:	26-jul-25
Plazo Contractual:	240	Prórroga:	101
Inicio de Obra:	28-nov-24	Fecha de terminación con prórroga:	4-nov-25

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dic-24	52.000.000	52.000.000	78.662.011	78.662.011	4,91%	4,91%	7,43%	7,43%
ene-25	15.655.700	67.655.700	264.269.014	342.931.025	1,48%	6,39%	24,94%	32,37%
feb-25	53.811.100	121.466.800	175.669.563	518.600.588	5,08%	11,47%	16,58%	48,95%
mar-25	130.581.400	252.048.200	57.902.113	576.502.700	12,33%	23,79%	5,47%	54,42%
abr-25	168.514.300	420.562.500	126.299.000	702.801.700	15,91%	39,70%	11,92%	66,34%
may-25	280.539.300	701.101.800	33.321.000	736.122.700	26,48%	66,18%	3,15%	69,48%
jun-25	170.997.400	872.099.200	137.065.540	873.188.240	16,14%	82,32%	12,94%	82,42%
jul-25	187.321.820	1.059.421.020	51.593.580	924.781.820	17,68%	100,00%	4,87%	87,29%
ago-25			24.564.800	949.346.620			2,32%	89,61%
sept-25								
oct-25								
nov-25								

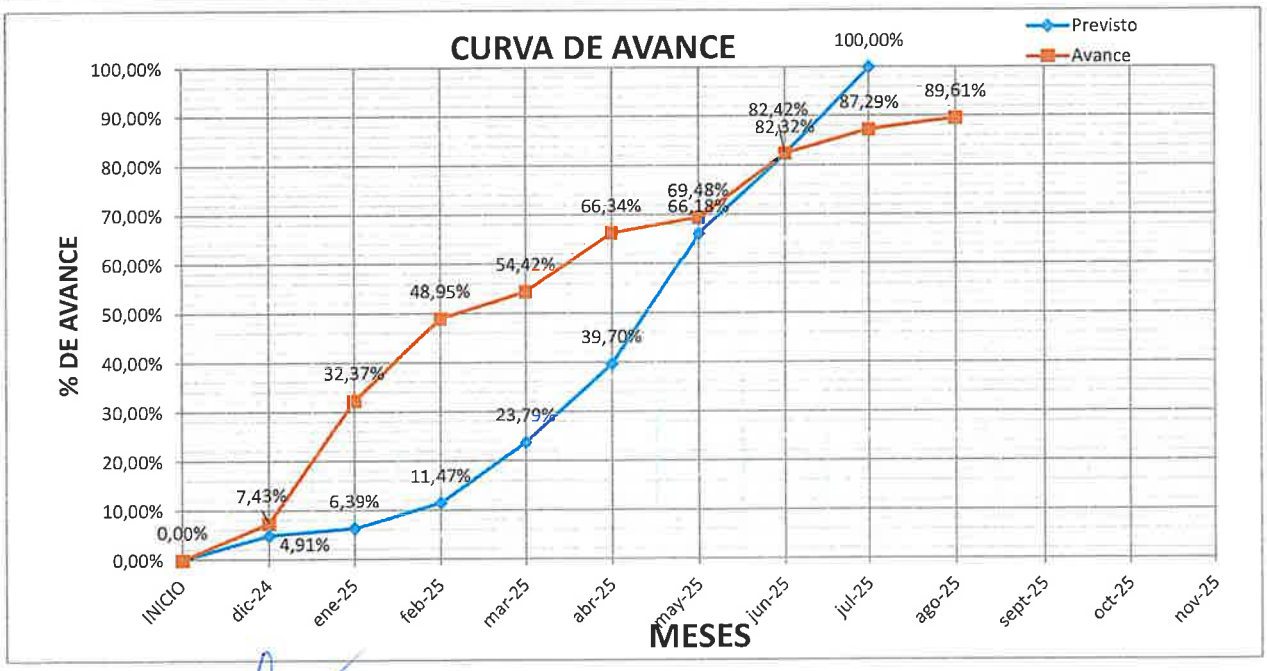

Construmaq Sur S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Ing. Freydber Fernando Chavez González
Representante Legal
CONSTRUMAQ
SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 9

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

MES: Agosto -2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2024 - ID: 453313 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE CAMBYRETA-SAN PEDRO DEL PARANÁ Y ALTO VERA - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA

CONTRATISTA:	Construmaq Sur S.R.L.	FECHA DE INICIO:	28-nov-24
MONTO DE LA OFERTA GS:	1.059.421.020	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	26-jul-25
CONTRATO N°:	45/2024	PRÓRROGA:	101
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	4-nov-25

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE Nº 03 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ALTO VERA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	INCIDENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	TOTAL
1	Movilización (Despeje e instalaci de campament, señalizac, segur y salud, transp de equi en z de obr)	GL	1,00	35.000.000	35.000.000	3,30%									100,00%
2	Servicio de Estudio de Suelo	GL	1,00	17.250.000	17.250.000	1,63%									100,00%
3	Servicio de Verificación estructural (cálculo)	GL	1,00	17.250.000	17.250.000	1,63%									100,00%
4	Excavación de Suelo, No clasificada	M3	445,73	60.000	26.743.500	2,52%									100,00%
5	Excavación de suelo con encamisado para pilotes y cabezales	M3	53,74	85.000	4.567.900	0,43%									100,00%
6	Pilotes perforados de Ø0,60m y Cabezal de H°A° fck: 250 kg/cm2	UNI	53,74	3.550.000	190.777.000	18,01%									100,00%
7	Estribos cerrados de H°A (fck: 250 kg/cm2)	M3	124,90	3.700.000	462.130.000	43,62%									100,00%
8	Ménsulas de Hormigon Armado fck: 250 kg/cm2	UNI	8,00	550.000	4.400.000	0,42%									100,00%
9	Drenaje detrás de muros	M3	31,00	320.000	9.920.000	0,94%									100,00%
10	Apoyos Neoprenos según planos, Incluye altar de Hormigón Armado	UNI	8,00	2.400.000	19.200.000	1,81%									100,00%
11	Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)	M3	18,13	5.200.000	94.276.000	8,90%									100,00%
12	Izaje de vigas longitudinales prefabricadas	UNI	4,00	4.000.000	16.000.000	1,51%									100,00%
13	Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 250 kg/cm2)	M3	5,99	4.000.000	23.964.000	2,26%									100,00%
14	Losetas de H°A° prefabricadas 2,05x0,36 (espesor 8cm)	UNI	81,00	215.000	17.415.000	1,64%									100,00%
15	Losetas de HºAº Prefabricadas 0,54x0,36 (espesor 8 cm)	UNI	54,00	93.000	5.022.000	0,47%									100,00%
16	Losa de H°A° e: 14 cm, (fck: 250 kg/cm2)	M3	15,12	3.392.000	51.287.040	4,84%									100,00%
17	Juntas de dilatación	ml	18,00	1.300.000	23.400.000	2,21%									100,00%
18	Capa de desgaste según planbo (fck:250 kg/cm2)	M3	5,79	1.802.000	10.433.580	0,98%									100,00%
19	Baranda de H° A° - prefabricada	ml	24,00	740.000	17.760.000	1,68%									100,00%
20	Empastado de Taludes	M2	175,00	19.000	3.325.000	0,31%									100,00%
21	Señalización Vertical	M2	4,00	1.450.000	5.800.000	0,55%									100,00%
22	Limpieza final de obra	M2	175,00	20.000	3.500.000	0,33%									100,00%
	Total				1.059.421.020										100,00%
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE							4,91%	1,48%	5,08%	12,33%	15,91%	26,48%	16,14%	17,68%	100,0%
PREVISTO MENSUAL ACUMULADO EN PORCENTAJE							4,91%	6,39%	11,47%	23,79%	39,70%	66,18%	82,32%	100,00%	
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE							52.000.000	15.655.700	53.811.100	130.581.400	168.514.300	280.539.300	170.997.400	187.321.820	1.059.421.020
PREVISTO MENSUAL ACUMULADO EN GUARANIES							52.000.000	67.655.700	121.466.800	252.048.200	420.562.500	701.101.800	872.099.200	1.059.421.020	

Construmaq Sur S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Ing. Freydber Fernando Chavez González
Representante Legal
CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO Nº 09

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO EN EL DISTRITO DE ALTO VERA – LOTE Nº 3 – ID: 453.313.-

FECHA: 01/09/2025

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	**Nº DE TELÉFONO:** 0981 104390	**MODALIDAD / LOTE:** LPN Nº 20/2024 **Nº CONTRATO:** 45/2024	**MONTO DEL CONTRATO:** 1.059.421.020 Gs.
FECHA DE INICIO: 28-11-2024	**PLAZO CONTRACTUAL:** 240DÍAS	**PRORROGA DE PLAZO:** 101 días – Res. Nº974/2025	**TERMINACIÓN PREVISTA CON PORROGA:** 04-11-2025.

Fiscal a Cargo: Secretaría de Obras Públicas.

Fecha de Visita: 29 de agosto del 2025

Avance de Obra: 89,61%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee buen avance con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance considerando la prórroga de plazo.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se anexa registro fotográfico de avances.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPART.
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públ...

Teléf: +595 7 204566
Correos: generalitapua@gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
