Asunción, 04 de febrero de 2022.

Señores:
Lic. Rocio Mencia Iriarte
Directora General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura
República del Paraguay

Presente -

Por la presente me dirijo a Usted, en el marco de la Construcción del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños, hacienda entrega del informe de avance de obra correspondiente al período diciembre del 2021 – enero del 2022 y su factura nº 001-001-0000626.

Atentamente,

Arq. Francisco Tomboly
Francisco Tomboly
Arquitecto
Reg. Prof. 210-0040002

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 200 Fecha: 01/02/22 Hora: 14:37
Asunto:
Recibido por: José Ortiz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
☐ DA ☑ DF ☑ DC ☐ DEP ☐ DCP ☐ UOA
A sus efectos.
Lic. José L. Ortiz A.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 36
Proceso: — Fecha: 04-02-2022
Entregado por: José Ortiz
Hora: 14:57 Recibido por:
Lic. Rosalicia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura

ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

A: Lic. Rocío Mencia Iriarte, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Francisco Tomboly, Director de Obra

Obra: Construcción del "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños" LPN N°02/2017, Subasta a la Baja Electrónica – Tercer llamado ID N°317.978

Fecha: 04 de febrero de 2022.

Referencia: Informe Avance de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Por el presente se remite el Informe referente al avance de las obras conforme al Contrato de Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 23 de diciembre al 04 de febrero de 2022.

Informe Avance de Obras conforme al contrato "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Contrato N°:13/2017 - Secretaria Nacional de Cultura
Contratista: Empresa Constructora Barrail Hnos. S.A.
Fiscal de Obras: Ing. Roberto Vera Vierci
Dirección de Obras: Arq. Francisco Tomboly

Actualmente se están ejecutando tareas de ajustes de aberturas metálicas y de aluminio, ajustes y reparaciones de plomería en sanitarios públicos y en estanques de agua, reparaciones de aislaciones de techo en distintos sectores. Se trabaja en tareas de pinturas en general. Estos son trabajos realizados por la Empresa Constructora Barrail Hnos. S. A. conforme al Contrato N°13/2017, llamado S.N.C. - L.P.N. N°02/2017 "Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños" – Tercer llamado – Subasta a la Baja Electrónica con ID N°317.978.

Avance de Obras, Desarrollo de Actividades

Se toma como fecha de cierre para la confección del presente informe la visita a la obra realizada por la Fiscalización y Dirección de Obra el día 04 de febrero del 2022.

Las tareas actualmente ejecutadas llevan a un porcentaje de avance:

- Tareas Preliminares: 100 %
- Demolición: 100 %
- Movimiento de Suelo: 100 %
- Fundaciones: 100 %
- Estructura Resistente: 100 %
- Mampostería y otros tabiques: 100 %
- Aislaciones: 100 %
- Revoques: 100 %
- Contrapisos Varios: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Zócalos: 100%

www.tomboly.com.py - arq.contacto@tomboly.com.py - +595 21 620 [illegible]
Dirección: 7 de mayo 340 c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Reg. Prof. [illegible]-0040092

- Revestimiento: 100 %
- Carpintería y Herrerías Varias: 99.17 %
- Pintura: 100 %
- Artefactos Sanitarios: 100 %
- Mesada de granito: 100%
- Varios: 100%
- Instalación de desagüe cloacal: 100 %
- Instalación de agua corriente: 100 %
- Fitodepuración de aguas: 100 %
- Instalación de desagüe pluvial: 100 %
- Instalación eléctrica: 100 %
- Señales Débiles: 100 %
- Transformador: 100 %
- Prevención contra incendio: 100%
- Acondicionamiento térmico: 100 %
- Trabajo para reparación de estructura: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°3:

Se contemplan los siguientes trabajos: relleno para parquización con material sobrante de obra y relleno con material orgánico. Cortes de juntas de dilatación en piso de piedra losa tipo rompecabeza y colocación de junta. Ejecución de piso de hormigón lavado. Mamposterías varias de 15 y 30 y muro del auditorio de isopanel con revoques. Provisión y colocación de membrana plástica protectora y drenante tipo mcdrain. Tratamiento de revestido de la mampostería panderete. Provisión y colocación de posapiés de barandas y de nichos de mármol con placas conmemorativas y ángulos de fijación.

- Movimiento de suelo: 100 %
- Mampostería y otros tabiques: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Aislaciones: 100 %
- Carpinterías y herrerías varias: 100 %
- Pintura: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°5:

Se contemplan los siguientes trabajos estructurales: tensores en cruz en Galería, estructura de H°A° para Ágora, estructura de H°A° para mueble del Ágora, estructura de H°A° para Lucernarios. Refuerzo estructural del Ágora: apuntalamiento de losas y vigas existentes para demolición y refuerzos estructurales. Estructura de H°A° en losas y vigas. Refuerzos estructurales en Plaza de las Sombras: pilotes, cabezales y pilares metálicos. Carpetas y pisos: colocación de resina sintética en pisos de hormigón, regularización de losa de H°A y carpeta para alfombra del auditorio. Piso tipo deck de hormigón para terraza C.D.A sobre mampostería. Carpinterías y herrerías varias. Anexos de instalaciones de desagüe cloacal, instalación de agua corriente, instalación de desagüe pluvial, instalación eléctrica. Escenario del auditorio, mueble de cocina y kitchenette. Mueble del ágora. Fosa del ascensor. Tapas de cierre y terminación de mampostería para ascensor. Techo de protección de sistema de A.A. Muro de cantero de piedra bruta, planchuela metálica con nombre de víctimas, cierre de piso del C.D.A con estructura metálica y vidrio. Gárgolas metálicas de caño 100x100 para desagüe pluvial en techo Galería. Huella y contrahuella de granito verde ubatuba para escalera de hormigón. Mamparas de baño granito verde ubatuba.

www.tomboly.arisimo.com contacto@tomboly.arisimo.com (595 21 620 074
Dpto. R.U.I, 2 de mayo 540, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040002

- Estructura resistente: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Carpinterías y herrerías varias: 100 %
- Instalación de desagüe cloacal: 100 %
- Instalación de agua corriente: 100 %
- Instalación de desagüe pluvial: 100 %
- Instalación eléctrica: 100 %
- Varios: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°10:

Adenda que contempla los trabajos de demoliciones de elementos que aparecen bajo vereda, descubiertas al ejecutar tareas tales como vereda según proyecto o parquizaciones de los patios. Se contempla también la demolición y re ejecución del pavimento existente para el lugar del estacionamiento de la ambulancia, en el nivel correspondiente de calle, evitando así, el acceso y estacionamiento de vehiculos particulares sobre la vereda. Membrana anti raíz, a partir de las recomendaciones de los especialistas para asegurar la duración prolongada de las aislaciones del cantero sobre la Plaza de las Luces, ya que las raíces de las plantas podrían dañarlas a mediano y largo plazo. Carpetas y pisos, ítem que prevé juntas en los pisos de piedras para facilitar la contracción y dilatación del material sin que aparezcan fisuras, piso de adoquín y cordones de vereda por trabajos de Essap, Ande y modificaciones en el desagüe pluvial, cortes adicionales en piso de adoquines, rampas de vereda en Av. Artigas y Av. Santísima Trinidad, rampa vehicular de H°A° en acceso al Estacionamiento, cordón depósito SUM (desagüe pluvial). Se contempla adicionar trabajos de Carpintería y Herrerías varias para los trabajos de puertas box de baños, readaptación del portón de estacionamiento por peso, puerta de salida de emergencia CDA y CDT, modificaciones en puerta del Espacio Ecuménico, portón pivotante acceso peatonal Artigas, escalera de varillas para puertas de emergencia, prefiltros para estanque central y estanques menores, ángulo metálico para junta de dilatación del Memorial, manijas de varillas para puertas del mueble del Ágora, protección metálica tipo babeta en pantalla de H°A° Auditorio, prolongaciones en rejas perimetrales, cielorraso de escalera de acceso al Hall del Auditorio y ducto del ascensor, barra de danza para equipamiento del SUM. Se adicionan también trabajos para los ítems zócalos, pinturas, trabajos varios, instalación de agua, fitodepuración, desagüe pluvial, instalación eléctrica y pci.

- Demoliciones: 100 %
- Aislaciones: 100 %
- Carpetas y pisos: 100 %
- Carpinterías y Herrerías Varias: 100 %
- Zócalos: 100 %
- Pintura: 100 %
- Varios: 100 %
- Instalación de Agua: 100 %
- Fitodepuración: 100.00 %
- Desagüe pluvial: 100 %
- Instalación eléctrica: 100 %
- PCI: 100 %
- Avance Global: 100%

Adenda N°11:

Adenda que contempla los trabajos adicionales de instalación eléctrica surgidos con las puestas en marcha: provisión y colocación de cables T.P.R para cuatro bombas de 15HP y bomba depuradora del sistema de chorros de agua, tomas para

www.tomboly carisimo.com contacto@tomboly carisimo.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 313 / Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-00400092

el escenario del Auditorio con llaves de 32 Amper, encendido de luces desde la Sala de Control del Auditorio, extensión eléctrica para la conexión de la caseta del guardia en el Sector Estacionamiento.

Incluye trabajos de instalación sanitaria: alimentación de canillas de Patio: trabajos de conexión de las cañerías desde la acometida de ESSAP para canillas de patio, válvula de retención 200 mm y llave de paso 75 mm en Estanque Central, adicional propuesto para el control del agua, evitando incidir en el nivel del tanque de PCI.

Se prevén trabajos de carpinterías y herrerías que contemplan la re ubicación de las rejas perimetrales hacia Santísima Trinidad, con el desmontaje de las rejas actuales para su reciclaje y reutilización, ejecución de dos portones nuevos, modificación de paños para completar la nueva altura y la colocación de los módulos, con caños 100x100 (fundados). Desmontaje de la Puerta acceso al Memorial y de la reja horizontal ubicada entre el cantero y el Memorial. Colocación de rejas varias en distintas ubicaciones. Colocación de una reja de protección del transformador: perimetral al transformador, con puerta de acceso y portacandado. Extensión de la baranda del Memorial, en el sector del puente de conexión con la Plaza de las Luces, para proteger el sitio de posibles accidentes. Pasamanos en rampas para favorecer el uso inclusivo del sitio. Manijones para puertas de acceso al Auditorio. Barral extra para baños de discapacitados: adicional propuesto para dar mejor respuesta al equipamiento inclusivo.

Incluye también la ejecución de la caseta del guardia en el acceso Vehicula, tipo contenedor de 20 pies de 2 ambientes con aislación térmica. Bordes de mármol de 5 cm en duchas en sanitarios. Equipamientos fijos que sostienen los basureros de clasificación de basura previstos en la licitación de Equipamiento y los bebederos públicos. Bicicleteros de varilla lisa plegada abulonada a piso.

Se contempla la realización de un revoque del muro lindero hacia Molas López y una pintura con impacril para dar mejor terminación y visualización del perímetro de la obra.

Se prevé también la reparación del hormigón al retirar rejas existentes, en caso de que queden roturas o cambios de color en el hormigón.

- Instalación eléctrica: 100 %
- Instalación sanitaria: 100 %
- Carpinterías y Herrerías Varias: 100 %
- Varios: 100 %
- Mampostería: 100 %
- Pintura: 100 %
- Avance Global: 100 %

Adenda N°12:

Adenda que contempla los trabajos adicionales de modificación del sistema de PCI según las exigencias planteadas en la mesa de trabajo de la cual formó parte el departamento de prevención contra incendio de la Municipalidad de Asunción, la dirección y la fiscalización técnica de obra, la empresa Barral Hnos y el proyectista encargado de la prevención contra incendios, el ing. Guido Duarte. A raíz de esto se llega a la modificación del proyecto presentado en esta adenda para la aprovación final de la Municipalidad para la habilitación del sitio.

- Red PCI: 100 %
- Soportería: 100 %
- Mano de obra: 100 %
- Avance Global: 100 %

Francisco Tomboly
Arquitecto
Reg. Prof. 010-0040092

www.tomboly.com.py contacto@tomboly.com.py +595 21 621071
Dpto. R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Semana de trabajo N°223 (27.12.2021 - 01.01.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: colocación de caseta tipo "casa fácil" sobre la base preparada de h°a° en el Estacionamiento. Confección de encofrados metálicos para basureros y bebederos en taller de herrería. Se realizan trabajos de PCI Hidráulico: montaje de cañerías en las instalaciones de la Plaza de las Sombras para adecuación del sistema conforme a la Adenda 12. Se realizan tareas de pulido de piso en sectores donde se sacaron las rejas perimetrales sobre Santísima Trinidad. Colocación de bicicleteros según planos, limpieza de obra y acarreo de escombros.

- Ágora: sin notificación.

- Plaza de las Luces: sin notificación.

- Techo Galería: sin notificación.

- Auditorio y sectores de servicio: se realizan tareas de ajustes de las puertas metálicos de los sanitarios en los núcleos de servicio. Limpieza de depósitos y retiro de materiales sobrantes de obra. Se realizan tareas de limpieza de h°a° en varios sectores. Trabajos de herrería: corrección de soportes del portón corredizo del Auditorio, reparación de marco y ajustes en hoja metálica. Colocación de manijones en las puertas de acceso a la Antesala del Auditorio. Se realizan tareas de ajustes de plomería: reparación de válvulas de descarga y ajustes de canillas.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: se realizan tareas de limpieza de h°a° y trabajos de pintura en varios sectores.

- Memorial: colocación de pasamanos para rampas de acceso al Memorial. Se realizan tareas de limpieza de h°a° en varios sectores.

Semana de trabajo N°224 (03.01.2022 - 08.01.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: avances en los trabajos de PCI Hidráulico: colocación de las válvulas de inspección y puestos de control conforme a la Adenda 12. Continua el montaje de los bicicleteros metálicos. Cargado de los bebederos y basureros de H°A° en los encofrados metálicos. Se realizan trabajos de pinturas de herrerías en varios sectores.

- Ágora: sin notificación

- Plaza de las Luces: colocación de rejas varias según indicaciones de la Adenda 11. Se realizan trabajos de pinturas de herrerías en varios sectores.

- Techo Galería: sin notificación.

- Auditorio y sectores de servicio: se realizan tareas de ajustes de puertas corredizas. Se realizan trabajos de pinturas de herrerías en varios sectores.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: se realizan tareas de ajustes de puertas corredizas. Se realizan trabajos de pinturas de herrerías en varios sectores.

- Memorial: avances en la colocación de señalizaciones de PCI Electrónico.

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040592

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com 595 21 612 1071
Direc.: P.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Semana de trabajo N°224 (10.01.2022 - 15.01.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: avances en los trabajos de PCI Hidráulico, continúan con el armado de las válvulas de inspección. Se realizan los trabajos de montaje de las válvulas de retención para el sistema de fitodepuración en el estanque central hacia el tanque de reserva.

- Ágora: sin notificación.

- Plaza de las Luces:

- Techo Galería: sin notificación.

- Auditorio y sectores de servicio: colocación de bordes de mármol en duchas de los núcleos de sanitarios públicos. Continúan las tareas de ajustes de puertas en varios sectores.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: continúan las tareas de ajustes de puertas en varios sectores.

- Memorial: continuan los trabajos de PCI Electrónico, ajustes de cañerías, colocación de carteles de salidas de emergencia

Semana de trabajo N°225 (17.01.2022 - 22.01.2022), Semana de trabajo N°226 (24.01.2022 - 29.01.2022) y Semana de trabajo N°227 (31.01.2022 - 05.02.2022)

- Plaza de las Sombras y accesos: se realizan trabajos de ajustes del sistema de PCI Hidràulico y Electrónico. Trabajos de reparación de las aislaciones. Ajustes de pinturas varias, limpieza de obra y retiro de materiales sobrantes.

- Ágora: sin notificación.

- Plaza de las Luces: se realizan trabajos de reparación y ajuste del piso de piedra losa tipo rompecabeza, limpieza general y pintura de herrería en varios sectores.

- Techo Galería: llega material para ejecutar las reparaciones de las aislaciones necesarias en el techo galeria.

- Auditorio y sectores de servicio: se realizan tareas de ajuste de cañerías de alimentacion de agua y descarga, retoques de pintura en varios sectores, ajustes de herrerías varias y puertas. Trabajos de limpieza del H°A°.

- Centro de Documentación, Archivo y Talleres: se realizan trabajos de reparaciones varias, ajustes de herrerias, ajustes de puetas de aluminio, pintura en varios sectores.

- Memorial: sin notificación.

Es nuestro informe.

Arq. Francisco Tomboly

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 6210
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

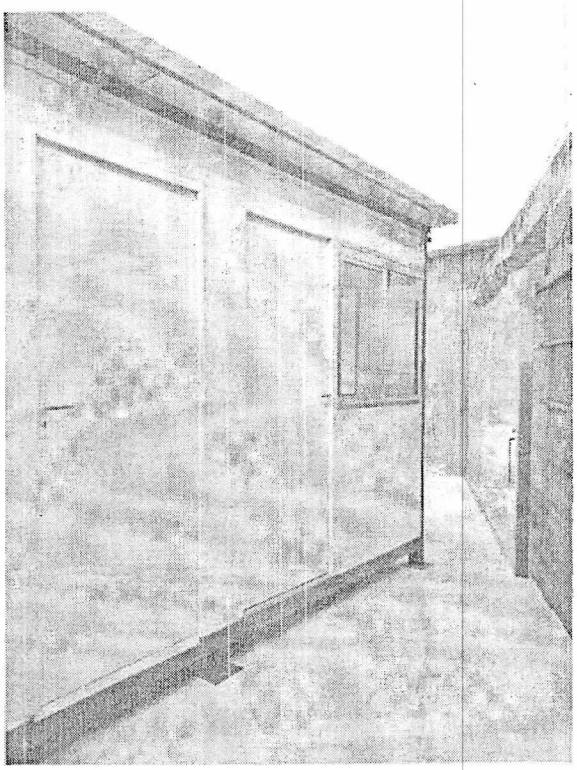

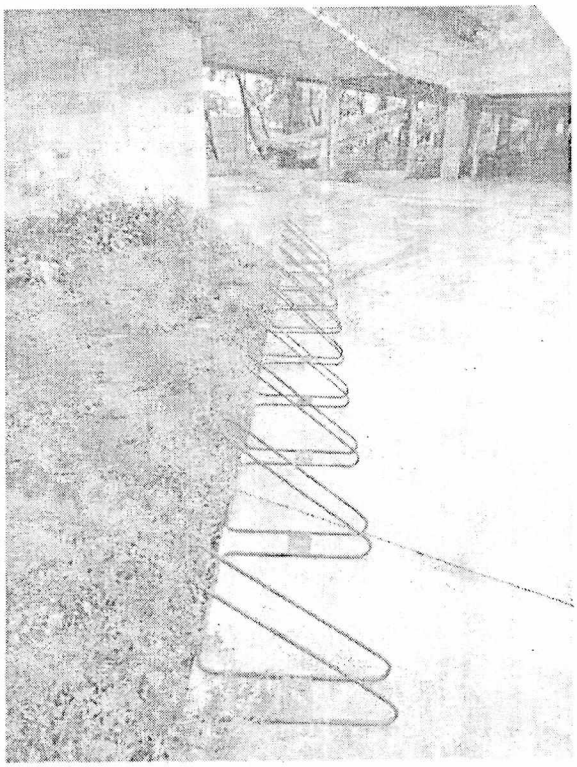

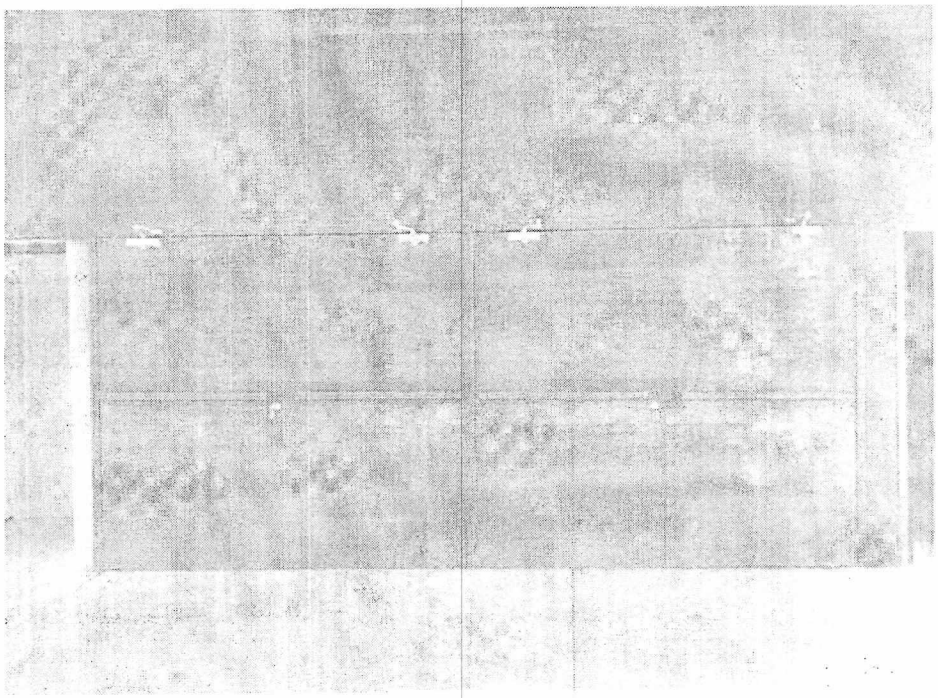

Semana 223

Foto 1: Arriba a la izquierda. Colocación de la caseta de guardia en la plataforma.

Foto 2: Arriba a la derecha. Colocación de bicicleteros metálicos.

Foto 3: Abajo. Colocación de los manijones de las puertas de acceso a la Antesala del Auditorio.

www.tomboly.com.py contacto@tomboly.com.py +595 21 621071
Dirección: 2 de mayo 343, c/ Carlos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040092

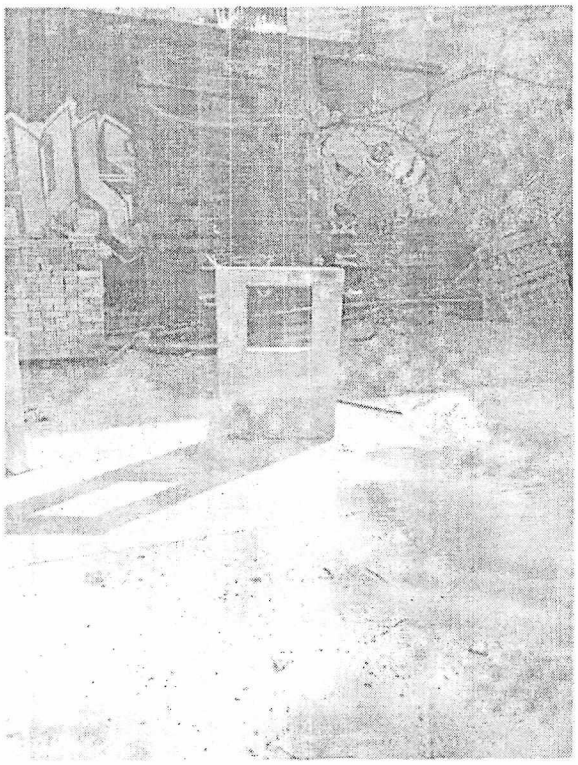

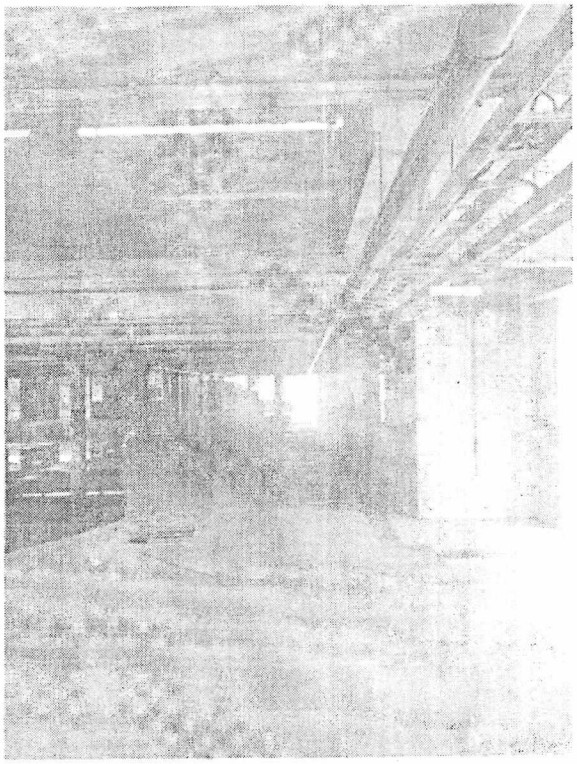

Semana 224

Foto 1: Arriba a la izquierda. Prototipo de prueba de un bebedero de hormigón ya desencofrado.

Foto 2: Arriba a la derecha. Moldes metálicos de bebederos y porta basureros.

Foto 3: Abajo. Armado de puestos de inspección del sistema de PCI Hidráulico.

www.tomblycarisma.com contacto@tomblycarisma.com +595 21 621071
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 313, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

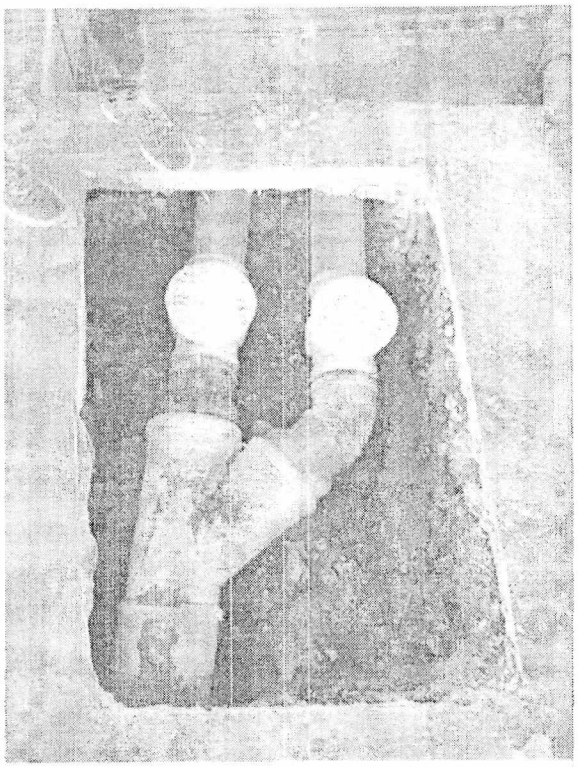

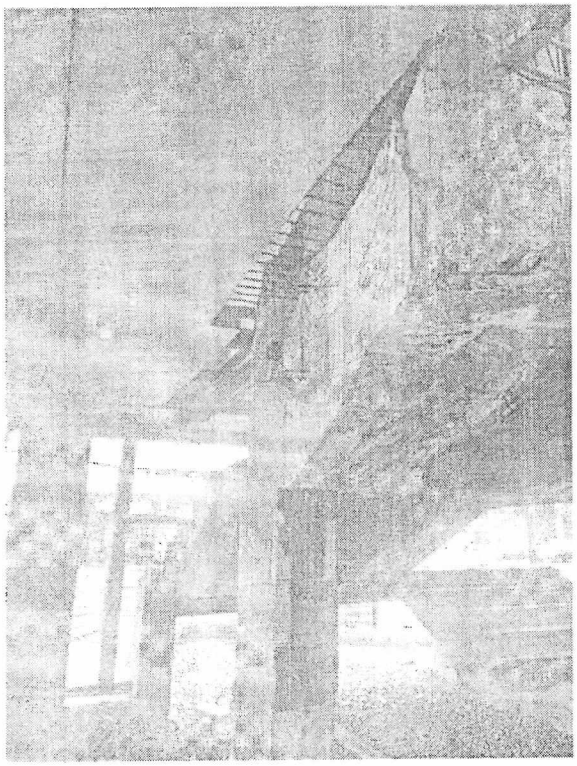

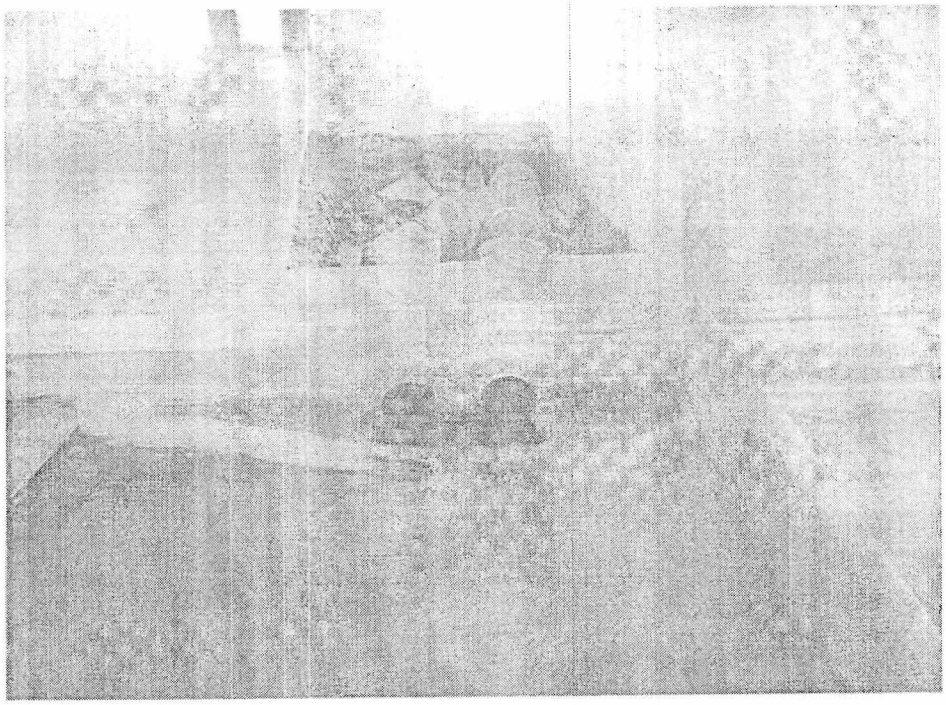

Semana 225

Foto 1: Arriba a la izquierda. Trabajos de colocación de la válvula de retencion y reducciones en es sistema de fitodepuración.

Foto 2: Arriba a la derecha. Rejas de cierre en sectores señalados por la Adenda 11.

Foto 3: Abajo. Trabajos de colocación de la válvula de retencion y reducciones en es sistema de fitodepuración.

www.tomboly.com.py contacto@tomboly.com.py ☎ +595 21 621021
Dir.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

A: Lic. Rocio Mencia Iriarte, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Francisco Tomboly, Director de Obra
Ing. Roberto Vera Vierci, Fiscal de Obras

Obra: Equipamiento del "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Fecha: 04 de Febrero de 2022.

Referencia: Informe Avance de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Por el presente se remite el Informe referente al avance de las obras conforme al Contrato de Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 23 de diciembre al 04 de febrero de 2022.

Informe Avance de Obras conforme al contrato "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Actualmente se ejecutan en obra coordinadamente las licitaciones correspondientes al equipamiento del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños. El estado de avance de cada licitación se detalla a continuación, en relación a las recepciones realizadas en el transcurso de este tiempo y los trabajos realizados en obra.

1. **FILMAT:** Licitación Publica Nacional N° 02/2019 "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.489.

Sin notificación.

2. **ELECTROPAR S.A:** Licitación Publica Nacional N° 02/2019 "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.489.

Sin notificación.

3. **VEKTOR S.R.L:** Licitación Publica Nacional N° 03/2019 "Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.490.

Sin notificación.

4. **COMACO S.R.L:** Licitación Publica Nacional N° 03/2019 "Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 367.490.

Sin notificación.

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

www.tombolycarisimo.com contacto@tombolycarisimo.com +595 21 621041
Direc: R.I.I. 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

A: Lic. Rocío Mencia Iriarte, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: Arq. Francisco Tomboly, Director de Obra
Ing. Roberto Vera Vierci, Fiscal de Obras

Obra: Equipamiento del "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Fecha: 04 de Febrero de 2021.

Referencia: Informe Avance de la Obra "Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

Por el presente se remite el Informe referente al avance de las obras conforme al Contrato de Obra "Adquisición de Mueble y Enseres de Oficina para el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura" correspondiente a los trabajos ejecutados desde el 23 de diciembre al 04 de febrero de 2021.

Informe Avance de Obras conforme al contrato
"Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1 A Ycua Bolaños"

La actual licitación adjudicada se conforma de cinco lotes a continuación detallados:

- Lote N°1: Muebles: recepción de
- Lote N°2: Cortinas Antisolares
- Lote N°3: Enseres
- Lote N°4: Basureros
- Lote N°5: Escalera

En el transcurso del mes se recibieron los muebles correspondientes a aquellos trabajados con vigas multilaminadas, que por falta de material en plaza, no podian recepcionarse. En obra se encuentran los muebles de camerinos, Centro de Documentación y Archivo, Cafetería. Tambien mamparas correspondiente a exposiciones, las cuales deben ajustarse según indicaciones de la Dirección Técnica y mamparas divisorias de escritorios.

Es nuestro informe.

Arq. Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040602

www.tomblycardima.com contacto@tomblycardima.com +595 21 621921
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 343, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

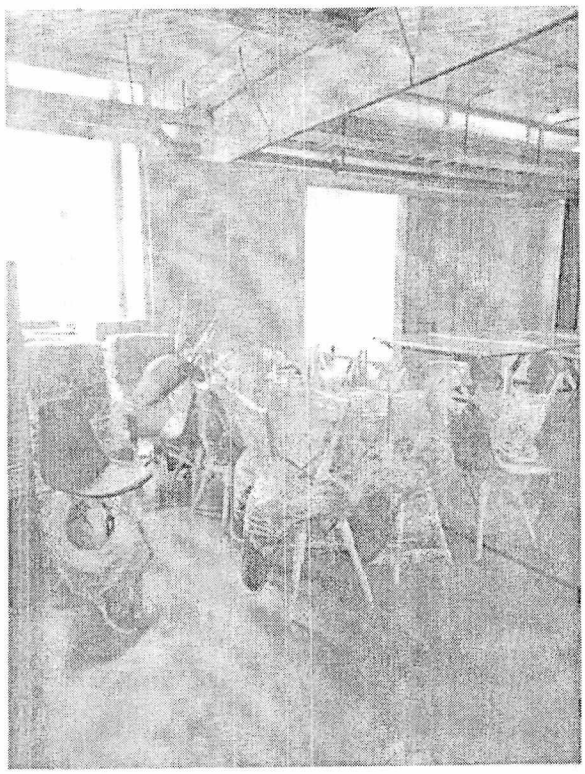

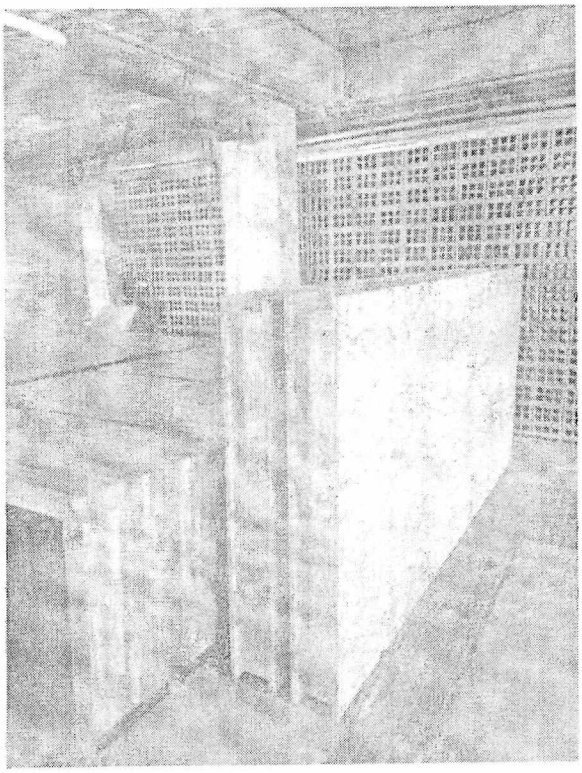

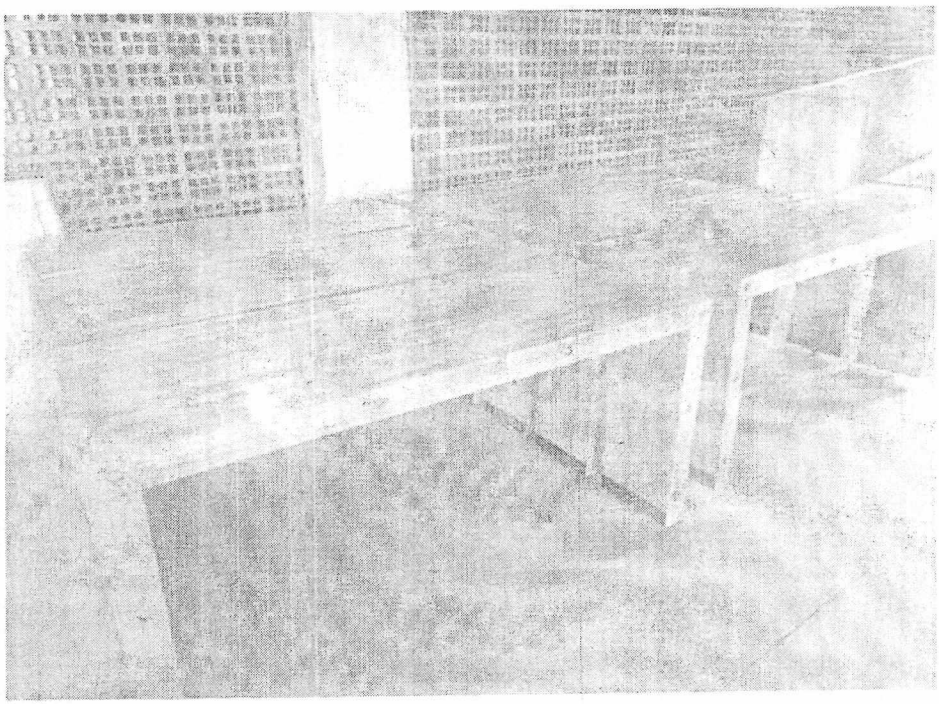

Recepción de muebles de Camerinos, Oficinas, CDA, Cafeteria realizados con vigas multilaminadas según EE.TT.

www.tomboly-carbono.com info.contacto@tomboly-carbono.com +595 21 621027
Direc.: R.I.1, 2 de mayo 843, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0640082

5. **VIR:** Licitación Publica Nacional N° 03/2019 "Acondicionamiento Acústico y electromecánico del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 371.423.

Sin notificación

6. **ASTELEV ASCENSORES:** Licitación Publica Nacional N° 09/2019 "Acondicionamiento Acústico y electromecánico del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la baja electronica, ID N° 371.423.

Sin notificación

Es nuestro informe.

Arq. Francisco Tomboly
Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040092

www.tombolyarcasimo.com contacto@tombolyarcasimo.com +595 21 621071
Direc: R.I.I, 3 de mayo 348, c/ Campos Cervera - Asunción - Paraguay

Francisco Antonio Tomboly Gianotti

Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p.

Cel.: (0981)402848
Campos Cervera N° 5815 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15174983
Fecha Inicio Vigencia 18/octubre/2021
Fecha Fin Vigencia 31/octubre/2022
R.U.C. 1165913 - 0

FACTURA

Nº 001-001 0000626

Fecha: 04 / 02 / 2022

Cond. de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

Nombre o Razón Social: Secretaría Nacional de Cultura

R.U.C.: 80050610-3

Nota de Remisión:

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Dirección de obra para la				
	Construcción del Sitio de la				
	memoria y Centro Cultural 1A				
	Yeruá Bolaños.	5.000.000	—	—	5.000.000
Sub total			—	—	5.000.000
Total a Pagar Cinco millones					5.000.000

Liquidación del IVA (5%) — (10%) 454.545 TOTAL IVA 454.545

Imp. San Alejo S.A. - Hab. SET N°. 1676 - Cecilio Baez 1059 e/ Angel Torres
Tel: 507 387 - RUC: 80054908 - 2 / E-mail: sanalejosa@ymail.com/ del 601 al 650

Original (Blanco): Cliente / Duplicado (Verde): Arch. Tributario
Triplicado (Amarillo) Contabilidad: (no válido para crédito fiscal)

Lote 4163377876 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270128751016

FECHA 04/02/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	1165913	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	TOMBOLY GIANOTTI FRANCISCO ANTONIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/03/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8F6E0880

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427111659138F6E0880

Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692
