Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N ° 5495 Padre Oudo Coronel

LUGAR: Centro Urbano - Km 16,5 Acaray

LOC.: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03

						CERTIFICADOS ACTUAL			CERTIFICADO ANTERIOR 02			CERTIFICADO ANTERIOR 01			CERTIFICADOS ACUMULADOS		
Ítem	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares																
1	Cartel de obra	m2	3,60	650.000	2.340.000	0,00		0	0,00	0	0	3,60	100	2.340.000	3,60	100	2.340.000
2	Replanteo y marcación	m2	85,50	7.453	637.232	0,00		0	0,00	0	0	85,50	100	637.232	85,50	100	637.232
	Estructura de Hº Aº																
3	Columnas de HºAº	m3	1,15	2.423.667	2.787.217	0,00		0	0,35	30	836.165	0,81	70	1.951.052	1,15	100	2.787.217
4	Encadenado de HºAº (15x30) cm	m3	1,10	2.423.667	2.666.034	0,00		0	0,33	30	799.810	0,77	70	1.866.224	1,10	100	2.666.034
5	Losa de HºAº sobre puerta	gl	1,00	630.000	630.000	0,00		0	1,00	100	630.000	0,00	0	0	1,00	100	630.000
	Muros de Elevación																
6	Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	m2	90,05	110.000	9.905.500	0,00		0	45,03	50	4.952.750	45,03	50	4.952.750	90,05	100	9.905.500
7	En varillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm	ml	8,00	33.700	269.600	0,00		0	8,00	100	269.600	0,00	0	0	8,00	100	269.600
	Techo																
8	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 26, pendiente 15 %, membrana aislante de 5 mm	m2	105,10	319.000	33.526.900	0,00		0	94,59	90	30.174.210	10,51	10	3.352.690	105,10	100	33.526.900
	Cielo Raso																
9	Cielo Raso tipo PVC de 5 mm de espesor, incluye estructura metálica	m2	60,74	114.167	6.934.504	0,00		0	60,74	100	6.934.504	0,00	0	0	60,74	100	6.934.504
	Revoques																
10	Paredes interior y exterior a una capa	m2	173,76	47.000	8.166.720	0,00		0	86,88	50	4.083.360	86,88	50	4.083.360	173,76	100	8.166.720
	Piso																
11	Carpeta de nivelación	m2	81,15	48.033	3.897.878	0,00		0	24,35	30	1.169.363	56,81	70	2.728.515	81,15	100	3.897.878
12	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	81,15	112.833	9.156.398	48,69	60	5.493.839	32,46	40	3.662.559	0,00	0	0	81,15	100	9.156.398
13	Zocalo cerámico	ml	40,55	33.300	1.350.315	40,55	100	1.350.315	0,00	0	0	0,00	0	0	40,55	100	1.350.315
	Aberturas de madera																
14	Puerta Tablero de 1,00 x 2,10 mts con marco, contra marco y cerradura	un	1,00	1.887.000	1.887.000	0,50	50	943.500	0,50	50	943.500	0,00	0	0	1,00	100	1.887.000
	Carpintería Metálica																
15	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,20	m2	5,40	419.000	2.262.600	1,35	25	565.650	1,35	25	565.650	2,70	50	1.131.300	5,40	100	2.262.600
16	Baranda Metalica, Perfil Vertical 50x50 mm, Perfil Horizontal 10x10 mm Galeria	m2	11,70	377.833	4.420.646	5,85	50	2.210.323	5,85	50	2.210.323	0,00	0	0	11,70	100	4.420.646
17	Cabriada metálica	ml	8,40	112.333	943.597	0,00		0	4,20	50	471.799	4,20	50	471.799	8,40	100	943.597
	Pintura																
18	Paredes interiores e exterior al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	173,76	52.000	9.035.520	173,76	100	9.035.520	0,00	0	0	0,00	0	0	173,76	100	9.035.520
19	Pintura esmalte sintético (aberturas, baranda)	m2	17,10	42.200	721.620	17,10	100	721.620	0,00	0	0	0,00	0	0	17,10	100	721.620
20	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final	ml	17,60	41.200	725.120	0,00		0	17,60	100	725.120	0,00	0	0	17,60	100	725.120
	Vidrios																
21	Vidrio de 4 mm	m2	5,40	221.000	1.193.400	2,70	50	596.700	2,70	50	596.700	0,00	0	0	5,40	100	1.193.400
	Desagüe Pluvial																
22	Canaleta N.º 26	ml	17,60	85.400	1.503.040	0,00		0	17,60	100	1.503.040	0,00	0	0	17,60	100	1.503.040
23	Caño de bajada de PVC de 100 mm	ml	26,00	70.533	1.833.858	0,00		0	26,00	100	1.833.858	0,00	0	0	26,00	100	1.833.858
	Instalación Eléctrica																
24	Instalación eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un	1,00	2.950.000	2.950.000	0,50	50	1.475.000	0,00	0	0	0,50	50	1.475.000	1,00	100	2.950.000
25	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	1,00	2.916.667	2.916.667	1,00	100	2.916.667	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	100	2.916.667
26	Limpieza Final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	1,00	100	1.450.000	0,00	0	0	0,00	0	0	1,00	100	1.450.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 37/2023				₲ 114.111.365	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 26.759.134	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 62.362.311	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 24.989.920	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 114.111.365

Monto de Certificado	26.759.134
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	1.331.957
Total a Pagar por Certificado	25.421.177

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO - CONTRATO N° 37 /2.023 ID 435.976

CONTRATISTA: SR. CARLOS GABRIEL BAREIRO – CONSTRUCONSULT S.A -RUC: 80097087-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Quince días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCION DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO - CONTRATO N° 37 /2.023 ID 435976.": LOTE N° 05 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 5495 PADRE GUIDO CORONEL KM16,5 ACARAY"** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. CARLOS GABRIEL BAREIRO – CONSTRUCONSULT S.A -RUC: 80097087-0.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

CONSTRUCONSULT S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS N.C.P.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA

(0973) 105.258 - (0972) 767.863 construconsults.a@outlook.com

Coronel Alfredo Ramos, casi 2 de mayo, a 100 mtrs. de la Heladeria Amandau - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16906999
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2024
R.U.C.: 80097087 - 0

FACTURA

N°001-001- 0000334

FECHA DE EMISIÓN 16 DE FEBRERO DE 20 24 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

DIRECCIÓN: R.U.C./C.I.: 80010478-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRAS N°03 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN ID 435976				
	LOTE N°04 CONSTRUCCION DE 01 AULA ESC.				
	BAS. N° 2968 SAN JUAN BAUTISTA DE LA				
	SALLE Km 14 ACARAY				26.886.332
	CERTIFICADO DE OBRAS N°03 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN ID 435976				
	LOTE N°05 CONSTRUCCION DE 01 AULA EN				
	LA ESC BAS. N° 5495 PADRE GUIDO CORONEL				
	Km 16,5 ACARAY				25.421.177
		SUB - TOTAL			

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (X) US$ ( ) CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE. — " — TOTALES 52.307.509#

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): — (10%): 4.755.228 = TOTAL IVA: 4755.228

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazu - Alto Parana
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitacion N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 326 al 375 - Diciembre/2023

ORIGINAL. Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO. Talón (No Valida como credito fiscal)

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800970870 CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

Teléfono/s : 0985282109 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** construconsults.a@outlook.com

Dirección : AVENIDA, CORONEL ALFREDO RAMOS, CASI 2 DE MAYO, A 100 METROS DE LA HELADERIA AMANDAU - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 019377

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 01/11/2024

Otorgado en Asunción, el 01/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800970870

01112022 1808 800970870 800970870

019377

Lote 5669820269 , Cons.: 10

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270170804645

FECHA 15/02/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80097087	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/03/2024 NÚMERO DE CONTROL : 86C108C2

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180097086786C108C2

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

RUC

80097087-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435976 / CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Monto del contrato

238.157.327

Año: 2024 **Periodo:** Enero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	CARLOS GABRIEL	BAREIRO ROJAS	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 6678965-1143

Fecha Impresión: 20/02/2024

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Mas usados: Búsqueda de Prove... | Búsqueda de Llamados | Búsqueda de Adjud... | Búsqueda de Pacs

Freddy Emanuel Mongelos Villalba [6678965-1143] - Convocante - Código SICP 1143

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 435976

Llamado: CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024
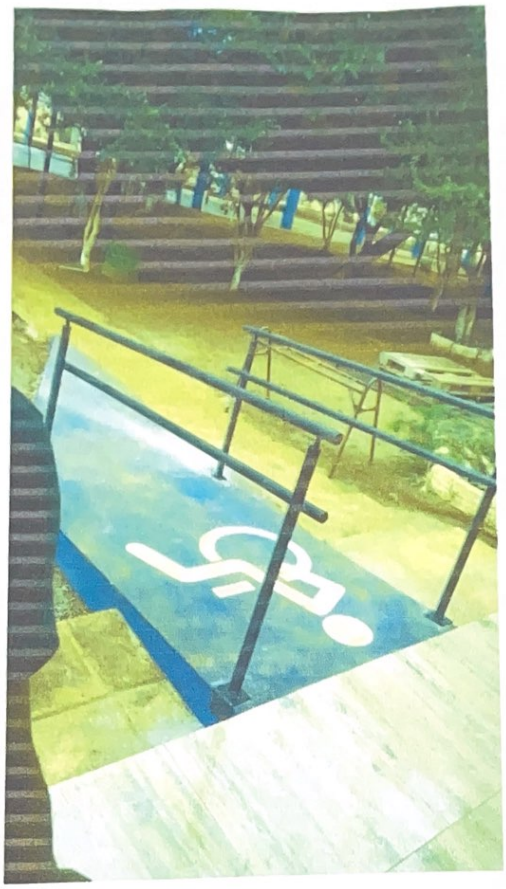
Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
CARLOS GABRIEL	BAREIRO ROJAS	3450704	Activo
