GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 1

Mes: Diciembre 2023 - Enero 2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados								
				Hasta Certificado Anterior			Certificado Presente			Total Certificado a la Fecha		
		%	(1)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2)	% Avance de Obra	% Avance de Obra según Contrato	(3)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario											
A.I	LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877	100%	190.171.068	0,00%	0,00%	0	37,50%	25,84%	71.314.150	37,50%	25,84%	71.314.150
A	Total por Contrato	100%	190.171.068	0,00%	0,00%	0	37,50%	25,84%	71.314.150	37,50%	25,84%	71.314.150

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	38.034.214	0	14.262.830	14.262.830
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	-	0
B	Total Deducciones		38.034.214	0	14.262.830	14.262.830
C.I	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				57.051.320	
C.II	Multas				0	
C	Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				57.051.320	

Certificado Básico Nº 1	
Mes:	Diciembre 2023 - Enero 2024
Contrato N°:	79/23
Monto Básico:	190.171.068
Contratista: Los Andes Ingenieria SRL	
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 días
Fecha de Terminación:	19/3/2024

SON GUARANIES: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingenieria SRL
Contratista

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

0000003

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877

CONTRATISTA: Los Andes Ingeniería S.R.L	
MONTO DE LA OFERTA: 190.171.068 Gs.	

FECHA:	25/1/2024
CONTRATO N°:	79/23
PLAZO:	90 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877				Los Andes Ingenieria SRL		PLAZO DE EJECUCIÓN					TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
1	Preparacion de obra - Extraer árbol	Unidad	3	472.973	1.418.919	1.418.919					0,75%
2	Construcción de empedrado -Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2765	33.873	93.658.845		46.829.423	46.829.423			49,25%
3	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metro lineal	790	82.946	65.527.340	32.763.670	32.763.670				34,46%
4	Colocacion de hormigon armado - PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	13,5	1.876.316	25.330.266	12.665.133	12.665.133				13,32%
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros cúbicos	2,21	1.039.731	2.297.806	2.297.806					1,21%
6	Servicio de señalización de caminos - Señalización de obra	Metros cuadrados	2	147.741	295.482			295.482			0,16%
7	Limpieza de obra - Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2765	594	1.642.410			1.642.410			0,86%
Total					190.171.068						100%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						49.145.528	92.258.226	48.767.315	0	0	190.171.068
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						25,84%	48,51%	25,64%	0,00%	0,00%	100%

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA — Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingenieria SRL
Contratista

Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861-0

0000004

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877

CONTRATISTA: Los Andes Ingenieria SRL	
MONTO DE LA OFERTA: 190.171.068 Gs.	

FECHA:	25/1/2024
CONTRATO N°:	79/23
PLAZO:	90 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 1						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 1					
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877				Los Andes Ingenieria SRL			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Preparacion de obra - Extraer árbol	Unidad	3	472.973	1.418.919	0,75%	0%	100%	100%	0,00%	0,75%	0,75%	0,00	**3,00**	3,00	0	1.418.919	1.418.919
2	Construcción de empedrado -Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2765	33.873	93.658.845	49,25%	0%	100%	100%	0,00%	49,25%	49,25%	0,00	**140,00**	140,00	0	4.742.220	4.742.220
3	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigòn pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metro lineal	790	82.946	65.527.340	34,46%	0%	100%	100%	0,00%	34,46%	34,46%	0,00	**610,00**	610,00	0	50.597.060	50.597.060
4	Colocacion de hormigon armado - PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	13,5	1.876.316	25.330.266	13,32%	0%	100%	100%	0,00%	13,32%	13,32%	0,00	**7,60**	7,60	0	14.260.469	14.260.469
5	Colocacion de hormigon armado - Cordòn escondido de hormigòn pre elaborado Fck 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	Metros cúbicos	2,21	1.039.731	2.297.806	1,21%	0%	100%	100%	0,00%	1,21%	1,21%	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
6	Servicio de señalizacion de caminos - Señalización de obra	Metros cuadrados	2	147.741	295.482	0,16%	0%	100%	100%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00	**2,00**	2,00	0	295.482	295.482
7	Limpieza de obra - Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2765	594	1.642.410	0,86%	0%	100%	100%	0,00%	0,86%	0,86%	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
Total					**190.171.068**	100%	0%	37%	37%	0,00%	**100%**	100%				0	**71.314.150**	71.314.150

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Aarón Melid
Los Andes Ingeniería SRL
Contratista

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

0000005

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES CONTINUACIÓN LOS CARREROS CALLE ACCESO A MUSEO PROFE ALBERTO DELVALLE - BARRIO TRES BOCAS DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 436.877

Contrato N°	79/23		
Monto del Contrato:	190.171.068	Term. Prevista:	19/3/2024
Plazo Contractual:	90 dias	Ampliaciones:	
Inicio de Obra:	18-dic-23	Mes:	Diciembre 2023 - Enero 2024

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO								
Contrato N° 79/23								
MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	49.145.528	49.145.528	71.314.150	71.314.150	25,84%	25,84%	37,50%	37,50%
Enero	92.258.226	141.403.753	0	71.314.150	48,51%	74,36%	0,00%	37,50%
Febrero	48.767.315	190.171.068	0	71.314.150	25,64%	100,00%	0,00%	37,50%
Marzo	0	190.171.068	0	71.314.150	0,00%	100,00%	0,00%	37,50%

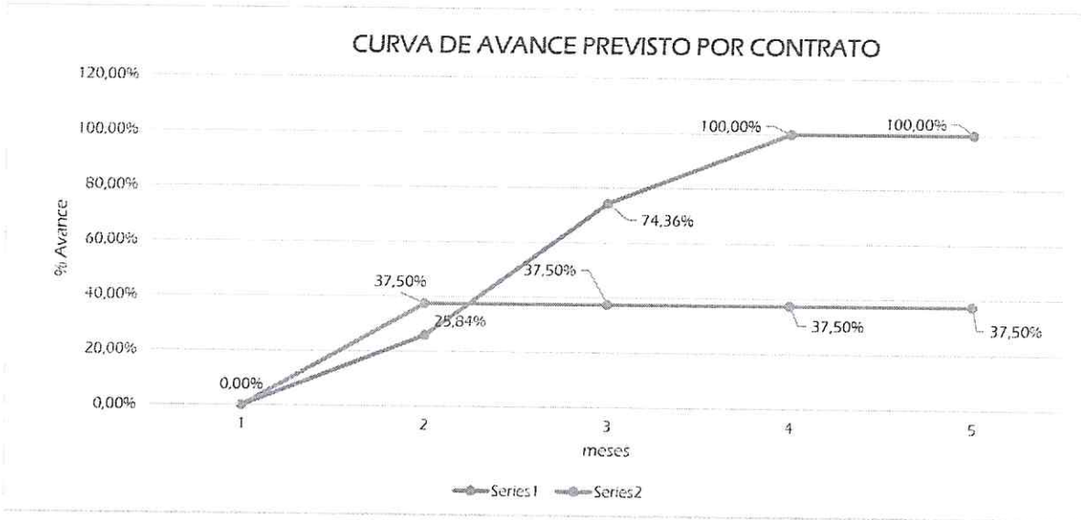

Ing. Aaron Mellid
Representante Legal
Los Andes Ingeniería S.R.L.

Ing. Fernando Operstoni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

0000006
