Eusebio Lillo n° 2566
RUC: 80096837-9
Tel: 021 28 20 28
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Asunción, 25 de octubre de 2021.-

INFORME TECNICO

Señor(es)	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA	R.U.C.	80050610-3

INFORME TECNICO POR "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EDILICIAS

BIBLIOTECA NACIONAL DE ASUNCIÓN - HEMEROTECA

ITEM	DESCRIPCION
1	**Demolición de piso**

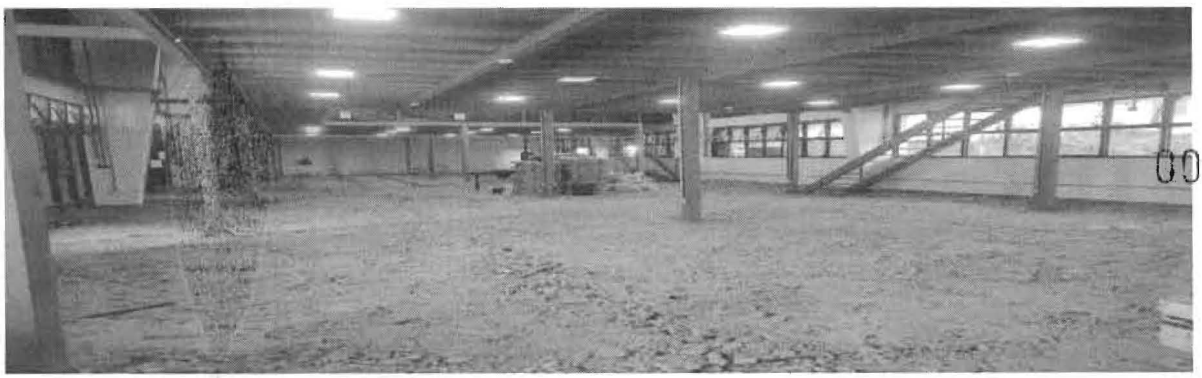

000026

Tras una visita a la BIBLIOTECA NACIONAL DEL PARAGUAY y habiendo realizado una inspección ocular y técnica de los pisos en existencia, la medición en obra del área de la superficie verificada es de 369 m2 se realiza LA DEMOLICION DE PISOS EN DICHA AREA, teniendo en cuenta la estructura metálica existenteen el edificio se decide realizar de manera manual sin utilizar maquinaria pesada que con la vibración pudiese afectar la estructura del edificio.

9,27	Trabajos en carpintería en general	

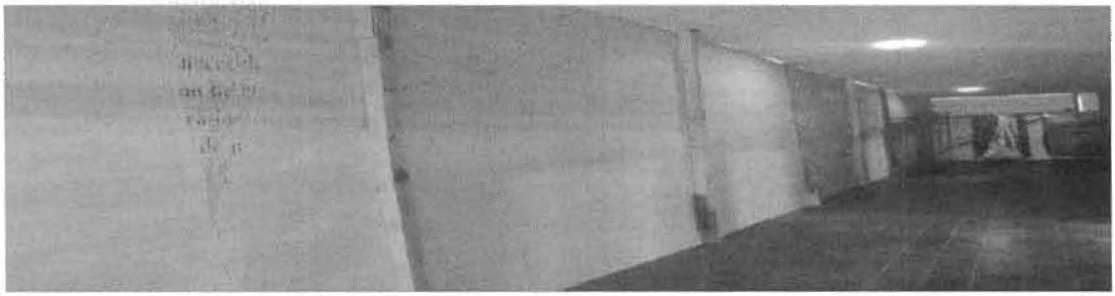

Atendiendo a la necesidad de salvaguardar los documentos de la hemeroteca, en conjunto con la fiscalización se tomo la decisión de construir un obrador que sirva de depósito de los acervos de la hemeroteca, mientras dure la obra, dicho obrador se edificó teniendo en cuenta las especificaciones proveidas por la fiscalización.
Se realiza vallado de madera terciada con impermeabilización con lona plástica en toda su superficie de manera a evitar filtración que comprometa documentos ahí guardado.

Arquitecto Dardo González
Dpto. Técnico
DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.

arquitectura d&d construcción

Fecha: 04 de Octubre de 2021

Señores:
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Presente
Asunción - Paraguay

Presente

ASUNTO: **INFORME TECNICO**

Este Informe Técnico corresponde a Trabajo realizado en el edificio de **SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA** en cumplimiento al **CONTRATO NRO 21/2021 LCO N° 04/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EDILICIAS"**

En cumplimiento al ítem 1.5 y 1.6 se realizan demolición de piso un total de 369 m2 y demolición revestido de piso un 369 m2.
Dicho avance de obra corresponde al 9.5 % del total previsto.

Se adjunta informe fotográfico

000028

arquitectura & construcción s.r.l. d&d

arquitectura d&d construcción

Presupuesto OS 002-2021
Empresa: DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.
Fecha: 1/10/2021
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura con ID: 398868

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	DEMOLICIÓN	Unidad	-	-	-
6	De piso	Metros cuadrados	369,00	32.170	11.870.730
7	De revestido	Metros cuadrados	369,00	36.560	13.490.640
				TOTAL:	25.361.370

Arq. Darío González Ramos.
D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC 80062328-2

000029

arquitectura & construcción s.r.l. d&d

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº 002-2021-D&D, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 21/2021, DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EDILICIAS", ID Nº: 398.868-.

ASUNCION, OCTUBRE DEL 2021.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

ROQUE SANUDO
CID: 458512

000030
