Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE VAQUERÍA.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°021/2022 ID Nº 417.031

DISTRITO BENEFICIARIO:

VAQUERÍA – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE VAQUERÍA - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 21/2022 ID Nº 417.031.-

FECHA:

01 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 05/09/2022 con un plazo de ejecución de 180 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **BOGADO CONSTRUCCIONES**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Arq. Víctor Menchieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 14 DE MAYO E/ DEFENSORES DEL CHACO**			
1.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	0%	0%	0%
1.2	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
1.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	0%	0%	0%
1.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
1.6	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
1.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
1.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
2	**EMPEDRADO AVDA. SAN BLAS E/ 14 DE MAYO**			
2.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	0%	0%	0%
2.2	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
2.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	0%	0%	0%
2.5	Cordón Cuneta	0%	0%	0%
2.6	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
2.7	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
2.8	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
2.9	Limpieza Final	0%	0%	0%
3	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ANTEQUERA E/ DEFENSORES DEL CHACO**			
3.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	0%	0%	0%
3.2	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
3.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	0%	0%	0%
3.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
3.6	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
3.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%

Arq. Víctor Menelota
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

3.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
4	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ANTEQUERA / AVDA. SAN BLAS**			
4.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	0%	0%	0%
4.2	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
4.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
4.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	0%	0%	0%
4.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
4.6	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
4.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
4.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
5	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ 3era. PROYECTADA Y 4ta. PROYECTADA**			
5.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
5.2	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
5.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
5.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	100%	0%	100%
5.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
5.6	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
5.7	Colocación de triturada 6ta terminación	100%	0%	0%
5.8	Limpieza Final	100%	0%	0%
6	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE IND. NACIONAL E/ DEFENSORES DEL CHACO**			
6.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
6.2	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
6.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
6.4	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
6.6	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
6.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
6.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
7	**EMPEDRADO NANAWA E/ DEFENSORES DEL CHACO**			
7.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
7.2	Replanteo de Obra	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

7.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
7.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	100%	0%	100%
7.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
7.6	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
7.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
7.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
8	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COMPAÑÍA SANTA HELENA**			
8.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	0%	0%	0%
8.2	Replanteo de Obra	0%	0%	0%
8.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
8.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	0%	0%	0%
8.5	Cordón Cuneta	0%	0%	0%
8.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
8.6	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
8.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
8.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
9	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TUYUTI E/ DEFENSORES DEL CHACO**			
9.1	Cartel de Obra 1.80 x 2.00	100%	0%	100%
9.2	Replanteo de Obra	100%	0%	100%
9.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
9.4	Cordón de H° de 50cm x 30cm x 10cm	100%	0%	100%
9.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
9.6	Pavimento tipo empedrado	39%	0%	39%
9.7	Colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
9.8	Limpieza Final	0%	0%	0%
	Precio Total	**PORCENTAJE CERTIFICACION**		**32,57**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Menelista
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Meneses
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

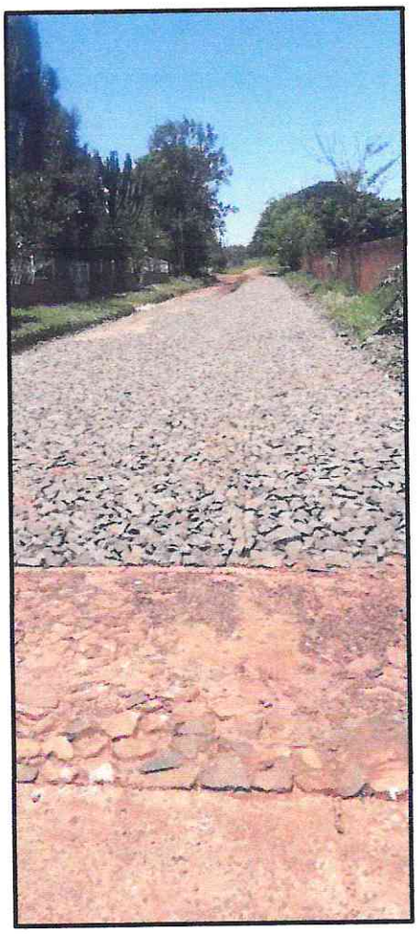

Arq. Víctor Menegheta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú
