# FISCALIZACIÓN DE OBRAS

## INFORME N°6 - CERTIFICADO N°6 - MAYO

MENOR CUANTIA NACIONAL Nº: 24/2024 "CONSTRUCCION DE TIENDA ANTENA EN EL CIRCUITO COMERCIAL– DISTRITO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL". ID N° 455.916

**OBRA:** CONSTRUCCION DE TIENDA ANTENA EN EL CIRCUITO COMERCIAL

**BENEFICIARIO:** DISTRITO DE ENCARNACIÓN

**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Natalia González

**AVANCE DE OBRA:** 59,18%

**FECHA DE MEDICIÓN:** 30/05/25

**FECHA DE INFORME:** 02/06/25

| UBICACIÓN | DISTRITO | MONTO DE LA OBRA | PLAZO CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|
| Circuito Comercial | Encarnación | 498.244.807 Gs. | 150 días |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** | **PRORROGA** |
| DJ INGENIERIA | 0983 578 600 | 71/2024 | 67 DIAS |
| **RESOLUCIÓN N°** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA** |
| 341/2025; 357/2025; 702/2025 | 28 – noviembre - 2024 | 27 – abril - 2025 | 03 – Julio - 2025 |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Según las observaciones realizadas el día 30/05 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 59,18%, es importante aclarar que en cuanto al plazo la obra ya se encuentra en periodos de prorrogas.

Se observó al equipo en la realización de los trabajos como colocación de babetas, avance en los baños, un poco del piso simil parquet, mochetas de ventanas, avances en los trabajos eléctricos con los registros, el tablero y las preparaciones de los circuitos, así como la pilastra para el futuro medidor de ANDE.

Se dieron indicaciones de los detalles de las ubicaciones en el sitio de obra y algunas correcciones de terminaciones para de esta manera lograr los estándares de calidad exigidos con todo lo establecido en las EE.TT. Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados:

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

**Fiscal de Obra**

Gobernación de Itapúa



Itapúa lugar de OPORTUNIDADES www.itapua.gov.py
**Teléf:** +59571204568
**Correos:** general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
**Gobernación de Itapúa** / **RUC:** 80009721-1
**Dirección:** Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

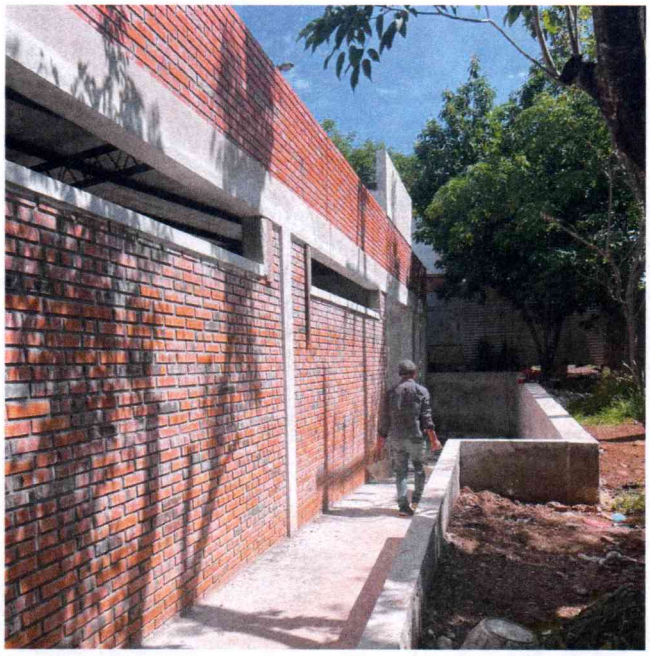

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

.....

**Fiscal de Obra**

Gobernación de Itapúa
