GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007	100%	180.615.506	0,00%	0	29,76%	53.749.418	29,76%	53.749.418
A	**Total por Contrato**	**100%**	**180.615.506**	**0,00%**	**0**	**29,76%**	**53.749.418**	**29,76%**	**53.749.418**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	36.123.101	0	10.749.884	10.749.884
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**36.123.101**	**0**	**10.749.884**	**10.749.884**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				42.999.535	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**42.999.535**	

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**59/2023**
Monto Básico:	**180.615.506**
Contratista:	Dionel Olmedo Núñez
Fecha de Inicio:	**22-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90**
Fecha de terminación prevista:	**21-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Cuarenta y dos millones, novecientos noventa y nueve mil, quinientos treinta y cinco.----------

Dionel Olmedo Núñez

Contratista - Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel:0985-910499

Secretario de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni

Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte

Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	**FECHA DE INICIO:**	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	180.615.506	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	21-mar-24
CONTRATO N°:	59/2023	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	4.299.008	0,024	0,00%	0,22%	0,22%		0,000	0,000	0,00	1	1,00	0	9.596	9.596
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.243.656	0,007	0,00%	100,00%	100,00%		0,007	0,007	0,00	1	1,00	0	1.243.656	1.243.656
3	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,028	0,00%	100,00%	100,00%		0,028	0,028	0,00	1	1,00	0	5.000.000	5.000.000
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	2.439.743	0,014	0,00%	24,55%	24,55%		0,003	0,003	0,00	148,7	148,70	0	598.964	598.964
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	48.036.793	0,266	0,00%	43,48%	43,48%		0,116	0,116	0,00	18,7	18,70	0	20.885.563	20.885.563
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.010.295	0,006	0,00%	50,21%	50,21%		0,003	0,003	0,00	0,47	0,47	0	507.306	507.306
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	111.454.120	0,617	0,00%	22,33%	22,33%		0,138	0,138	0,00	676,26535	676,27	0	24.887.917	24.887.917
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	1.719.152	0,010	0,00%	35,81%	35,81%		0,003	0,003	0,00	15,4	15,40	0	615.553	615.553
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	5.412.736	0,030	0,00%	0,02%	0,02%		0,000	0,000	0,00	0,5	0,50	0	863	863
Total					**180.615.503**	**100,00%**				**0,00%**	**29,76%**	**29,76%**				**0**	**53.749.418**	**53.749.418**

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel:0985-910499

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

3/(4)

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007			
CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	**FECHA DE INICIO:**	22-dic-23
DE LA OFERTA GS:	180.615.506	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	21-mar-24
CONTRATO N°:	59/2023	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	4.299.008	4.299.008	0	0		2,38%
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.243.656	1.243.656	0	0		0,69%
3	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0		2,77%
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	2.439.743	1.219.872	1.219.872	0		1,35%
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	48.036.793	0	16.012.264	16.012.265	16.012.264	26,60%
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.010.295	0	336.765	336.765	336.765	0,56%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	111.454.120	0	27.863.530	55.727.060	27.863.530	61,71%
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	1.719.152	0	573.051	573.050	573.051	0,95%
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	5.412.736	2.706.368	0	0	2.706.368	3,00%
Total					**180.615.503**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						14.468.904	46.005.482	72.649.140	47.491.978	**180.615.503**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						8,01%	25,47%	40,22%	26,29%	**100,00%**

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel:0985-910459

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Caggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Copia

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre - Enero

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

Contrato N°: 59/2023			
Monto del Contrato:	180.615.506	**Fecha de terminación prevista:**	21-mar-24
Plazo Contractual:	90	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	22-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	14.468.904	14.468.904	14.468.904	14.468.904	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
Enero	46.005.482	60.474.385	39.280.515	53.749.418	25,47%	33,48%	21,75%	29,76%
Febrero	72.649.140	133.123.525		53.749.418	40,22%	73,71%		29,76%
Marzo	47.491.978	180.615.503		53.749.418	26,29%	100,00%		29,76%

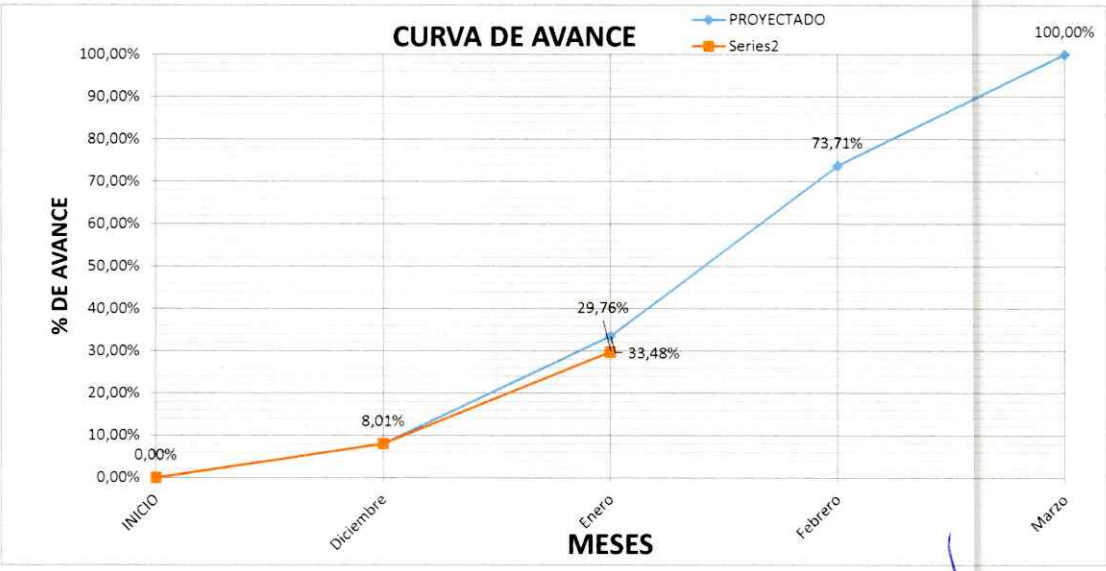

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel.0985-910499

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

5/cinco

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 01 – CERTIFICADO N° 01 DICIEMBRE-ENERO 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/2023: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE KM. 2 - COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – Contrato N° 59/2023 - I. D. N° 437.007

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Escondido
BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 2.515 "Gral. Pedro Duarte"
FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni
FECHA DE VISITA: 31/Enero/2024
AVANCE DE OBRA: 29,76%
FISCAL A CARGO: Ing. Fernando Oreggioni

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Colonia 7 de Agosto – Km 2	Carlos A. López	180.615.506 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Dionel Olmedo Núñez	0985-910-459	59/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	22/12/2023	21/03/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 31/01/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos: replanteo y marcación, colchón de tierra, cordones, relleno y compactación y empedrado.

El avance hasta la fecha es de 29,76%, según su cronograma físico financiero correspondiente a los meses de diciembre y enero.

La ejecución se está dando de forma continua y rápida, cumpliendo los plazos establecidos y las exigencias de calidad de la obra.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

Ing. Fernando Oreggioni
Fiscal de Obras

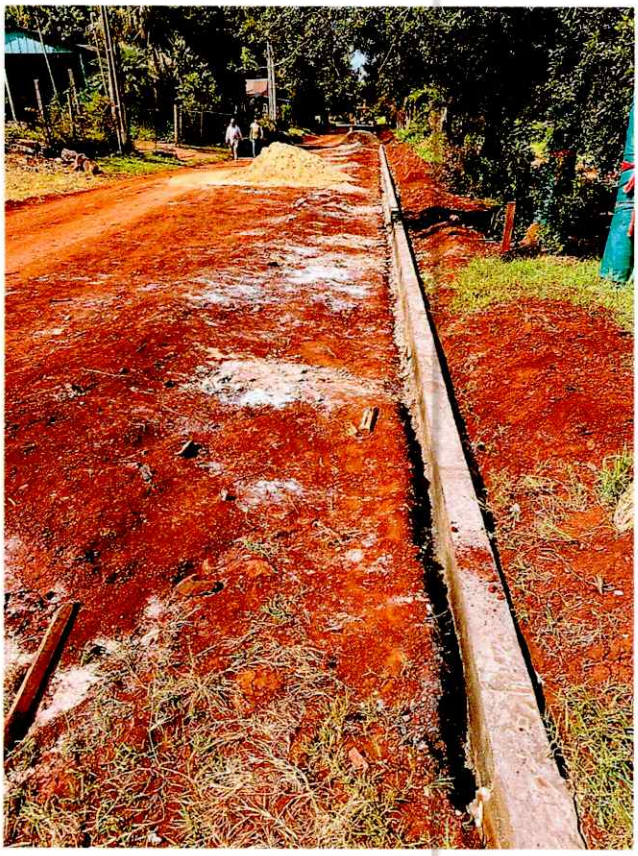

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Cropgioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

8/oche)
