GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 3

Mes: Abril - Mayo - Junio - julio

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007	100%	180.615.506	51,05%	92.207.971	43,87%	79.235.997	94,92%	171.443.968
A	**Total por Contrato**	**100%**	**180.615.506**	**51,05%**	**92.207.971**	**43,87%**	**79.235.997**	**94,92%**	**171.443.968**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	36.123.101	18.441.594	15.847.199	34.288.794
B.II	Devolución de anticipo no ejecutado				1.834.308	1.834.308
B	**Total Deducciones**		**36.123.101**	**18.441.594**	**17.681.507**	**36.123.101**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				61.554.490	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**61.554.490**	

Certificado Básico Nº	**3**
Mes:	**Abril - Mayo - Junio - julio**
Contrato N°:	**59/2023**
Monto Básico:	**180.615.506**
Contratista:	**Dionel Olmedo Núñez**
Fecha de Inicio:	**22-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90**
Fecha de terminación prevista:	**21-mar-24**
Prórroga:	**53**
Fecha de terminación con prórroga:	**13-may-24**

SON GUARANIES: Sesenta y un millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuartrocientos noventa.----------

Dionel Olmedo Núñez
Contratista - Representante Legal
ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C. 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel.0985-910459

Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Fiscalización Departamental de Obras

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando J. Ocampos
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN N° 3

CERTIFICADO BASICO Nº 3

CONTRATO Nº 59/2023

REFERENCIA: L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

CONTRATISTA: DIONEL OLMEDO NÚÑEZ

En el Distrito de CARLOS ANTONIO LÓPEZ, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 24 días del mes de julio del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras y el Sr. Dionel Olmedo Núñez en representación de la Empresa.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de abril, mayo, junio y julio de 2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Dionel Olmedo Núñez
Contratista

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C. 5211739-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel 0985 310159

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá
Ing. Carlos Javier Antunilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Abril - Mayo - Junio - julio

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	180.615.506	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	21-mar-24
CONTRATO N°:	59/2023	PRÓRROGA:	53
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	13-may-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	4.299.008	0,024	100,00%	-2,11%	97,89%	0,024	(0,001)	0,023	448	-9,45	438,55	4.299.008	-90.682	4.208.326
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m. con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.243.656	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	1,00	0	1,00	1.243.656	0	1.243.656
3	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,028	100,00%	0,00%	100,00%	0,028	-	0,028	1,00	0	1,00	5.000.000	0	5.000.000
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	2.439.743	0,014	70,00%	23,61%	93,61%	0,009	0,003	0,013	423,99	143,01	567,00	1.707.820	576.056	2.283.876
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	48.036.793	0,266	60,00%	37,88%	97,88%	0,160	0,101	0,260	25,81	16,29	42,10	28.822.076	18.198.361	47.020.438
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.010.295	0,006	60,00%	16,92%	76,92%	0,003	0,001	0,004	0,56	0,16	0,72	606.177	170.973	777.150
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	111.454.120	0,617	43,79%	49,82%	93,61%	0,270	0,307	0,578	1.326,27	1.508,73	2.835,00	48.809.217	55.524.453	104.333.670
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	1.719.152	0,010	100,00%	-2,12%	97,88%	0,010	(0,000)	0,009	43,01	-0,91	42,10	1.719.153	-36.374	1.682.779
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	5.412.736	0,030	0,02%	90,40%	90,42%	0,000	0,027	0,027	0,50	2.835,00	2.835,50	863	4.893.210	4.894.073
Total					180.615.506	100,00%				51,05%	43,87%	94,92%				92.207.971	79.235.997	171.443.968

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C. 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa-Cel 0985-910459

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Abril - Mayo - Junio - julio

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

Contrato N°: 59/2023			
Monto del Contrato:	180.615.506	**Fecha de terminación prevista:**	21-mar-24
Plazo Contractual:	90	**Prórroga:**	53
Inicio de Obra:	22-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	13-may-24

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	14.468.904	14.468.904	14.468.904	14.468.904	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
Enero	46.005.482	60.474.385	39.280.515	53.749.418	25,47%	33,48%	21,75%	29,76%
Febrero	72.649.140	133.123.525	15.497.635	69.247.053	40,22%	73,71%	10,90%	40,66%
Marzo	47.491.978	180.615.506	22.960.918	92.207.971	26,29%	100,00%	10,39%	51,05%
Abril			20.000.000	112.207.971			11,07%	62,12%
Mayo			20.000.000	132.207.971			11,07%	73,20%
Junio			20.000.000	152.207.971			11,07%	84,27%
Julio			19.235.997	171.443.968			10,65%	94,92%

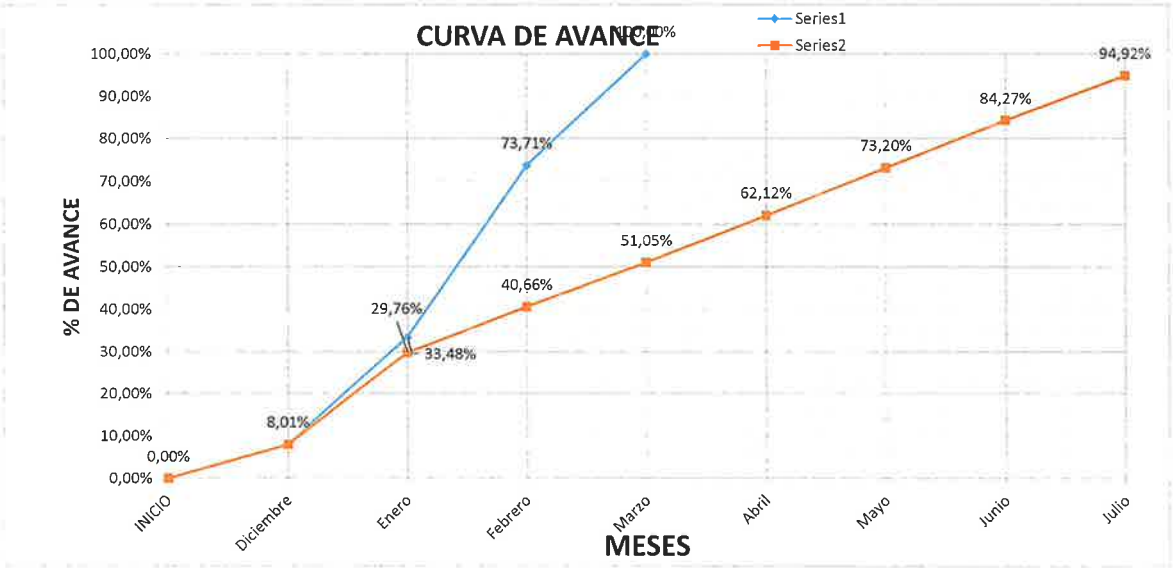

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

FIOSCO CONSTRUCCIONES R.U.C: 5211739-8
Carlos A. Lopez-Itapúa-Cel 0985 910459

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: ril - Mayo - Junio - julio

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007			
CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	FECHA DE INICIO:	22-dic-23
DE LA OFERTA GS:	180.615.506	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	21-mar-24
CONTRATO N°:	59/2023	PRÓRROGA:	53
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	13-may-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	4.299.008	4.299.008	0	0		2,38%
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.243.656	1.243.656	0	0		0,69%
3	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0		2,77%
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	2.439.743	1.219.872	1.219.872	0		1,35%
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	48.036.793	0	16.012.264	16.012.265	16.012.264	26,60%
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.010.295	0	336.765	336.765	336.765	0,56%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	111.454.120	0	27.863.530	55.727.060	27.863.530	61,71%
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	1.719.152	0	573.051	573.050	573.051	0,95%
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	5.412.736	2.706.368	0	0	2706368	3,00%
Total					**180.615.506**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						14.468.904	46.005.482	72.649.140	47.491.978	**180.615.506**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						8,01%	25,47%	40,22%	26,29%	**100,00%**

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C: 5211789-8 Carlos A. López-Itapúa-Cel.0985 910459

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO NRO 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº2515 GENERAL PEDRO DUARTE - KM2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ - PLURIANUAL- ID:437.007

EMPRESA CONTRATISTA: SR. DIOSNEL OLMEDO NUÑEZ	Nº DE TELÉFONO: 0985- 910459	Nº CONTRATO: 59/2023	FECHA DE INICIO: 22-12-2023
MODALIDAD / LOTE: CD Nº 34/2023	PLAZO CONTRACTUAL: 90 DÍAS PRORROGA: 53 DÍAS	MONTO DEL CONTRATO: 180.615.506 Gs.	TERMINACIÓN PREVISTA CON PRORROGA: 13-05-2024.

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: JULIO del 2024

Avance de Obra: 94,92%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra está concluida en su totalidad y se encuentra funcional, se ha procedido a la verificación y medición final de la obra donde las cantidades de algunos ítems no coinciden con la planilla contractual. Estos son:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantida Contractual	Cantida Ejecutada	Catidad sobrante
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	438,55	9,45
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	567,00	38,70
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	42,10	0,91
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	0,72	0,22
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	2.835,00	193,48
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	42,10	0,91
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	2.835,50	300,50

Por lo tanto, la presente certificación contempla la cantidad real ejecutada en obra.

Se anexa registro fotográfico de avances.

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

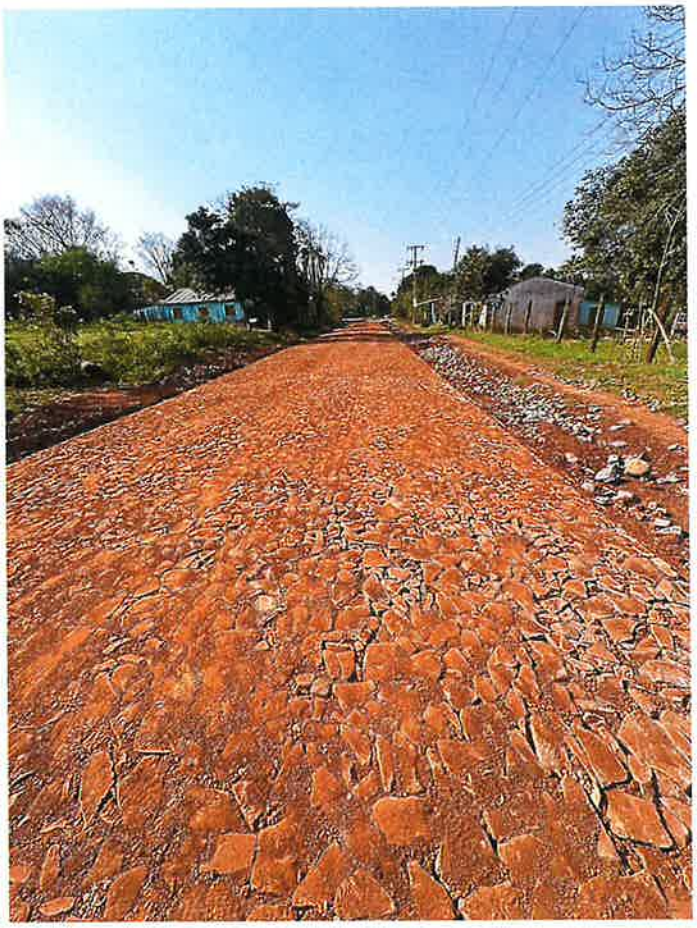

Ing. Carlos Javier Arrúa
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
