Informe Técnico de Fiscalización N°35/2023

A: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Fiscal de obras-

Ref.: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE". Adjudicado según contrato N°35/2023.**

Fecha: 23/08/2023.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras correspondiente al **CONTRATO DE OBRA N° 35/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN A CONTRATACION DIRECTA N°24/2023 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 429720,** adjudicada a la firma **N.A. CONSTRUCCIONES**, a fin de informar los avances de los trabajos realizados hasta la fecha en el marco del contrato detallado anteriormente, y el estado de los mismos en relación al cronograma de ejecución presentado por la empresa contratista. Se aprovecha la ocasión para informar un total del 100% de avance ejecución contractual.

Dicho esto, se cumple en informar que los trabajos ya ejecutados por parte de la empresa contratista los cuales forman parte de los rubros contractuales. Se han cumplido en cabalidad todo lo plasmado contractualmente en cuanto a la construcción de empedrado, enripiado y colocación de cordones de hormigón.

En cuanto a los cordones de hormigón que son para acceso a los domicilios ha sido deducido para los pagos visto que el proyecto no contempla en costos un monto plasmado.

EL avance ha sido en tiempo y forma y con normalidad.

Para el efecto se presenta los siguientes documentos respaltarios.

- **Acta de Medición.**
- **Tomas Fotográficas.**
- **Planos de medición.**

Observaciones.: *Esta Fiscalización cumple en informar que se realiza el certificado con un avance de Obra ejecutada en campo del 100% correspondiente y se procede a abonar por lo ejecutado descontando cualquier tipo de inconsistencia y se procede remitir los documentos pertinentes..*

Es mi informe

PROCESADO

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PLANO DE MEDICION

Tramo Empedrado Existente

Addenda Ampliatoria

Empedrado

Longitud	=	42,25m
Ancho	=	8,00m
Superficie	=	338,00m2
Cordones	=	30,00ml

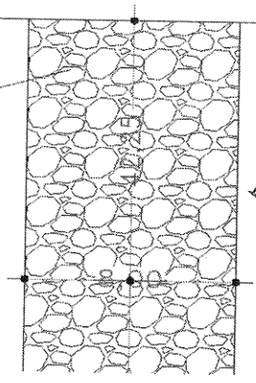

PROCESADO

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

OBRAS

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Veintitrés días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Sr. Nicolas Aguilera en representación de la firma N.A. CONSTRUCCIONES, a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **Obra: "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.".** Adjudicataria según **Contrato N° 35/2023**.Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 23 de Agosto del 2023 correspondiente al Certificado de Obra N°2 Adenda Ampliatoria en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

Adenda Ampliatoria
Construcción de Empedrado Nuevo (medición)

Longitud = 42,25m

Ancho = 8,00m

Superficie = 338,00m2

Cordones = 30,00ml

PROCESADO

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

NA Construcciones de Nicolás Aguilera
RUC. 1527085-8
Representante Legal Gral. Britez

Contratista.

Fiscalización de Obras.

Ing. Benigno Ramírez
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

N.A. CONSTRUCCIONES

Construcciones de Empedrados y Muro

de NICOLÁS AGUILERA

Calle Rca. de Colombia Nº 179 c/ San Rafael
Cel.: (0981) 509 204
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 15862510
Fecha de Autorización: 01/Septiembre/2022
Válido hasta el 30 de Septiembre de 2023
RUC: 1527085 - 8

FACTURA

Nº 001-001-0000983

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/23

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 80008887 -5

NOTA DE REMISIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO Nº 2 - ADENDA				
	AMPLIATORIA DEL CONTRATO				
	Nº 35/23 - ID Nº 429.720				29.000.110
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR (en letras)	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO				29.000.110

PROCESADO

TOTAL

DIEZ.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 2.636.374 TOTAL IVA: 2.636.374

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

Original: (Blanco) Comprador
Primera Copia: (Amarillo) Archivo Tributario - No válido como crédito fiscal
Segunda Copia: (Celeste) Contabilidad - No válido como crédito fiscal

2 tal. 50x3 - 901 al 1000 - 09/2022
