GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(1)	% Avance de Obra	(1)	% Avance de Obra	1)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001	100%	164,781,959	0.00%	0	21.33%	35,152,549	21.33%	35,152,549
A	**Total por Contrato**	**100%**	**164,781,959**	**0.00%**	**0**	**21.33%**	**35,152,549**	**21.33%**	**35,152,549**

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**77/2023**
Monto Básico:	**164,781,959**
Contratista:	**Omar Daniel Valdez Acosta**
Fecha de Inicio:	**18-Dec-23**
Plazo de Ejecución:	**210 dias**
Fecha de terminación prevista:	**17-Mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20.00%*	32,956,392	0	7,030,510	7,030,510
B.II	Para Fondo de Reparo	*5.00%*	8,239,098	0	1,757,627	1,757,627
B	**Total Deducciones**		**41,195,490**	**0**	**8,788,137**	**8,788,137**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				26,364,412	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**26,364,412**	

SON GUARANIES: Veintiséis millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos doce.-

Omar DanielValdez Acosta
Contratista-Representante Legal

G.L.V CONSTRUCCIONES
RUC: 3927192 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

RAMALDA CONSULTORA 0984-73 28 98

10

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero Fecha 1/31/2024

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001			
CONTRATISTA:	Omar DanielValdez Acosta	**FECHA DE INICIO:**	18-Dec-23
MONTO DE LA OFERTA:	164,781,959	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	17-Mar-24
CONTRATO N°:	77/2023	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210 días	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Desmonte de terreno - Desmonte y retiro de tierra para apertura de camino auxiliar	Milimetros cuadrados	420	13,357	5,609,940	0.034	0.00%	50.00%	50.00%		0.017	0.017	0.00	210.00	210.00	0	2,804,970	2,804,970
2	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metro lineal	405	8,061	3,264,705	0.020	0.00%	100.00%	100.00%		0.020	0.020	0.00	405.00	405.00	0	3,264,705	3,264,705
3	"Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-"	Unidad	1	994,096	994,096	0.006	0.00%	100.00%	100.00%		0.006	0.006	0.00	1.00	1.00	0	994,096	994,096
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	1	4,575,366	4,575,366	0.028	0.00%	100.00%	100.00%		0.028	0.028	0.00	1.00	1.00	0	4,575,366	4,575,366
5	"Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).	Metros cuadrados	2738	6,454	17,671,052	0.107	0.00%	14.61%	14.61%		0.016	0.016	0.00	400.00	400.00	0	2,581,600	2,581,600
6	"CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .-"	Metros cúbicos	38.88	983,360	38,233,037	0.232	0.00%	26.75%	26.75%		0.062	0.062	0.00	10.40	10.40	0	10,226,944	10,226,944
7	Colocacion de hormigon armado - "CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.-"	Metros cúbicos	0.84	971,320	815,909	0.005	0.00%	0.00%	0.00%				0.00	0.00	0.00	0	0	0
8	Construcción de empedrado - "Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-"	Metros cuadrados	2738	31,293	85,680,234	0.520	0.00%	12.49%	12.49%		0.065	0.065	0.00	342.09	342.09	0	10,704,868	10,704,868
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	Metros cuadrados	136	33,441	4,547,976	0.028	0.00%	0.00%	0.00%				0.00	0.00	0.00	0	0	0
10	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	2738	1,238	3,389,644	0.021	0.00%	0.00%	0.00%				0.00	0.00	0.00	0	0	0
Total					**164,781,959**	**100%**				**0.00%**	**21.33%**	**21.33%**				**0**	**35,152,548**	**35,152,548**

Omar DanielValdez Acosta
Contratista-Representante Legal

G.L.V CONSTRUCCIONES
RUC: 3927192 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Greggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001			
CONTRATISTA:	Omar DanielValdez Acosta	FECHA DE INICIO:	18-Dec-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	164,781,959	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	17-Mar-24
CONTRATO N°:	77/2023	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210 días	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001						PLAZO DE EJECUCIÓN			TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Desmonte de terreno - Desmonte y retiro de tierra para apertura de camino auxiliar	Milimetros cuadrados	420.00	13,357	5,609,940	2,804,970			3.40%
2	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equ	Metro lineal	405.00	8,061	3,264,705	3,264,705			1.98%
3	"Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-"	Unidad	1.00	994,096	994,096	994,096			0.60%
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	1.00	4,575,366	4,575,366	4,575,366			2.78%
5	"Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-	Metros cuadrados	2,738	6,454	17,671,052	2,581,600			10.72%
6	"CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ ."	Metros cúbicos	38.88	983,360	38,233,037	10,226,944			23.20%
7	Colocacion de hormigon armado - "CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.-"	Metros cúbicos	0.84	971,320	815,909	0			0.50%
8	Construcción de empedrado - "Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-"	Metros cuadrados	2738.00	31,293	85,680,234	10,704,868			52.00%
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	Metros cuadrados	136.00	33,441	4,547,976	0			2.76%
10	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	2738.00	1,238	3,389,644	0			2.06%
	Total				164,781,959				100.00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						35,152,549	0	0	35,152,549
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						21.33%	0.00%	0.00%	21.33%

Omar DanielValdez Acosta
Contratista-Representante Legal

G.L.V CONSTRUCCIONES
RUC: 3927192 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

RIMALOGA CONSULTORA
0986 75 28 98

105

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre - Enero

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2023 – "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - ID Nº 437.001

Contrato N°: 77/2023			
Monto del Contrato:	164,781,959	**Fecha de terminación prevista:**	17-Mar-24
Plazo Contractual:	210 dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	18-Dec-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Enero	58,283,797	58,283,797	35,152,549	35,152,549	35.37%	35.37%	21.33%	21.33%
Febrero	58,452,920	116,736,716			35.47%	70.84%		
Marzo	48,045,242	164,781,959			29.16%	100.00%		

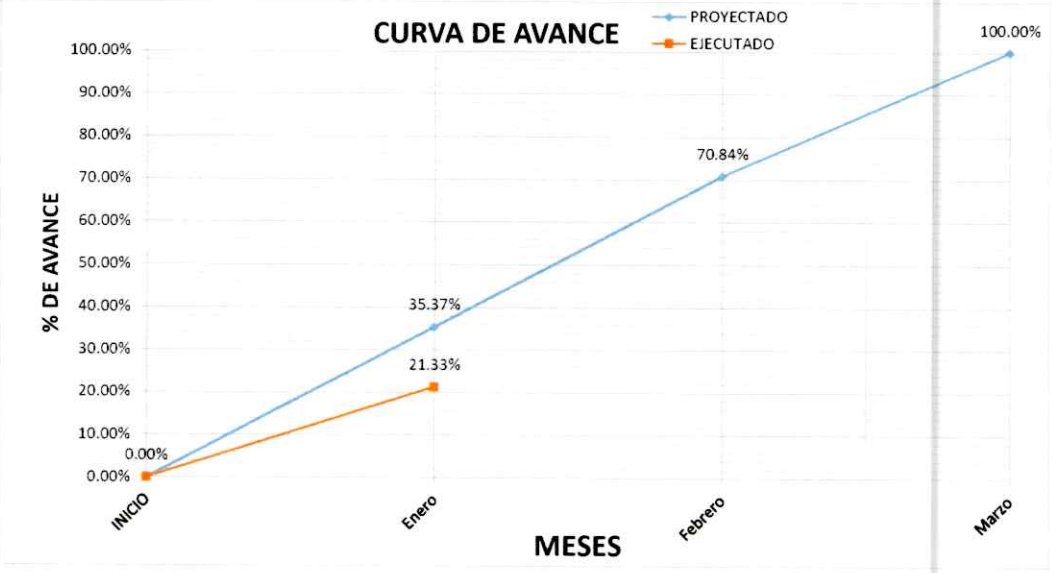

Omar DanielValdez Acosta
Contratista-Representante Legal

G.L.V CONSTRUCCIONES
RUC: 3927192 - 7

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE YATYTAY - PLURIANUAL"

UBICACIÓN:	**DISTRITO:**	**COORDENADAS UTM:**	**MONTO DE LA OBRA:**
Barrio San Jorge	YATYTAY	---	**gs**
EMPRESA CONTRATISTA:	**Nº DE TELÉFONO:**	**Nº CONTRATO:**	**FECHA DE INICIO:**
Construcciones G.L.V.		**77/2023**	**19/12/2023**
MODALIDAD / LOTE:	**PLAZO CONTRACTUAL:**	**AMPLIACIONES (ADENDA):**	**TERMINACIÓN PREVISTA:**
Contratación Directa	90 DÍAS CALENDARIO		18/03/2024

FISCALES A CARGO: Secretaría de Obras

FECHA DE VISITA: Diciembre/ Enero del 2024

AVANCE DE OBRA: 21.33%

OBSERVACIONES GENERALES: Trabajos de cargamento de H° en cordones – colocación de piedras - control de medidas y procedimientos.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

EMPEDRADO DEL DISTRITO DE YATYTAY.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

EMPEDRADO DEL DISTRITO DE YATYTAY.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
