GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 04

Mes: mayo

Contratación Directa D. N° 35/23 contrato N° 33/23 Descripción del llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**Contratación Directa D. N° 35/23 contrato N° 33/23 Descripción del llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020**	100,00%	118.984.318	52,52%	62.495.931	31,31%	37.257.134	83,84%	99.753.065
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**118.984.318**	**52,52%**	**62.495.931**	31,31%	**37.257.134**	**83,84%**	**99.753.065**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	23.796.864	12.499.186	7.451.427	19.950.613
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**23.796.864**	12.499.186	**7.451.427**	**19.950.613**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				29.805.707	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**29.805.707**	

Certificado Básico Nº	**04**
Mes: mayo	
Contrato N°:	33/23
Monto Básico:	₲ 118.984.318
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 días
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Prórroga:	**85 días**
Fecha de terminación con prórroga:	**10-jun-24**

SON GUARANIES: veinte y nueve millones ochocientos cinco mil setecientos siete.-

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Ing. Claudio Gaona Valenzuela
Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3622

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO Nº 04

CONTRATO Nº 33/2023

REFERENCIA: Contratación Directa N° 35/23 contrato N° 33/23

Descripción del llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos

En la Ciudad de Cambyreta, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 7 días del mes de junio del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Claudio Gaona Valenzuela, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y la Lic. Noelia Ledesma Ocampos, Representante legal de la Empresa Impacto Constructora, para la;

- "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL"

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes mayo del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.-

---

Representante Legal

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ingº. Civil
Reg. MOPC 3822

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

IMPACTO CONSTRUCTORA

Contratación Directa D. N° 35/23 contrato N° 33/23 Descripción del llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 118.984.318	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	33/23	**PRÓRROGA:**	25 días + 60 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:**	10-jun-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 04						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 04					
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	1.154.834	1.154.834	0,010	100	0	100	0,010	0,000	0,010	1	0	1	1.154.834	-	1.154.834
2	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.371.159	3.371.159	0,028	100	0	100	0,028	0,000	0,028	1	0	1	3.371.159	-	3.371.159
3	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	191,05	9.322	1.780.968	0,015	100	0	100	0,015	0,000	0,015	191,05	0	191,05	1.780.968	-	1.780.968
4	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrado	1.490,19	31.252	46.571.418	0,391	0	80	80	0,000	0,313	0,313	0	1192,152	1192,152	-	37.257.134	37.257.134
5	Preparacion de obra - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.419,19	5.623	7.980.105	0,067	100	0	100	0,067	0,000	0,067	1419,19	0	1419,19	7.980.105	-	7.980.105
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,76	1.500.863	2.641.519	0,022	0	0	0	0,000	0,000		0	0			-	
7	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	366,1	77.509	28.376.045	0,238	100	0	100	0,238	0,000	0,238	366,1	0	366,1	28.376.045	-	28.376.045
8	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	15,12	1.639.618	24.791.024	0,208	80	0	80	0,167	0,000	0,167	12,096	0	12,096	19.832.819	-	19.832.819
9	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrado	1.490,19	1.555	2.317.245	0,019	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
					118.984.318	100%				52,52%	31,31%	83,84%				62.495.931	37.257.134	99.753.065

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

Mes: mayo

IMPACTO CONSTRUCTORA

Contratación Directa D. N° 35/23 contrato N° 33/23 Descripción del llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020

Contrato N°:	33/23		
Monto del Contrato:	₲ 118.984.318	**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	25 días +60 días
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	10-jun-24

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 33/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	31.312.693	31.312.693	31.312.693	31.312.693	26,32%	26,32%	26,32%	26,32%
febrero	57.921.836	89.234.529	11.350.418	42.663.111	48,68%	75,00%	9,54%	35,86%
marzo	29.749.788	118.984.318	0	42.663.111	25,00%	100,00%	0,00%	35,86%
abril			19.832.819	62.495.931			16,67%	52,52%
mayo			37.257.134	99.753.065			31,31%	83,84%
junio								

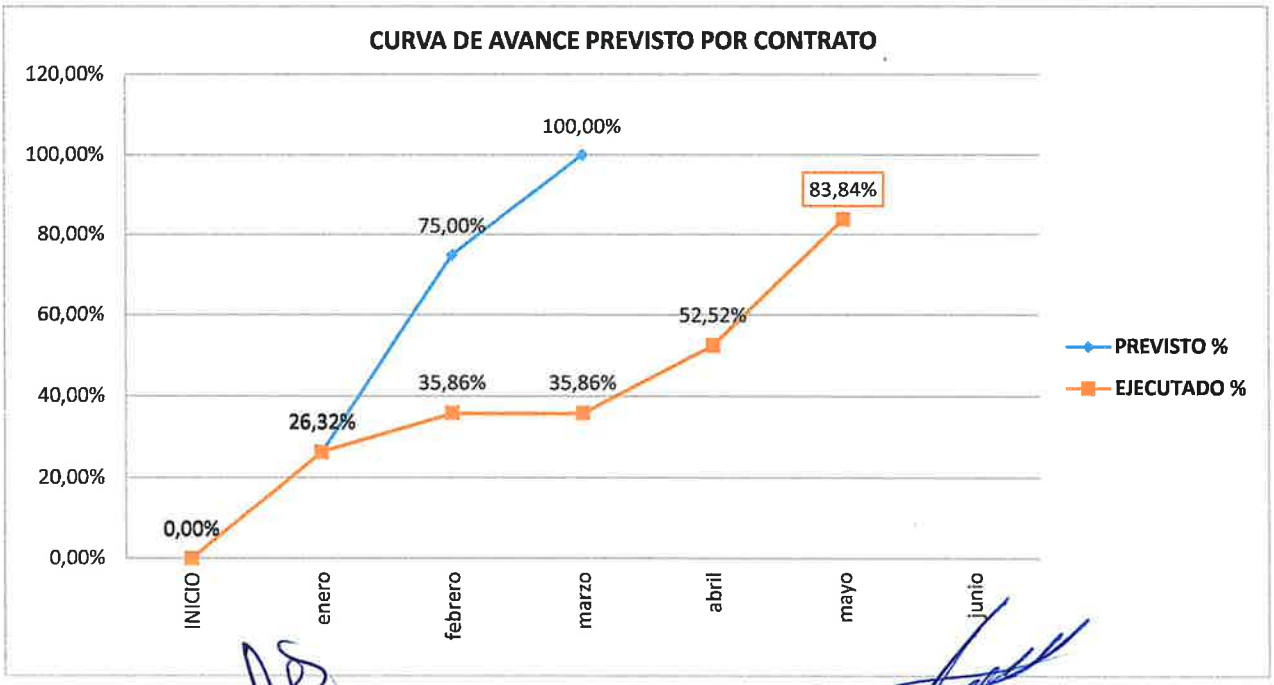

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Claudio Gaona Villamayor
Ing. Civil
Reg. MOPC 3022

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Mes: mayo

IMPACTO CONSTRUCTORA

Contratación Directa D. N° 35/23 contrato N° 33/23 Descripción del llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 118.984.318	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	33/23	**PRÓRROGA:**	85 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	10-jun-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA- PLURIANUAL con ID: 437020				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	
1	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	1.154.834	1.154.834	1.154.834	-		100%
2	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.371.159	3.371.159	3.371.159			100%
3	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	191,05	9.322	1.780.968	1.780.968			100%
4	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.490,19	31.252	46.571.418		46.571.418		100%
5	Preparacion de obra - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.419,19	5.623	7.980.105	7.980.105			100%
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,76	1.500.863	2.641.519			2.641.519	100%
7	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	366,1	77.509	28.376.045	17.025.627	11.350.418		100%
8	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	15,12	1.639.618	24.791.024			24.791.024	100%
9	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.490,19	1.555	2.317.245			2.317.245	100%
					118.984.318				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	31.312.693	57.921.836	29.749.788	118.984.318
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	26,32%	48,68%	25,00%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC : 3005414 - 1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Claudio Osona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 8820

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 06 – Informe de obra

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 35/2023: "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CAMBYRETA" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 33/2023 - I. D. N° 437.020

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Barrio Santa Rosa - Cambyreta

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

AVANCE DE OBRA: 83,84%

FECHA DE VISITA: 07/junio/2024

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Santa Rosa	Cambyreta	118.984.318 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Noelia Ledesma – IMPACTO CONSTRUCTORA	0985-171-856	33/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
90 días	18/12/2023	17/03/2024
PRORROGA DE PLAZO	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
85 días	18/12/2023	10/06/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 07/06/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos:

- Construcción de empedrado - Empedrado de piedra tipo basalto.

El avance hasta la fecha es de 83,84%, según su cronograma físico financiero correspondiente al mes de mayo de 2024.

En la actualidad los trabajos se realizan de forma continua, se adjuntan fotografías de la obra

.....

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 9822

Claudio Ozona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3832
