GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 3

Mes: MARZO

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509	100%	196.228.895	49,60%	97.325.857	28,24%	55.412.297	77,84%	152.738.154
A	**Total por Contrato**	**100%**	**196.228.895**	**49,60%**	**97.325.857**	**28,24%**	**55.412.297**	**77,84%**	**152.738.154**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509

Certificado Básico Nº	**3**
Mes:	**Marzo**
Contrato N°:	**91/23**
Monto Básico:	**196.228.895**
Contratista:	**ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 dias**
Fecha de terminación prevista:	**16-mar-24**
Prórroga:	**33 dias**
Fecha de terminación con prórroga:	**18-abr-24**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	39.245.779	19.465.171	11.082.459	30.547.631
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**39.245.779**	**19.465.171**	**11.082.459**	**30.547.631**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				44.329.838	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**44.329.838**	

SON GUARANIES: Cuarenta y cuatro millones trescientos veintinueve mil ochocientos treinta y ocho.

INGENIERIA

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA RUC: 3030337-0
Contratista-Representante Legal

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3641

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Speggiorin
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 3

CONTRATO N° 91/2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BELLA VISTA – BARRIO PARQUE – PLURIANUAL.

CONTRATISTA: ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

En el distrito de Bella Vista, Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los 27 días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa el Arq. Diego Saldívar, encargado de la verificación y fiscalización de la obra y el Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia, representante técnico de la empresa DJ Ingeniería, para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN BELLA VISTA – BARRIO PARQUE – PLURIANUAL. Que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados en el mes de marzo. - .

En la verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscriben la presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado más arriba.

DJ INGENIERIA
Contratista
RUC: 3050337-0

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

Representante Técnico

Arq. Diego Armando Saldívar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Arq. Diego Saldívar

Fiscal de Obras

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Marzo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	196.228.895	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	91/23	**PRÓRROGA:**	33 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	18-abr-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con Impresión adhesiva)	Unidad	1,00	992.501	992.501	0,005	100,00%	0,00%	100,00%	0,005	-	0,005	1,00	0,00	1,00	992.501	0	992.501
2	Construcción de empedrado - Construcción de Cordón cuneta de H°.	Metros cúbicos	56,60	864.488	48.930.020	0,249	92,06%	7,95%	100,01%	0,230	0,020	0,249	52,10	4,50	56,60	45.043.856	3.890.196	48.934.052
3	Construcción de empedrado - Empedrado de Piedra Basáltica	Metros cuadrados	3665,50	34.193	125.334.442	0,639	40,92%	35,68%	76,61%	0,261	0,228	0,489	1.500,00	1.308,00	2.808,00	51.289.500	44.724.444	96.013.944
4	Construcción de empedrado - Relleno superior de empedrado con Cernidura de polvo de piedra.	Metros cuadrados	3665,50	3.651	13.382.741	0,068	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Construcción de empedrado - Badén de H°A° e=20cm con malla metálica simple de varillas de 8mm cada 15cm	Metros cúbicos	3,90	1.742.989	6.797.657	0,035	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,035	0,035	0,00	3,90	3,90	0	6.797.657	6.797.657
6	Limpieza de obra - Limpieza general de la zona de obra	Unidad	1,00	791.534	791.534	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					**196.228.895**	**100%**				**49,60%**	**28,24%**	**77,84%**				**97.925.857**	**55.412.297**	**152.738.154**

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 5041
Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: Marzo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509

Contrato N°: 91/23			
Monto del Contrato:	196.228.895	**Fecha de terminación prevista:**	16-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Prórroga:**	33 dias
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	18-abr-24

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	992.501	992.501	10.000.000	10.000.000	0,51%	0,51%	5,10%	5,10%
Enero	47.891.900	48.884.401	59.855.501	69.855.501	24,41%	24,91%	30,50%	35,60%
Febrero	100.009.117	148.893.518	27.470.356	97.325.857	50,97%	75,88%	14,00%	49,60%
Marzo	47.335.377	196.228.895	55.412.297	125.267.798	24,12%	100,00%	28,24%	77,84%
Abril								

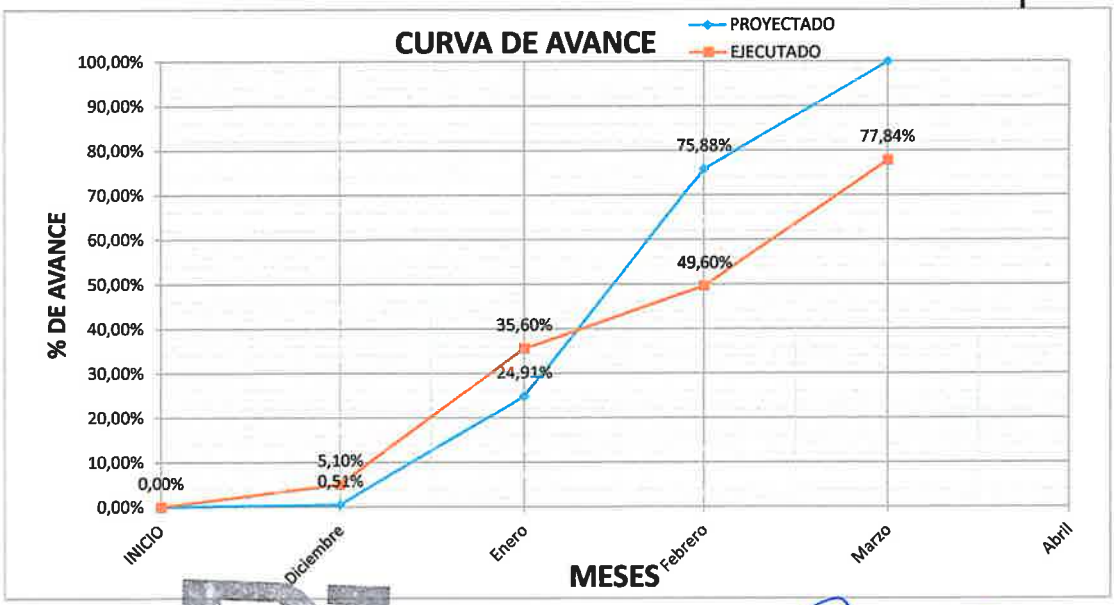

INGENIERIA
RUC: 80030337-0

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Diego Arnaldo Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Marzo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	196.228.895	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	91/23	**PRÓRROGA:**	33 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	18-abr-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 27/2023 - "Construcción de Empedrado en Bella Vista - Barrio Parque -Plurianual con ID: 436.509							PLAZO DE EJECUCIÓN			TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva)	Unidad	1,00	992.501	992.501	992.501				0,51%
2	Construcción de empedrado - Construcción de Cordón cuneta de H°.	Metros cúbicos	56,60	864.488	48.930.020		24.121.568	24.808.452		24,94%
3	Construcción de empedrado - Empedrado de Piedra Basáltica	Metros cuadrados	3665,50	34.193	125.334.442		23.770.332	75.200.665	26.363.445	63,87%
4	Construcción de empedrado - Relleno superior de empedrado con Cernidura de polvo de piedra.	Metros cuadrados	3665,50	3.651	13.382.741				13.382.741	6,82%
5	Construcción de empedrado - Badén de H°A° e=20cm con malla metálica simple de varillas de 8mm cada 15cm	Metros cúbicos	3,90	1.742.989	6.797.657				6.797.657	3,46%
6	Limpieza de obra - Limpieza general de la zona de obra	Unidad	1,00	791.534	791.534				791.534	0,40%
	Total				**196.228.895**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						992.501	47.891.900	100.009.117	47.335.377	**196.228.895**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						0,51%	24,41%	50,97%	24,12%	**100%**

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
RUC: 3030337-0
Contratista-Representante Legal

Arq. Diego Saldivar
Reg. Pro... 1441
Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA Nº 27/2023

OBRA: "Construcción de Empedrado en Bella Vista -Plurianual" ID Nº 436.509

BENEFICIARIO: Barrio Parque – Centro sobre Calle "Cnel. Bogado" entre las calles Mcal. Estigarribia y Calle Maestro Juan Joaquin Weber."

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 31 de marzo de 2024

AVANCE DE OBRA: 77,84 %

UBICACION	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE OBRA
Barrio Parque	Bella Vista		196.228.895
CONTRATISTA	**Nº DE TELEFONO**	**Nº DE CONTRATO**	**LOTE/ ITEM**
Diego Jara Estigarribia	0983 578600	91/23	
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**PRORROGAS**
90 dias	20/12/2023	19/03/2024	----------

OBSERVACIONES GENERALES:

En fecha 31 de marzo de 2024, se realizó la verificación in situ correspondiente de la obra ya mencionada más arriba, constatando que se encuentra en un avance de 77,84 % fecha medida.

Efectuando mediciones se observa que la obra está en proceso de avance.

Se ha realizado provisiones de tierra roja para colchón, provisión de Piedra basáltica para pavimento de empedrado continuando el tramo. Se avanza con el cargamento de Cordón cuneta.

Se anexa imágenes de avance de obra.-

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Diego Alvarado Salgueiro
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
