MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
EMPRESA CONTRATISTA:WYLL SERVICIOS GENERALES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: FEBRERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	19/02/2024
FECHA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	75
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	03/04/2024

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"		114.510.398	80,19%	14,53%	94,72%	91.828.130	16.639.919	108.468.049
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	0,05% x dia	MULTAS	57.255				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	22.902.080	80,19%	14,53%	94,72%	18.365.626	3.327.984	21.693.610
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.725.520	80,19%	14,53%	94,72%	4.591.407	831.996	5.423.402
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		28.627.600	80,19%	14,53%	94,72%	22.957.033	4.159.980	27.117.012
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**68.871.098**	**12.479.939**	**81.351.037**

SON GUARANÍES: DOCE MILLONES CUAATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

-REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03

PERIODO: FEBRERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	19/02/2024
FECHA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	75
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	03/04/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación (Calle Alider Vera Guillen entre Mariscal López y Cerro Cora)	Metros cuadrados	520	2.418	1.257.360	520,00		520,00	1.257.360		1.257.360	100,00%		100,00%
2	Desmonte de terreno	Unidad Medida Global	1											
2.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	520	1.693	880.360	520,00		520,00	880.360		880.360	100,00%		100,00%
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.755.000	1.755.000									
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1											
4.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	520	3.627	1.886.040	520,00		520,00	1.886.040		1.886.040	100,00%		100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	115	43.766	5.033.090	50,00	50,00	100,00	2.188.300	2.188.300	4.376.600	43,48%	43,48%	86,96%
6	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1											
6.1	Provision y colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon	Metro lineal	130	84.630	11.001.900	130,00	-18,00	112,00	11.001.900	-1.523.340	9.478.560	100,00%	-13,85%	86,15%
6.2	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	16	50.830	813.280	16,00	-16,00		813.280	-813.280				
6.3	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	68	32.643	2.219.724	50,00	15,00	65,00	1.632.150	489.645	2.121.795	73,53%	22,06%	95,59%
7	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1											
7.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	520	50.278	26.144.560	450,00	-50,00	400,00	22.625.100	-2.513.900	20.111.200	86,54%	-9,62%	76,92%
7.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	520	3.627	1.886.040	520,00	-50,00	470,00	1.886.040	-181.350	1.704.690	100,00%	-9,62%	90,38%
7.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	520	3.864	2.009.280	450,00	-50,00	400,00	1.738.800	-193.200	1.545.600	86,54%	-9,62%	76,92%
8	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1											
8.1	Construccion de baden de HºAº de 15 cm de espesor ancho 1,60 m.	Metros cúbicos	4	1.813.500	7.254.000	2,00	2,00	4,00	3.627.000	3.627.000	7.254.000	50,00%	50,00%	100,00%
9	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	520	3.143	1.634.360	450,00	70,00	520,00	1.414.350	220.010	1.634.360	86,54%	13,46%	100,00%
10	Replanteo y Marcación (Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti)	Metros cúbicos	490	2.418	1.184.820	490,00		490,00	1.184.820		1.184.820	100,00%		100,00%
11	Desmonte de terreno	Unidad Medida Global	1											
11.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	490	1.693	829.570	490,00		490,00	829.570		829.570	100,00%		100,00%
12	Cartel con impresion	Unidad	1	1.755.000	1.755.000	1,00		1,00	1.755.000		1.755.000	100,00%		100,00%
13	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1											

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wullian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03

PERIODO: FEBRERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	19/02/2024
FECHA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	75
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	03/04/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
13.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	490	3.627	1.777.230	490,00		490,00	1.777.230		1.777.230	100,00%		100,00%
14	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	147	43.766	6.433.602	50,00	97,00	147,00	2.188.300	4.245.302	6.433.602	34,01%	65,99%	100,00%
15	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1											
15.1	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	147	50.830	7.472.010	147,00		147,00	7.472.010		7.472.010	100,00%		100,00%
15.2	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	44	32.643	1.436.292	30,00	14,00	44,00	979.290	457.002	1.436.292	68,18%	31,82%	100,00%
16	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1											
16.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	490	50.278	24.636.220	400,00	180,00	580,00	20.111.200	9.050.040	29.161.240	81,63%	36,73%	118,37%
16.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	490	3.627	1.777.230	490,00	90,00	580,00	1.777.230	326.430	2.103.660	100,00%	18,37%	118,37%
16.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	490	3.864	1.893.360	400,00	180,00	580,00	1.545.600	695.520	2.241.120	81,63%	36,73%	118,37%
17	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	490	3.143	1.540.070	400,00	180,00	580,00	1.257.200	565.740	1.822.940	81,63%	36,73%	118,37%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**114.510.398**				**91.828.130**	**16.639.919**	**108.468.049**	**80,19%**	**14,53%**	**94,72%**

--REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
EMPRESA CONTRATISTA:WYLL SERVICIOS GENERALES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: FEBRERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 19 días del mes de febrero del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "WYLL SERVICIOS GENERALES", REPRESENTADA POR el SR. WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación (Calle Alider Vera Guillen entre Mariscal López y Cerro Cora)	Metros cuadrados	520	520,00		520,0
2	Desmonte de terreno	Unidad Medida	1			0,0
2.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	520	520,00		520,0
3	Cartel con impresion	Unidad	1			0,0
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1			0,0
4.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	520	520,00		520,0
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	115	50,00	50,00	100,0
6	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1			0,0
6.1	Provision y colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon	Metro lineal	130	130,00	-18,00	112,0
6.2	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	16	16,00	-16,00	0,0
6.3	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	68	50,00	15,00	65,0
7	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1			0,0
7.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	520	450,00	-50,00	400,0
7.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	520	520,00	-50,00	470,0
7.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	520	450,00	-50,00	400,0
8	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1			0,0
8.1	Construccion de baden de HºAº de 15 cm de espesor ancho 1,60 m.	Metros cúbicos	4	2,00	2,00	4,0
9	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	520	450,00	70,00	520,0
10	Replanteo y Marcación (Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti)	Metros cúbicos	490	490,00		490,0
11	Desmonte de terreno	Unidad Medida Global	1			0,0
11.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	490	490,00		490,0
12	Cartel con impresion	Unidad	1	1,00	0,00	1,0
13	Preparacion de obra	Unidad Medida	1			0,0
13.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	490	490,00		490,0
14	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	147	50,00	97,00	147,0
15	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1			0,0
15.1	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	147	147,00	0,00	147,0
15.2	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	44	30,00	14,00	44,0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
EMPRESA CONTRATISTA:WYLL SERVICIOS GENERALES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:03
PERIODO: FEBRERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 19 días del mes de febrero del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "WYLL SERVICIOS GENERALES", REPRESENTADA POR el SR. WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
16	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1			0,0
16.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	490	400,00	180,00	580,0
16.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	490	490,00	90,00	580,0
16.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	490	400,00	180,00	580,0
17	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	490	400,00	180,00	580,0
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"

LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti

LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	114.510.398
TIEMPO DE EJECUCION	120 dias

ITEM	DESCRIPCIÓN	ene-24				feb-24				mar-24				abr-24				Monto	%
		30 dias				60 dias				90 dias				120 dias					
1	Replanteo y marcación (Calle Alider Vera Guillen entre Mariscal López y Cerro Cora)																	1.257.360	1,10
2	Desmonte de terreno																	0	0,00
2.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios																	880.360	0,77
3	Cartel con impresion																	1.755.000	1,53
4	Preparacion de obra																	0	0,00
4.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado																	1.886.040	1,65
5	Relleno y compactacion de terreno																	5.033.090	4,40
6	Construccion de cordon																	0	0,00
6.1	Provision y colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon																	11.001.900	9,61
6.2	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon																	813.280	0,71
6.3	Relleno lateral de contencion de cordon																	2.219.724	1,94
7	Construcción de empedrado																	0	0,00
7.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)																	26.144.560	22,83
7.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final																	1.886.040	1,65
7.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI																	2.009.280	1,75
8	Construccion de cuneta																	0	0,00
8.1	Construccion de baden de HºAº de 15 cm de espesor ancho 1,60 m.																	7.254.000	6,33
9	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra																	1.634.360	1,43
10	Replanteo y Marcación (Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti)																	1.184.820	1,03
11	Desmonte de terreno																	0	0,00
11.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios																	829.570	0,72
12	Cartel con impresion																	1.755.000	1,53
13	Preparacion de obra																	0	0,00
13.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado																	1.777.230	1,55
14	Relleno y compactacion de terreno																	6.433.602	5,62
15	Construccion de cordon																	0	0,00
15.1	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon																	7.472.010	6,53
15.2	Relleno lateral de contencion de cordon																	1.436.292	1,25
16	Construcción de empedrado																	0	0,00
16.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)																	24.636.220	21,51
16.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final																	1.777.230	1,55
16.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI																	1.893.360	1,65
17	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra																	1.540.070	1,34
	TOTAL																	114.510.398	100,00

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"

LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti

LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**114.510.398**
TIEMPO DE EJECUCION	**120 dias**

Contractual				
Monto Bruto Mensual Contractual	28.627.600	28.627.600	28.627.599	28.627.599
Porcentaje Avance Mensual Contractual	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Certificado				
Monto Bruto Mensual Certificado	43.452.980	48.375.150	16.639.919	
Porcentaje Avance Mensual Certificado	37,95%	42,25%	14,53%	
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	37,95%	80,19%	94,72%	

	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	37,95%	80,19%	94,72%	0,00%

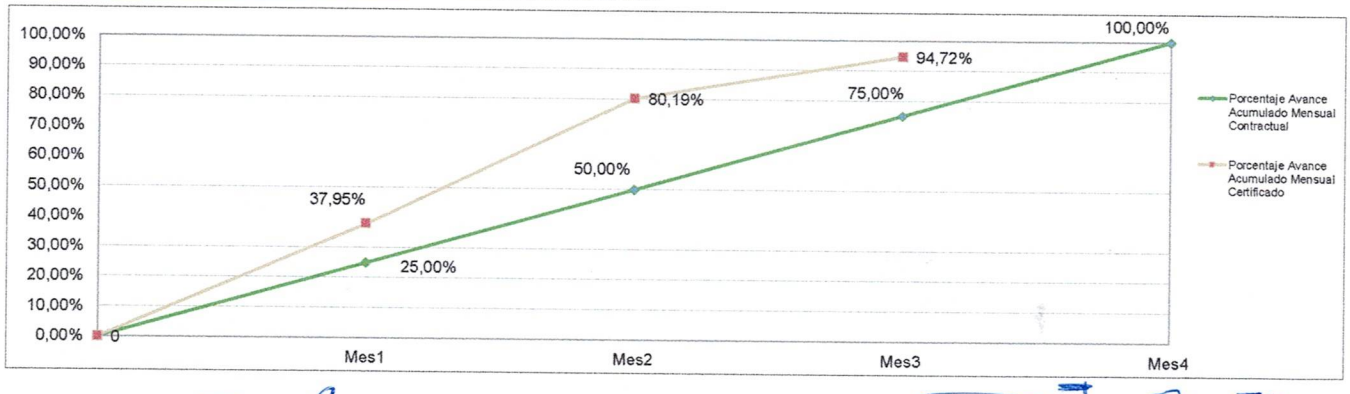

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra
